

平成28年9月14日(水)
国土交通省関東地方整備局
東京都建設局
東日本高速道路(株)関東支社
中日本高速道路(株)東京支社

記者発表資料

東京外かく環状道路(関越～東名)事業連絡調整会議(第4回) 開催結果について

本日開催した、東京外かく環状道路(関越～東名)事業連絡調整会議(第4回)の概要をお知らせします。

会議の概要は以下のとおりです。

<開催日時・場所>

平成28年9月14日 13時30分～14時30分
九段第3合同庁舎11階 共用会議室 4

<構成機関>

国土交通省関東地方整備局
東京都
東日本高速道路(株)関東支社
中日本高速道路(株)東京支社

<議事について>

議事の概要は別紙のとおり

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ、埼玉県政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局道路部
道路計画第一課長 久保 尚也(くぼ なおや)
TEL 048-601-3151

東京都建設局三環状道路整備推進部
整備推進課長 小野寺 圭(おのでら けい)
TEL 03-5320-5171

東京外かく環状道路(関越～東名)
事業連絡調整会議(第4回)結果の概要(速報)

【別紙】

平成28年9月14日(水)
国土交通省関東地方整備局
東京都建設局
東日本高速道路(株)関東支社
中日本高速道路(株)東京支社

国土交通省関東地方整備局、東京都、東日本高速道路(株)関東支社及び中日本高速道路(株)東京支社の4者は、今回の事業連絡調整会議において下記の事項を以下のとおり確認した。

1. 用地について

① 用地進捗

- ・H28.2～H28.8の6ヶ月間で、全体の用地進捗率は78%(+9ポイント)となった。
- ・用地全体で744件の残件があること。
- ・300件以上の残件がある青梅街道IC周辺の用地進捗を図るため、青梅街道IC周辺の用地取得事務を東京都が協力することについて検討していくこと。
- ・平成28年度半ばの用地取得完了が必要な大泉地区の買収部、平成29年度半ばの用地取得完了が必要な東名地区の買収部、大泉地区と東名地区の区分地上権部でそれぞれ残件があり、引き続き用地取得を推進していくこと。

② 区分地上権取得部

- ・区分地上権取得部の用地進捗率は53%であること。
- ・土地収用法第35条に基づく立入調査に着手したこと。

2. 埋蔵文化財調査について

- ・H28.2～H28.8の6ヶ月間で、全体の調査進捗率は65%(+5ポイント)となった。

3. 工事について


- ・H28.2～H28.8の6ヶ月間で、東名JCTにおいて本線シールドマシン組立の準備が進むなど、工事の進捗が図られたこと。
- ・世界最大級の規模である地中拡幅工事については、引き続き、安全やコスト削減等の観点に留意しつつ、着実に推進していくこと。

○こうした課題はあるが、引き続き、国、東京都、NEXCO東日本及びNEXCO中日本の相互協力のもと事業進捗を図り、東京オリンピック・パラリンピック開催までの開通の可能性について、引き続き検討していくこと。

東京外環 用地取得の状況

H28年8月現在

資料1

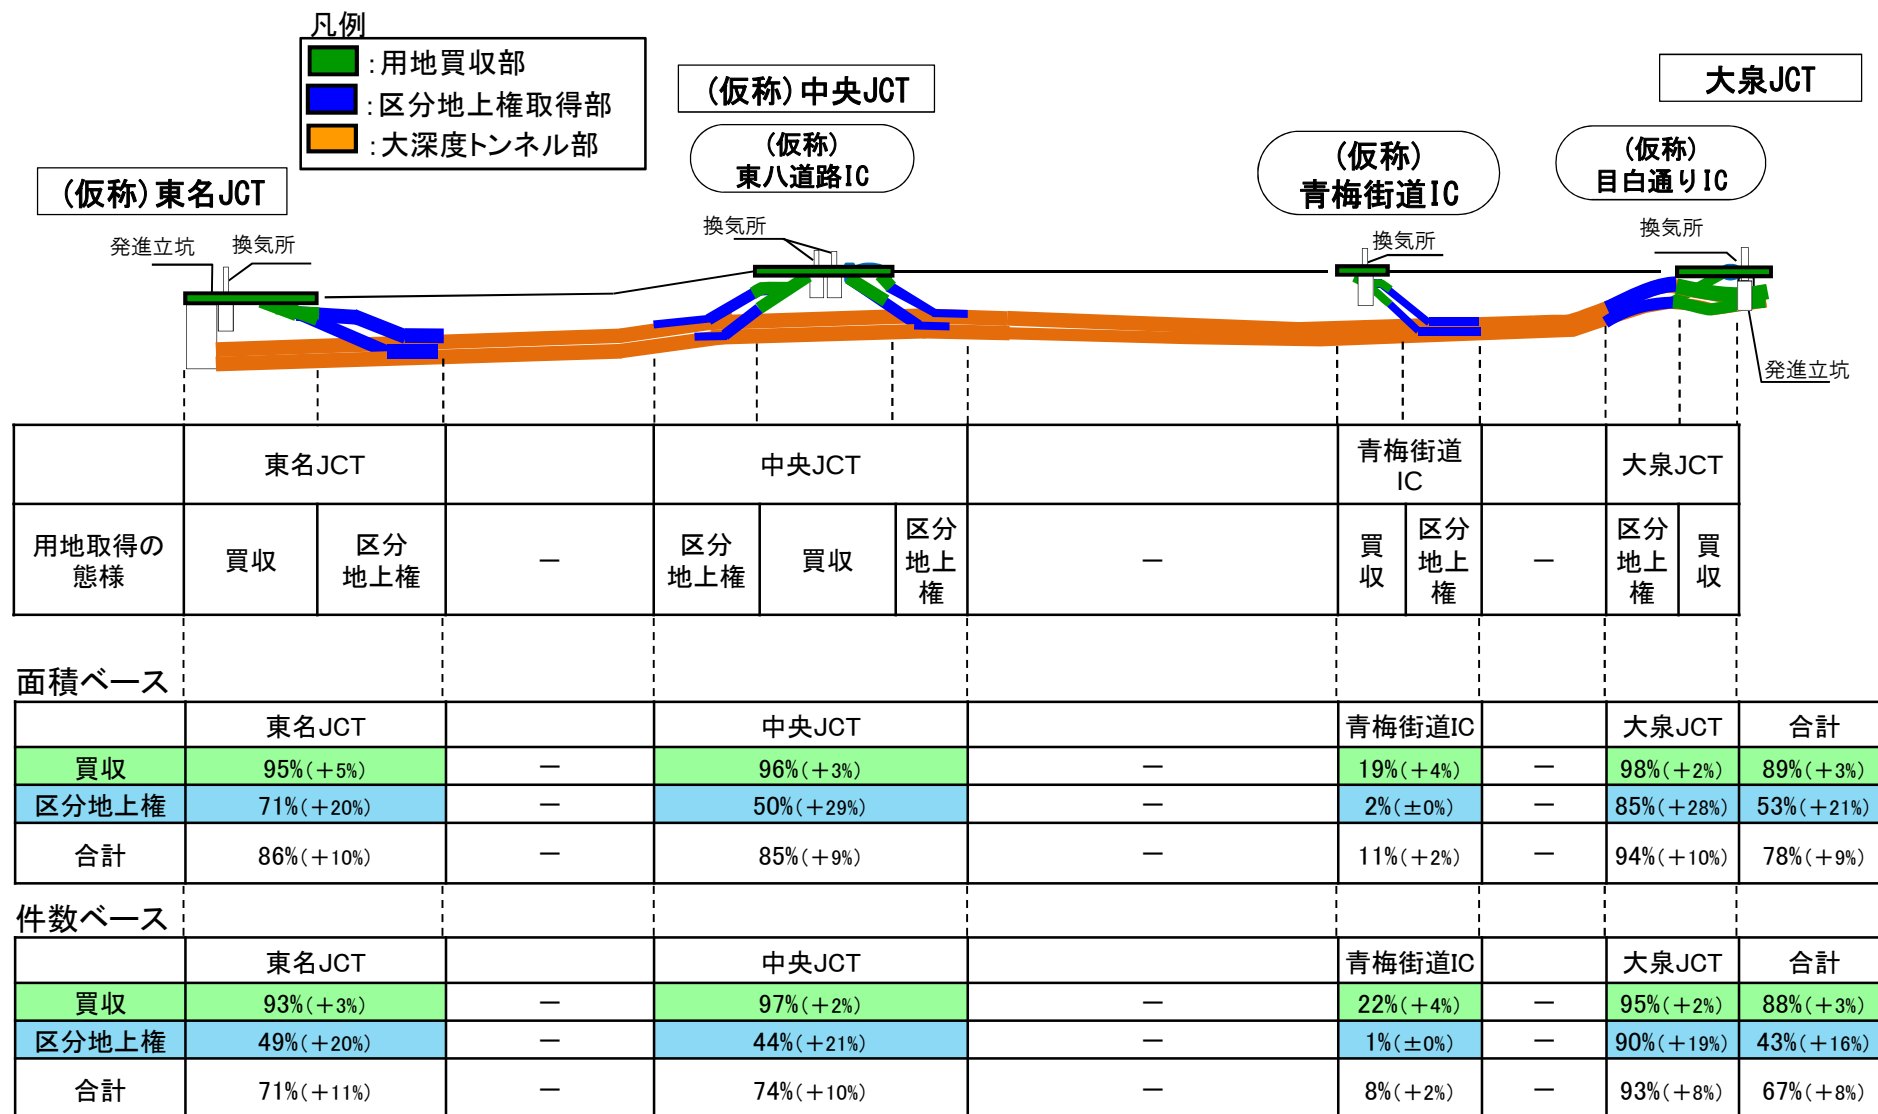


※用地取得は、国、東京都、NEXCO東日本、NEXCO中日本が分担して実施
 ※用地買収部については平成26年度より土地収用法に基づく収用手続きを活用中
 （事業者からの裁決申請・明渡裁決申立後は東京都収用委員会において手続きを実施）

※()内の数値は、H28年2月比

東京外環 用地取得の状況

H28年8月現在

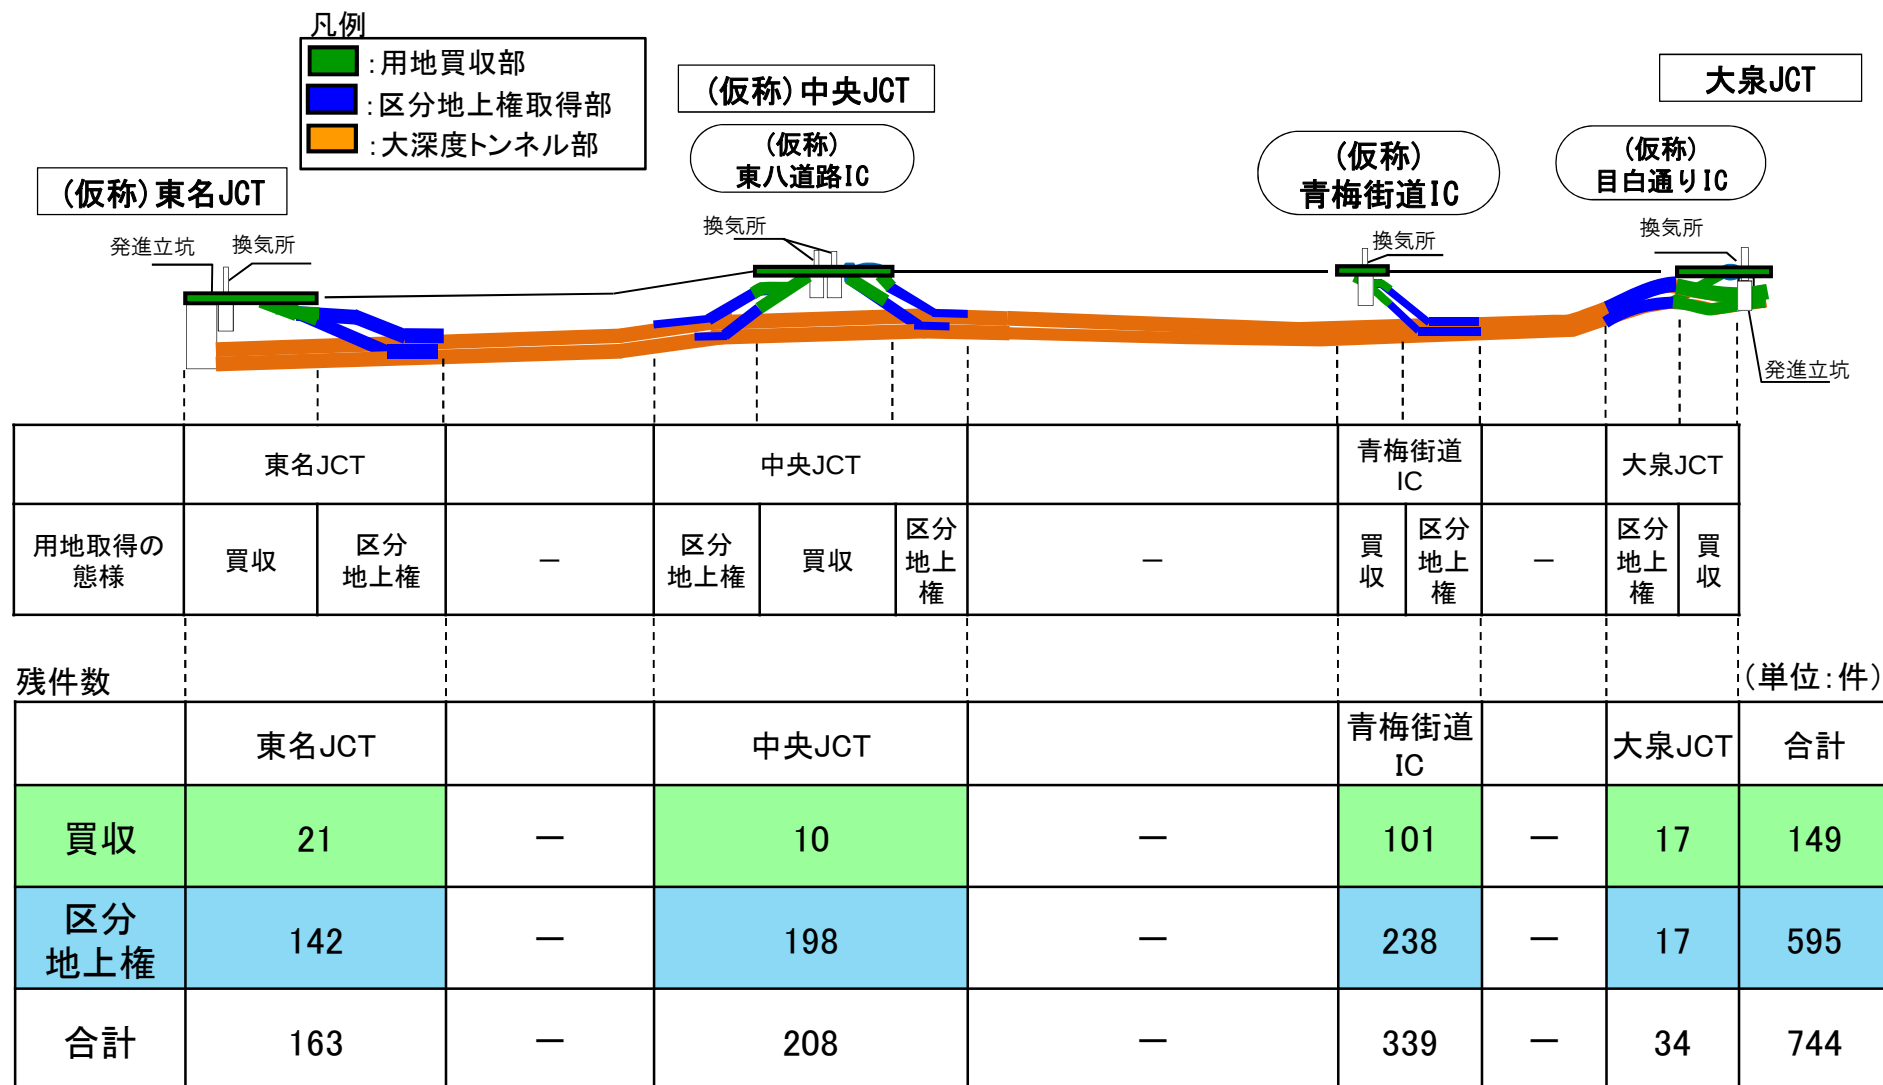


※残件数については、今後の測量等により変動があります

- ・大泉JCT部の買収部は、平成28年度半ばの用地取得及び埋蔵文化財調査の完了が必要
- ・東名JCT部の買収部は、平成29年度半ばの用地取得及び埋蔵文化財調査の完了が必要
- ・大泉JCT部及び東名JCT部の区分地上権部は平成29年度半ばの用地取得の完了が必要

東京外環 埋蔵文化財調査の状況

H28年8月現在

資料2

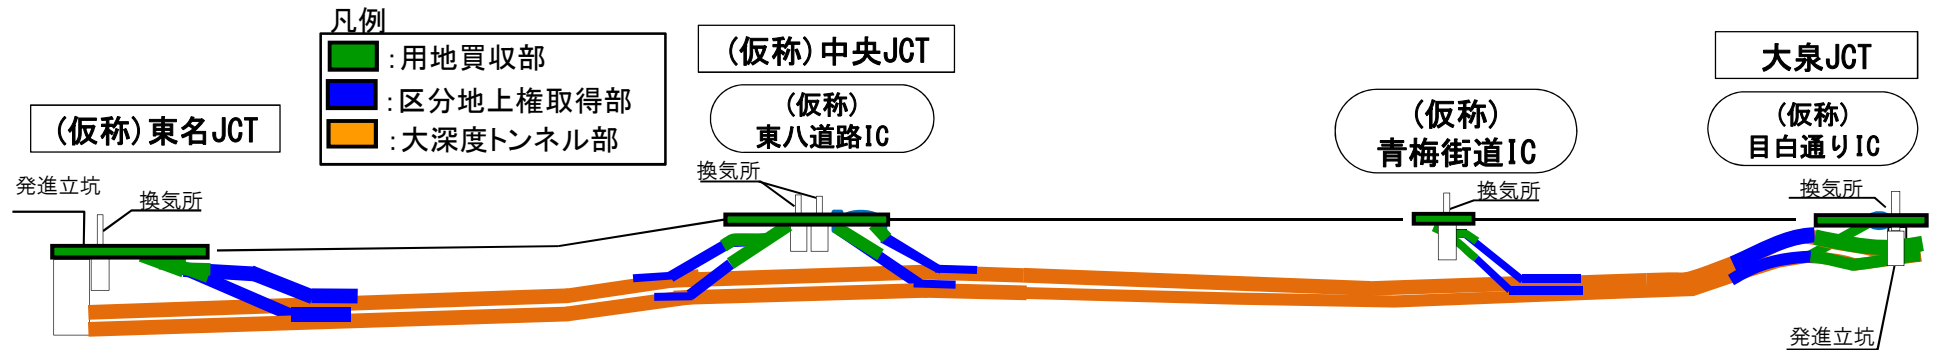

埋蔵文化財調査対象地のうち着工可能な面積の割合

	東名JCT	中央JCT	青梅街道IC	大泉JCT	合計
進捗率	83% (+24%)	68% (+12%)	0% (±0%)	73% (+7%)	65% (+5%)

※東京都との調整により調査必要範囲を事前に確定
 ※調査必要範囲について、工事着工前に区市の立ち会いのもと試掘調査(確認調査)を実施し、その結果を踏まえ、必要に応じて東京都にて本掘調査を実施


※()内の数値は、H28.2月比

$$\text{※進捗率} = \frac{\text{調査済み面積}}{\text{調査対象面積}}$$

工事実施状況（大泉JCT）

H28年8月現在

資料3

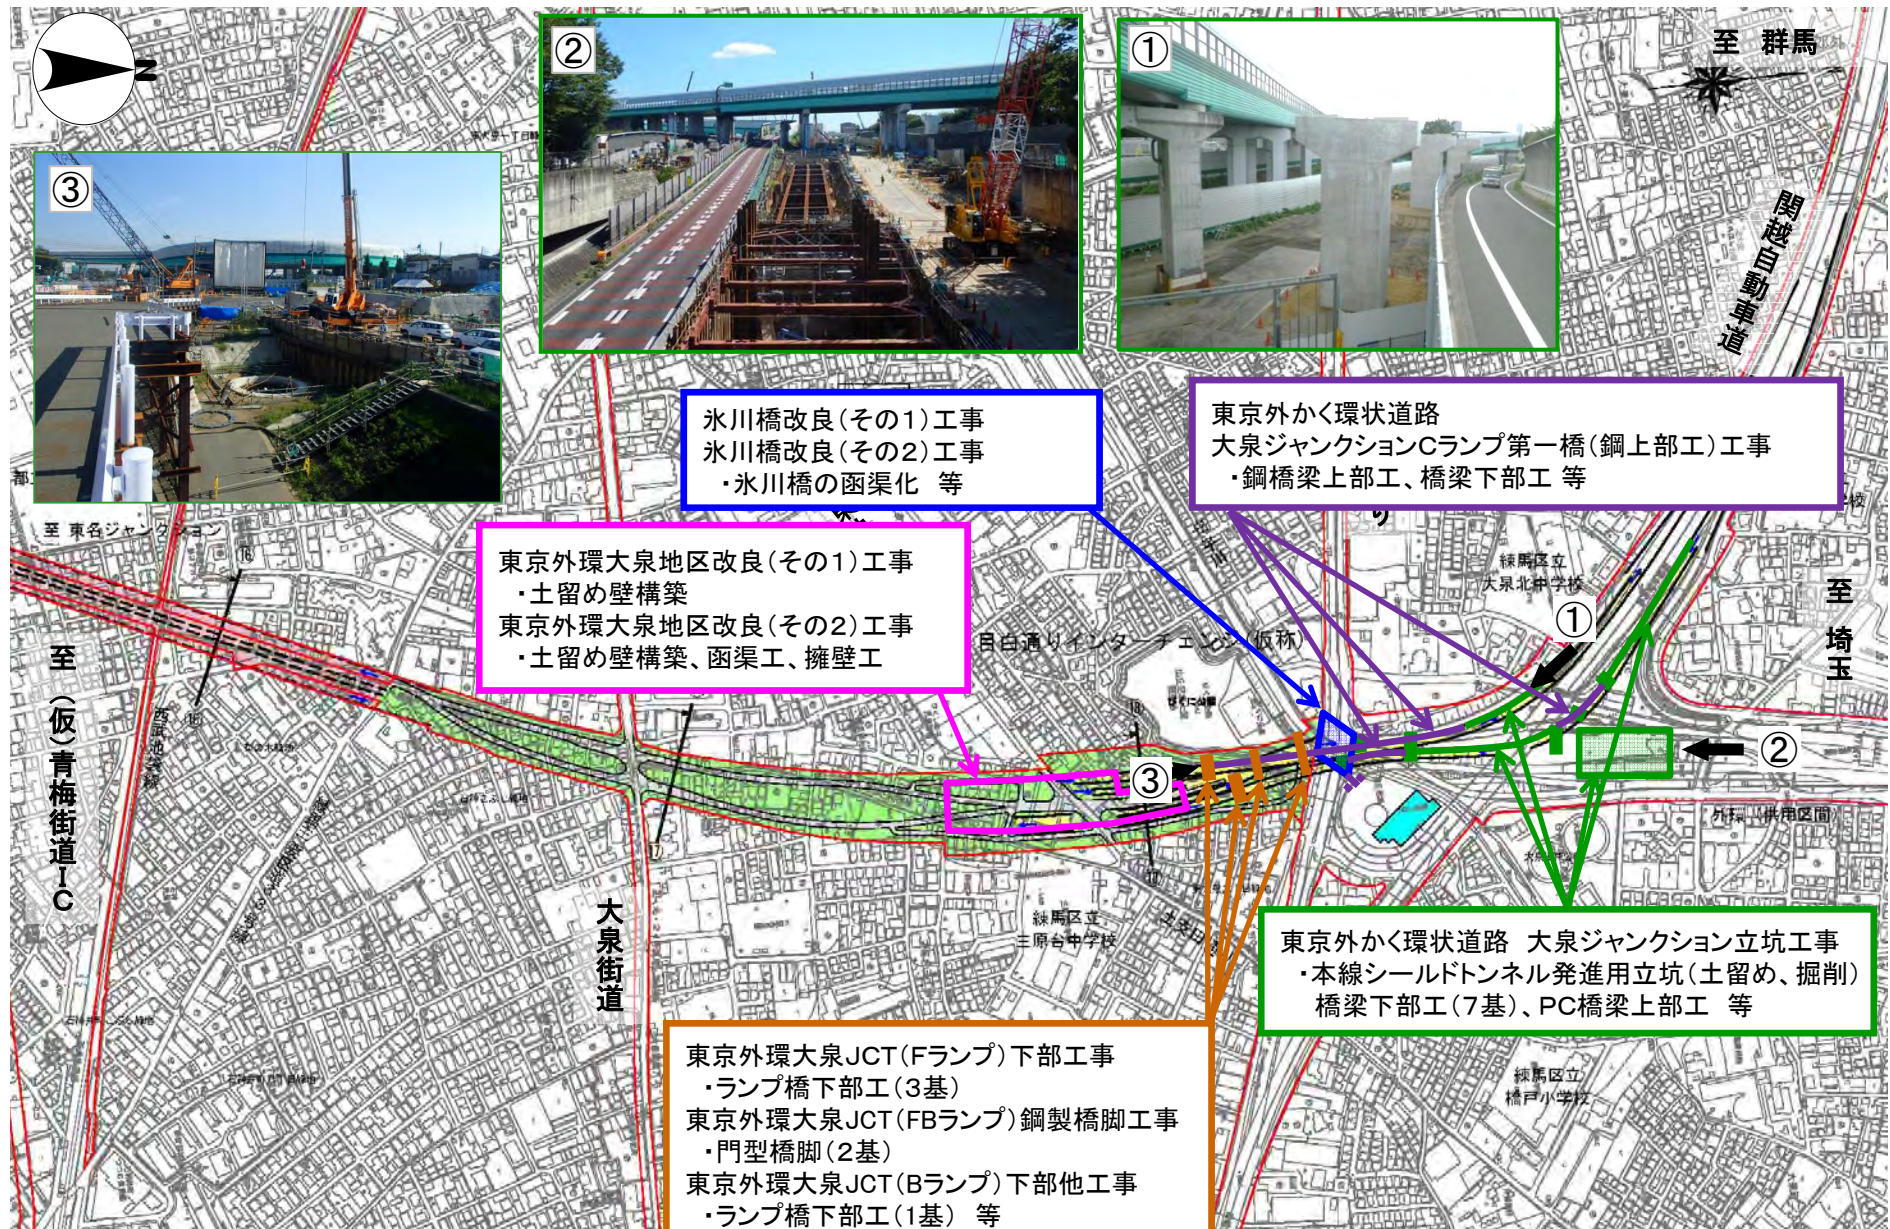

工事実施状況（中央JCT）

H28年8月現在



用地取得の形態


用地買収部

区分地上権取得部

大深度地下使用部

工事実施状況（東名JCT）

H28年8月現在

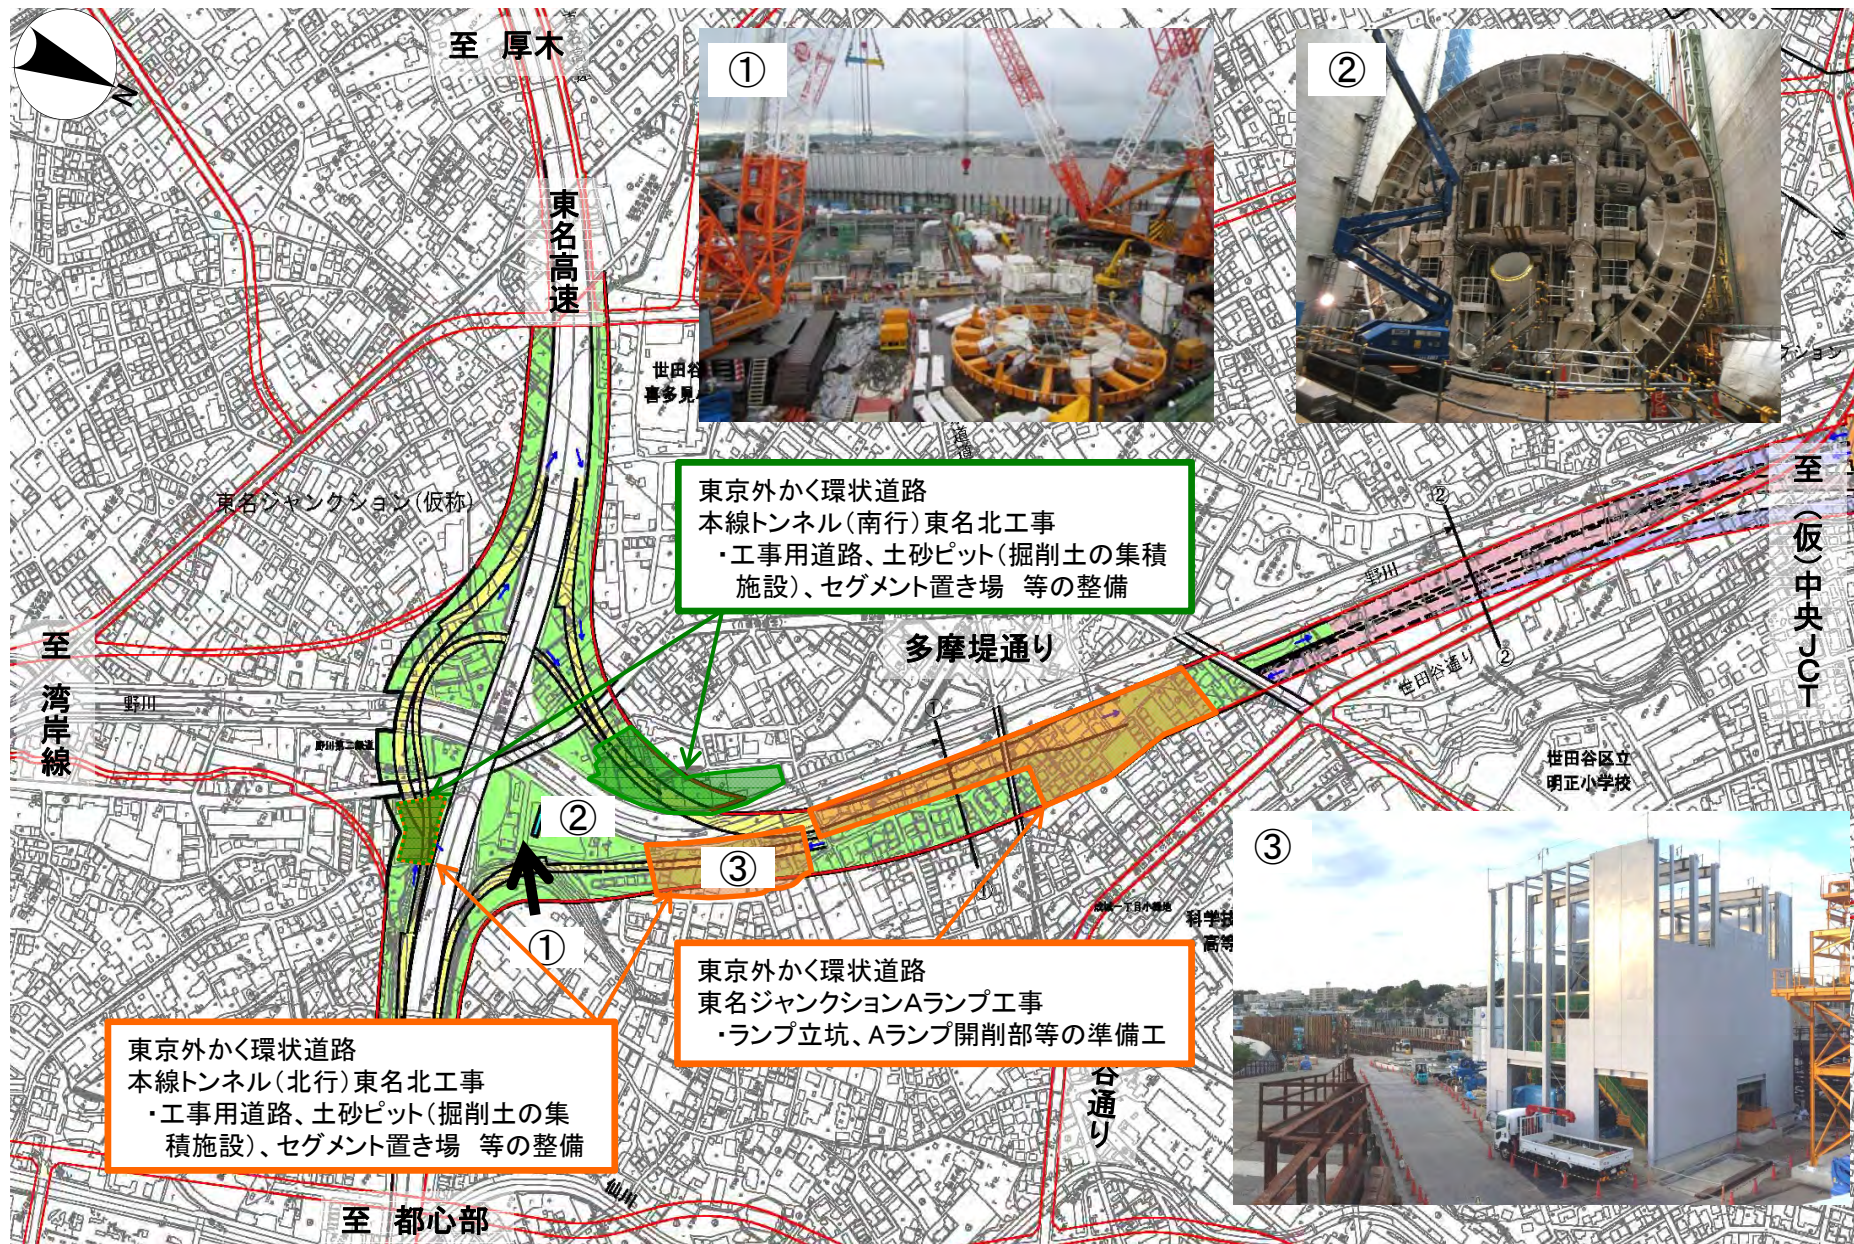

用地取得の形態

用地買収部

区分地上権取得部

大深度地下使用部
