
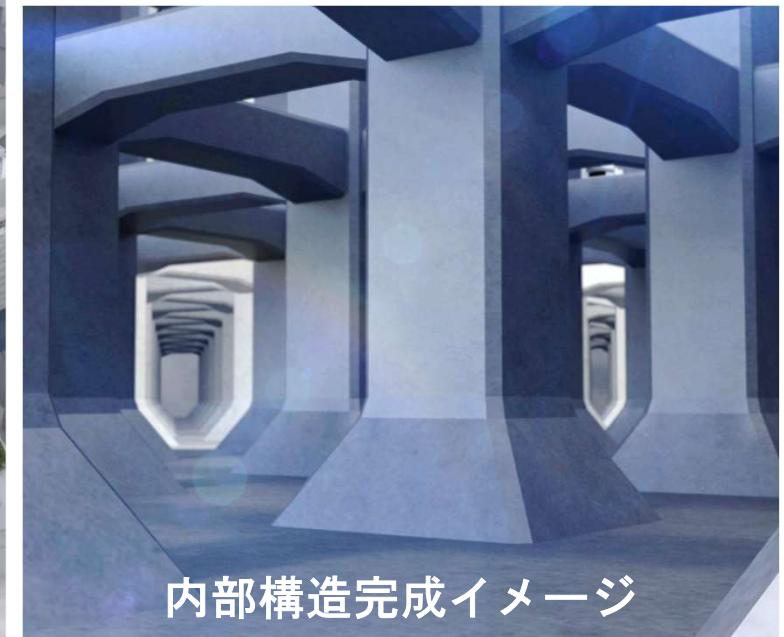


境川金森調節池 工事説明会

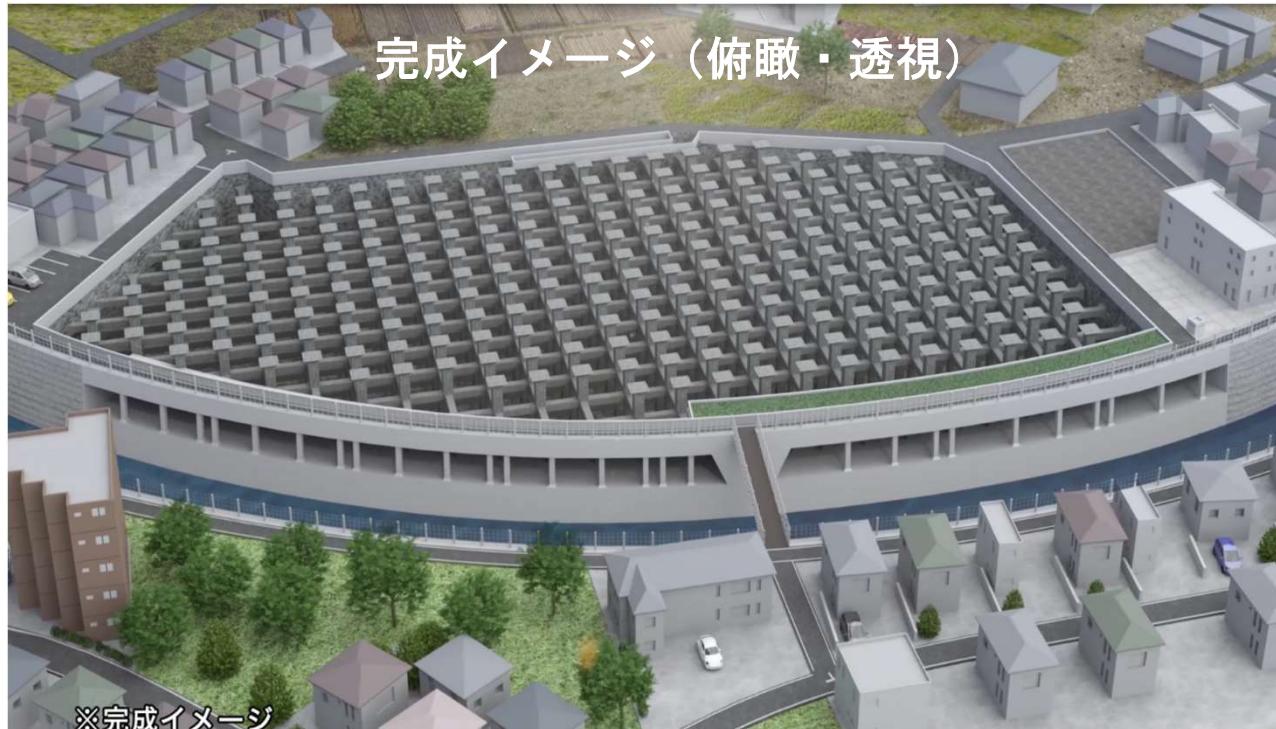

令和6年 9月

発注者：東京都南多摩東部建設事務所

施工者：安藤ハザマ・東鉄・松尾建設共同企業体

目 次

- ・ 境川金森調節池の概要
- ・ 工事進捗について
- ・ 工事中の通行規制
- ・ 事業スケジュール
- ・ その他


境川金森調節池の概要

境川金森調節池の概要



長さ：約190m
幅：約 90m
深さ：約 20m

貯留量 $151,000\text{m}^3$
25mプール約500杯

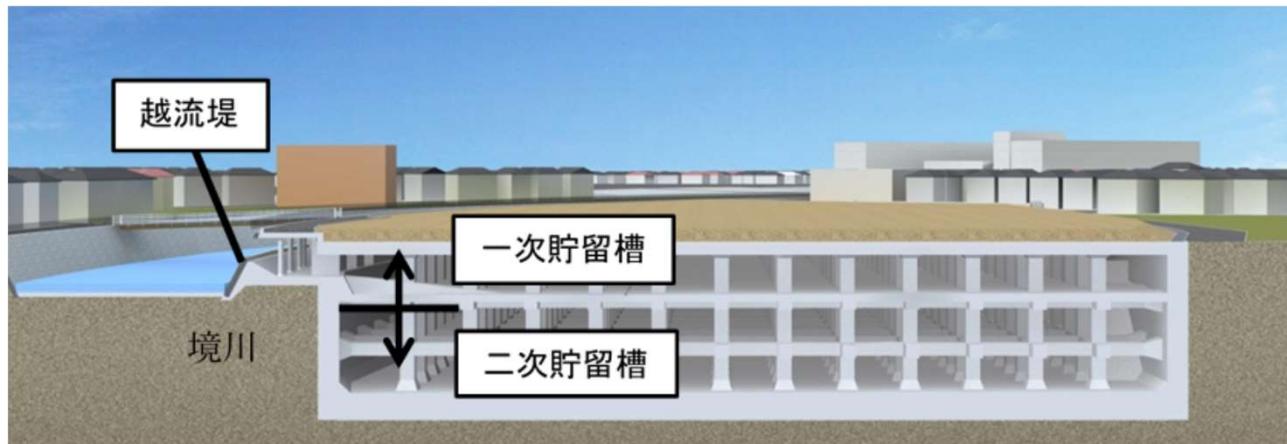

事業紹介動画も
合わせてご覧ください

境川金森調節池 安藤ハザマJV

工事進捗について

工事進捗について

調節池ヤード

土工 掘削工 最終掘削完了(約20m)

(令和2年12月～令和5年3月)




※撮影日:令和5年3月

工事進捗について

搬出ヤード

土工 掘削工（土砂搬出状況）

工事作業期間：令和2年12月～令和5年3月

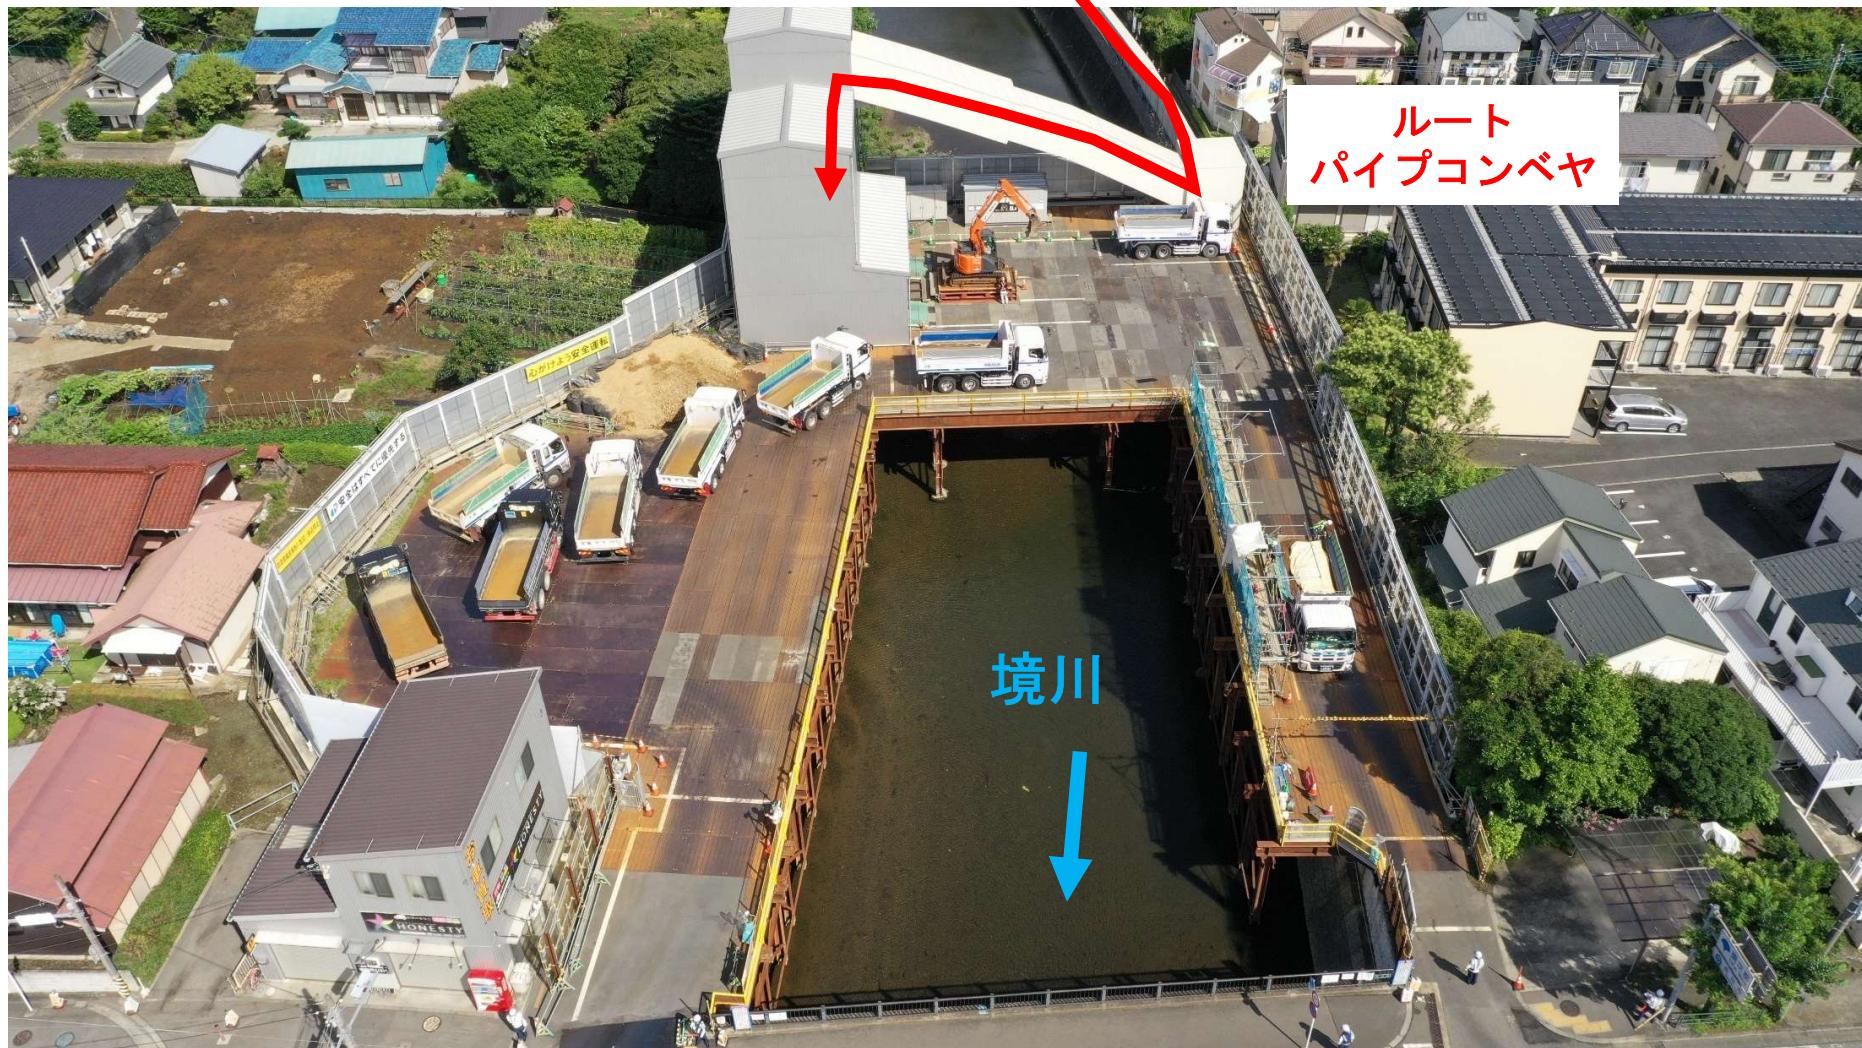

※撮影日：令和4年7月

工事進捗について

調節池ヤード～搬出ヤード
パイプコンベヤ撤去工（パイプコンベヤ撤去搬出）
(令和5年4月～令和6年3月)



※撮影日：令和5年6月

工事進捗について

コンクリート工の検討・準備

(令和4年10月～令和5年6月)




騒音・振動などの
影響を懸念



コンクリートを圧送
ミキサー車を低減

工事進捗について

コンクリート運搬方法の検討・準備(資機材の搬出入ルート)
(令和4年10月～令和5年6月)

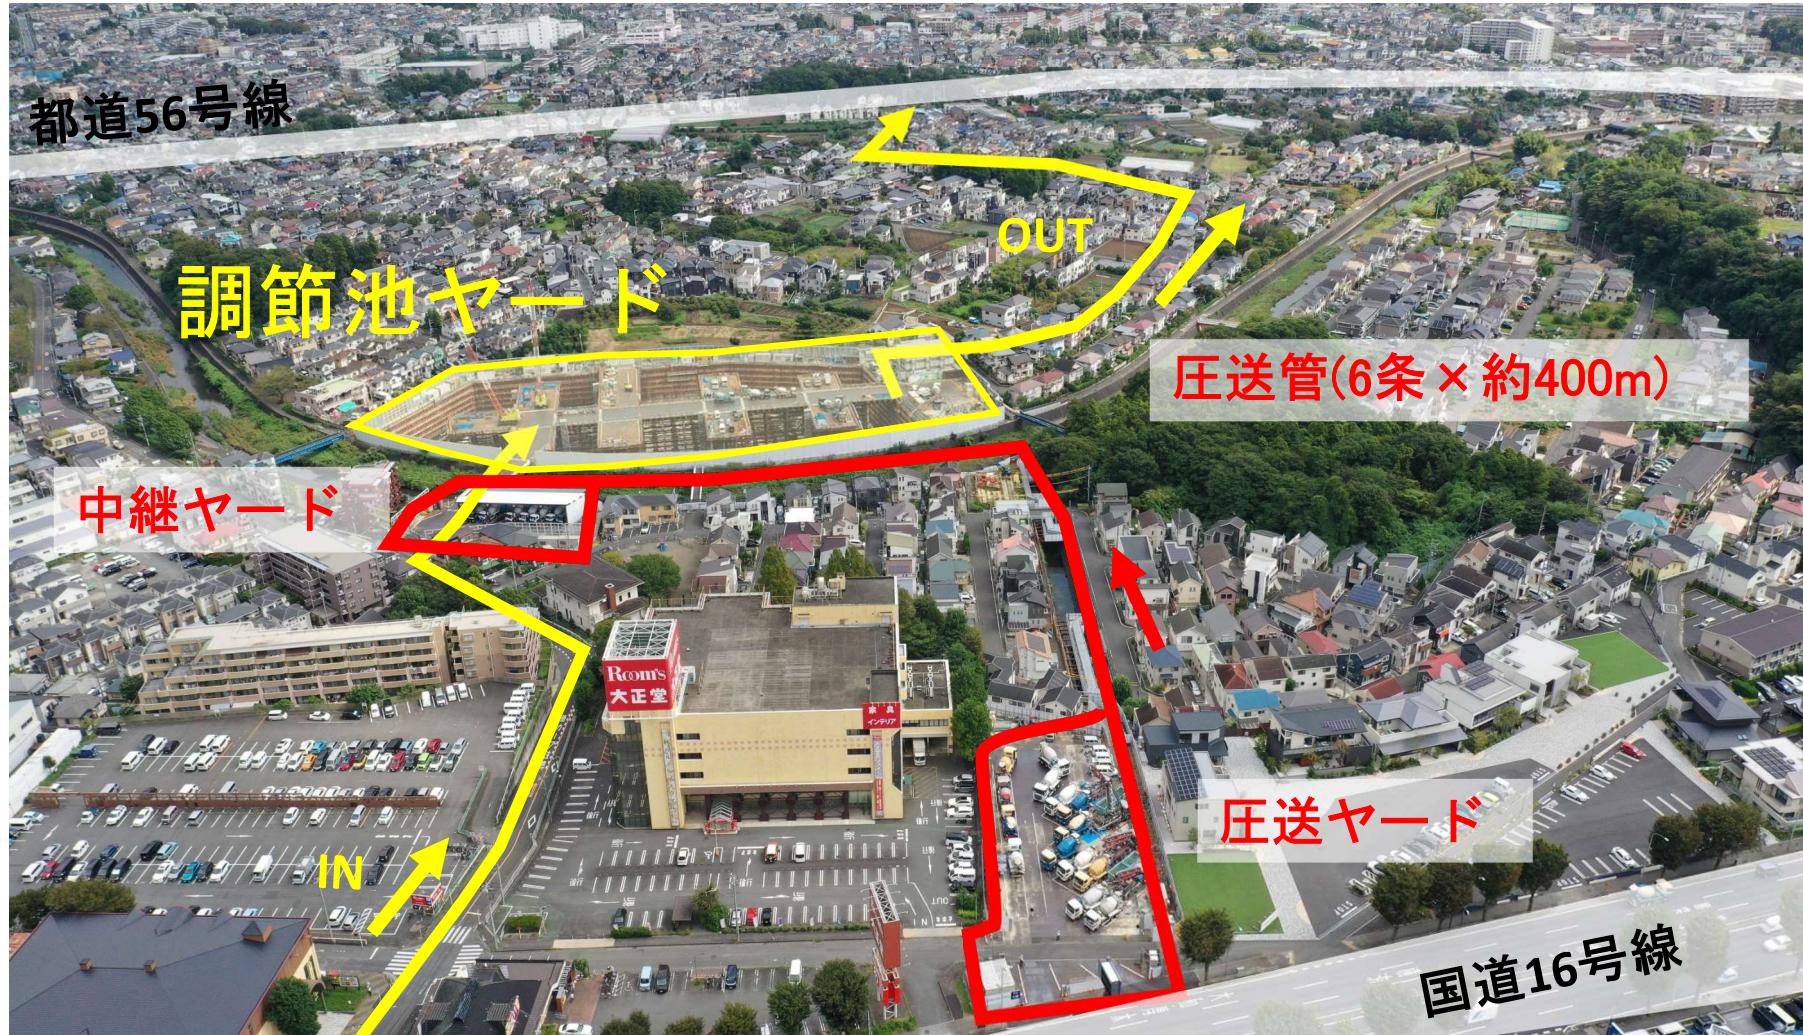

※撮影日:令和5年9月



工事進捗について

コンクリート運搬方法の検討・準備(圧送ヤード) (令和5年7月～令和7年6月頃)




工事進捗について

調節池ヤード 本体工 鉄筋配筋状況(底版・柱) (令和5年7月～令和7年6月頃)

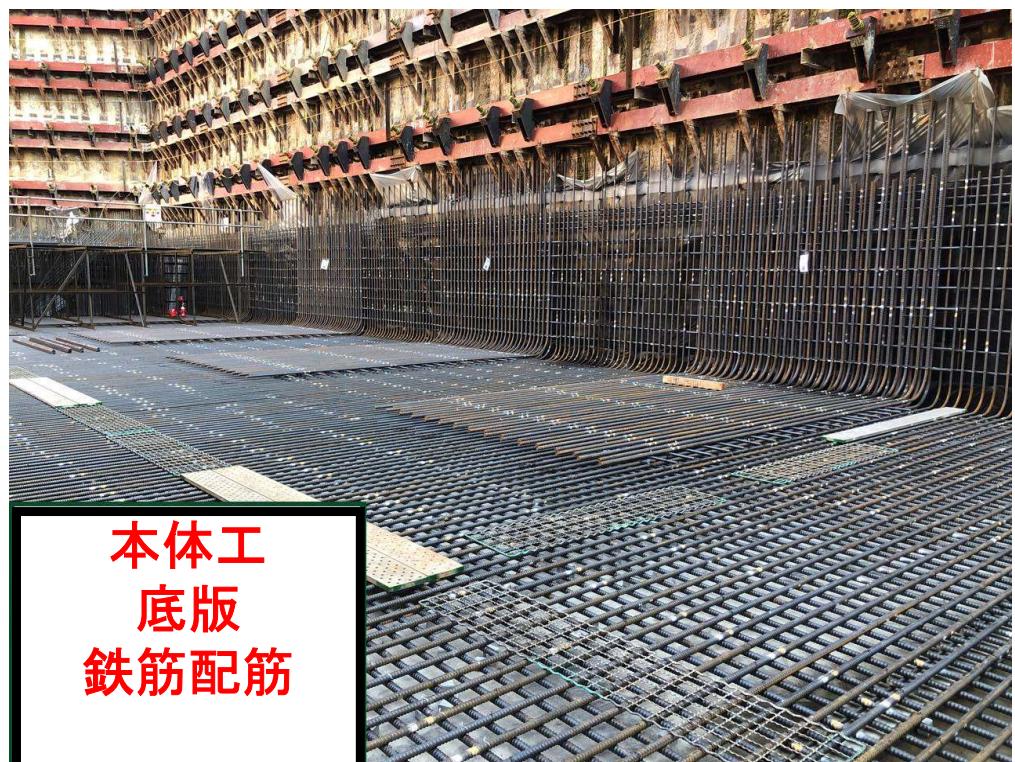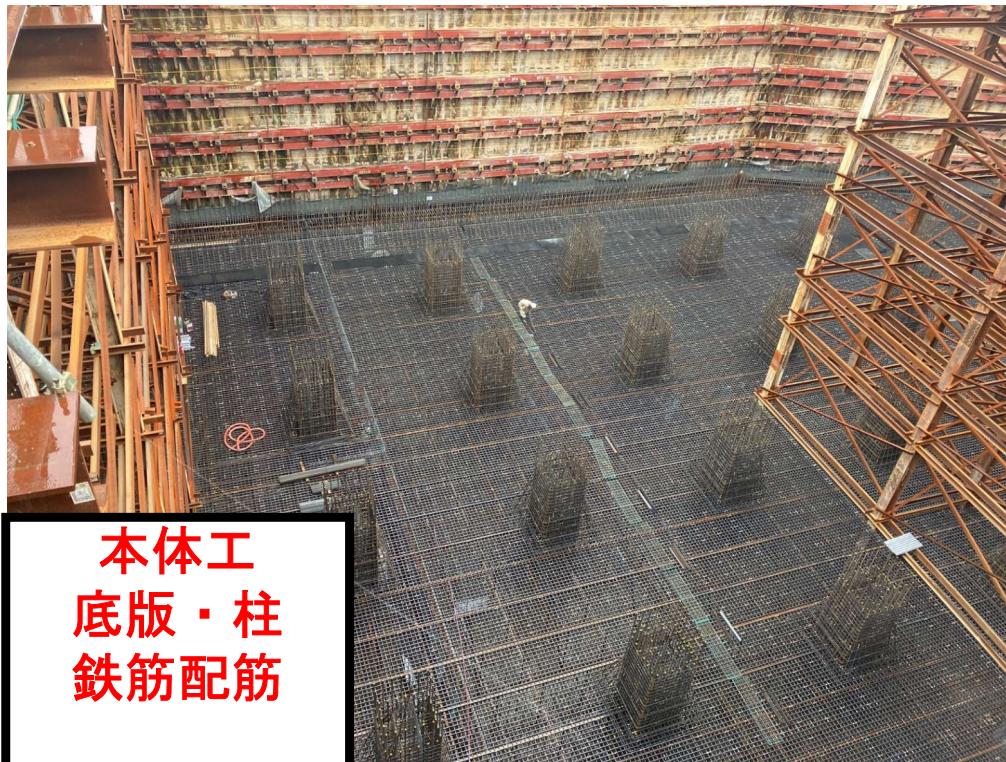

工事進捗について


調節池ヤード 本体工 型枠設置状況(壁・柱) (令和4年10月～令和7年6月頃)

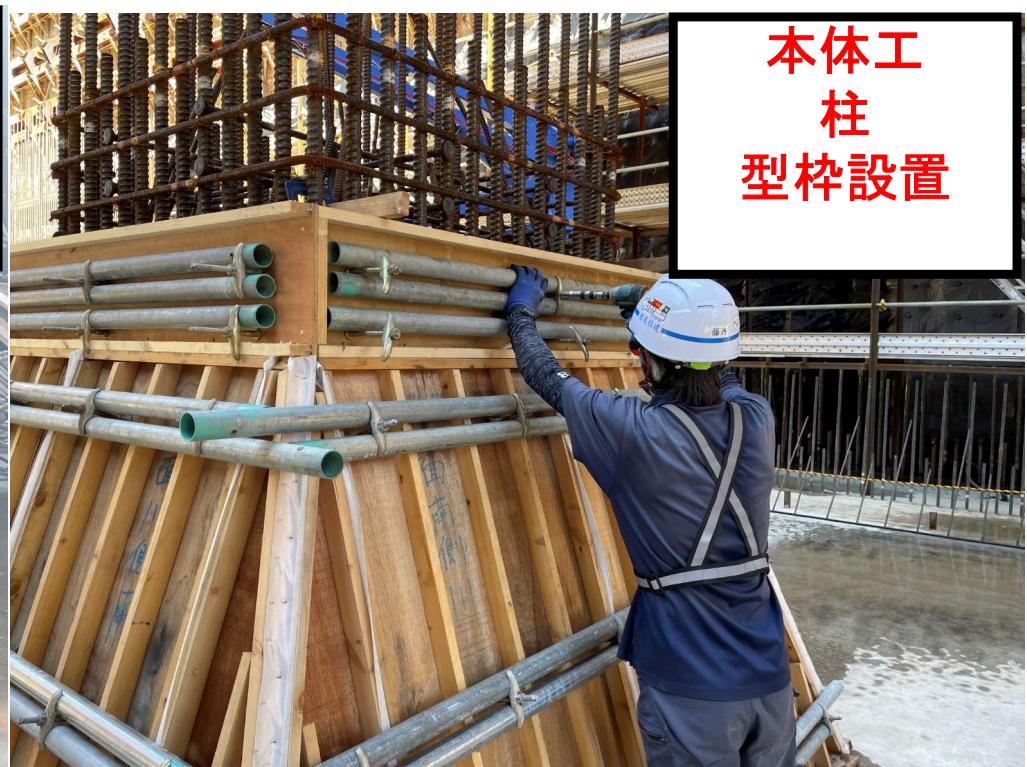

工事進捗について

調節池ヤード コンクリート工

(令和4年10月～令和7年6月頃)

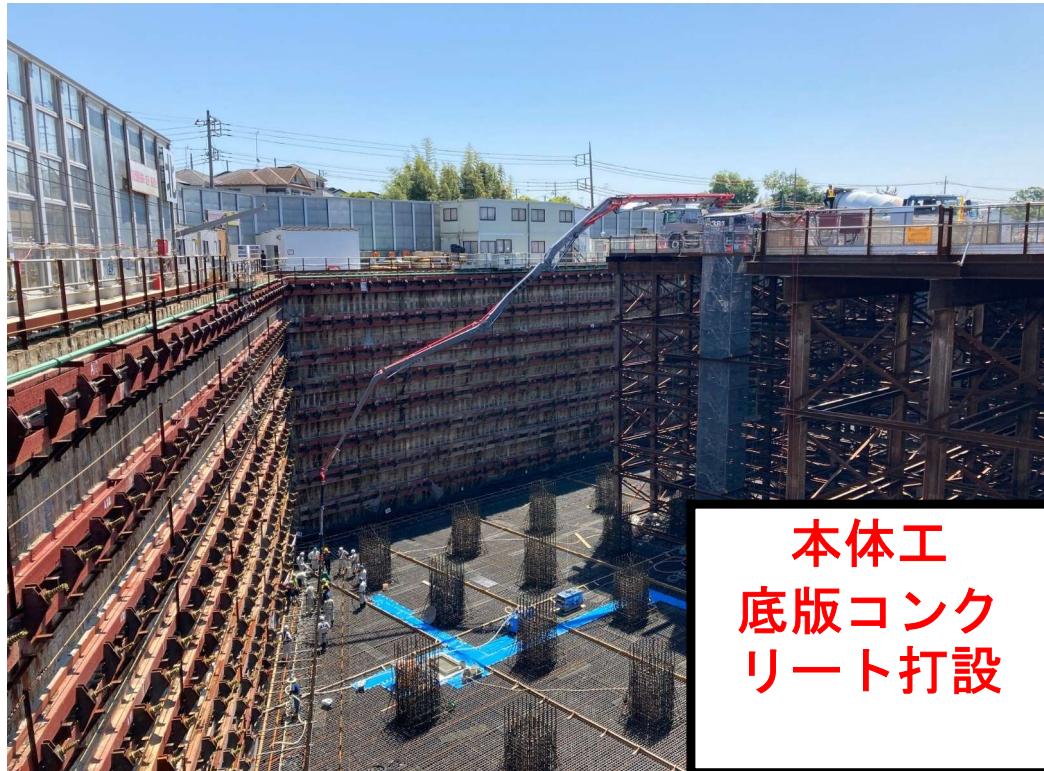

工事進捗について


調節池躯体工は約5割が完了（令和6年9月時点）



工事進捗について

朝礼時の様子（日々200名以上が現場に従事）



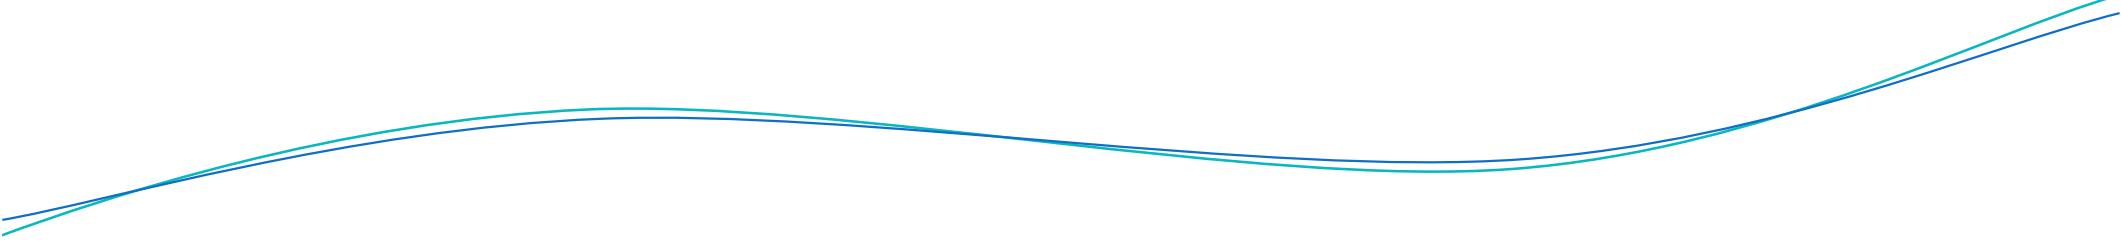


工事中の通行規制

工事中の通行規制


土砂搬出ヤード及び仮設歩道橋②撤去前における通行規制

(期間:令和6年4月～令和6年11月予定)

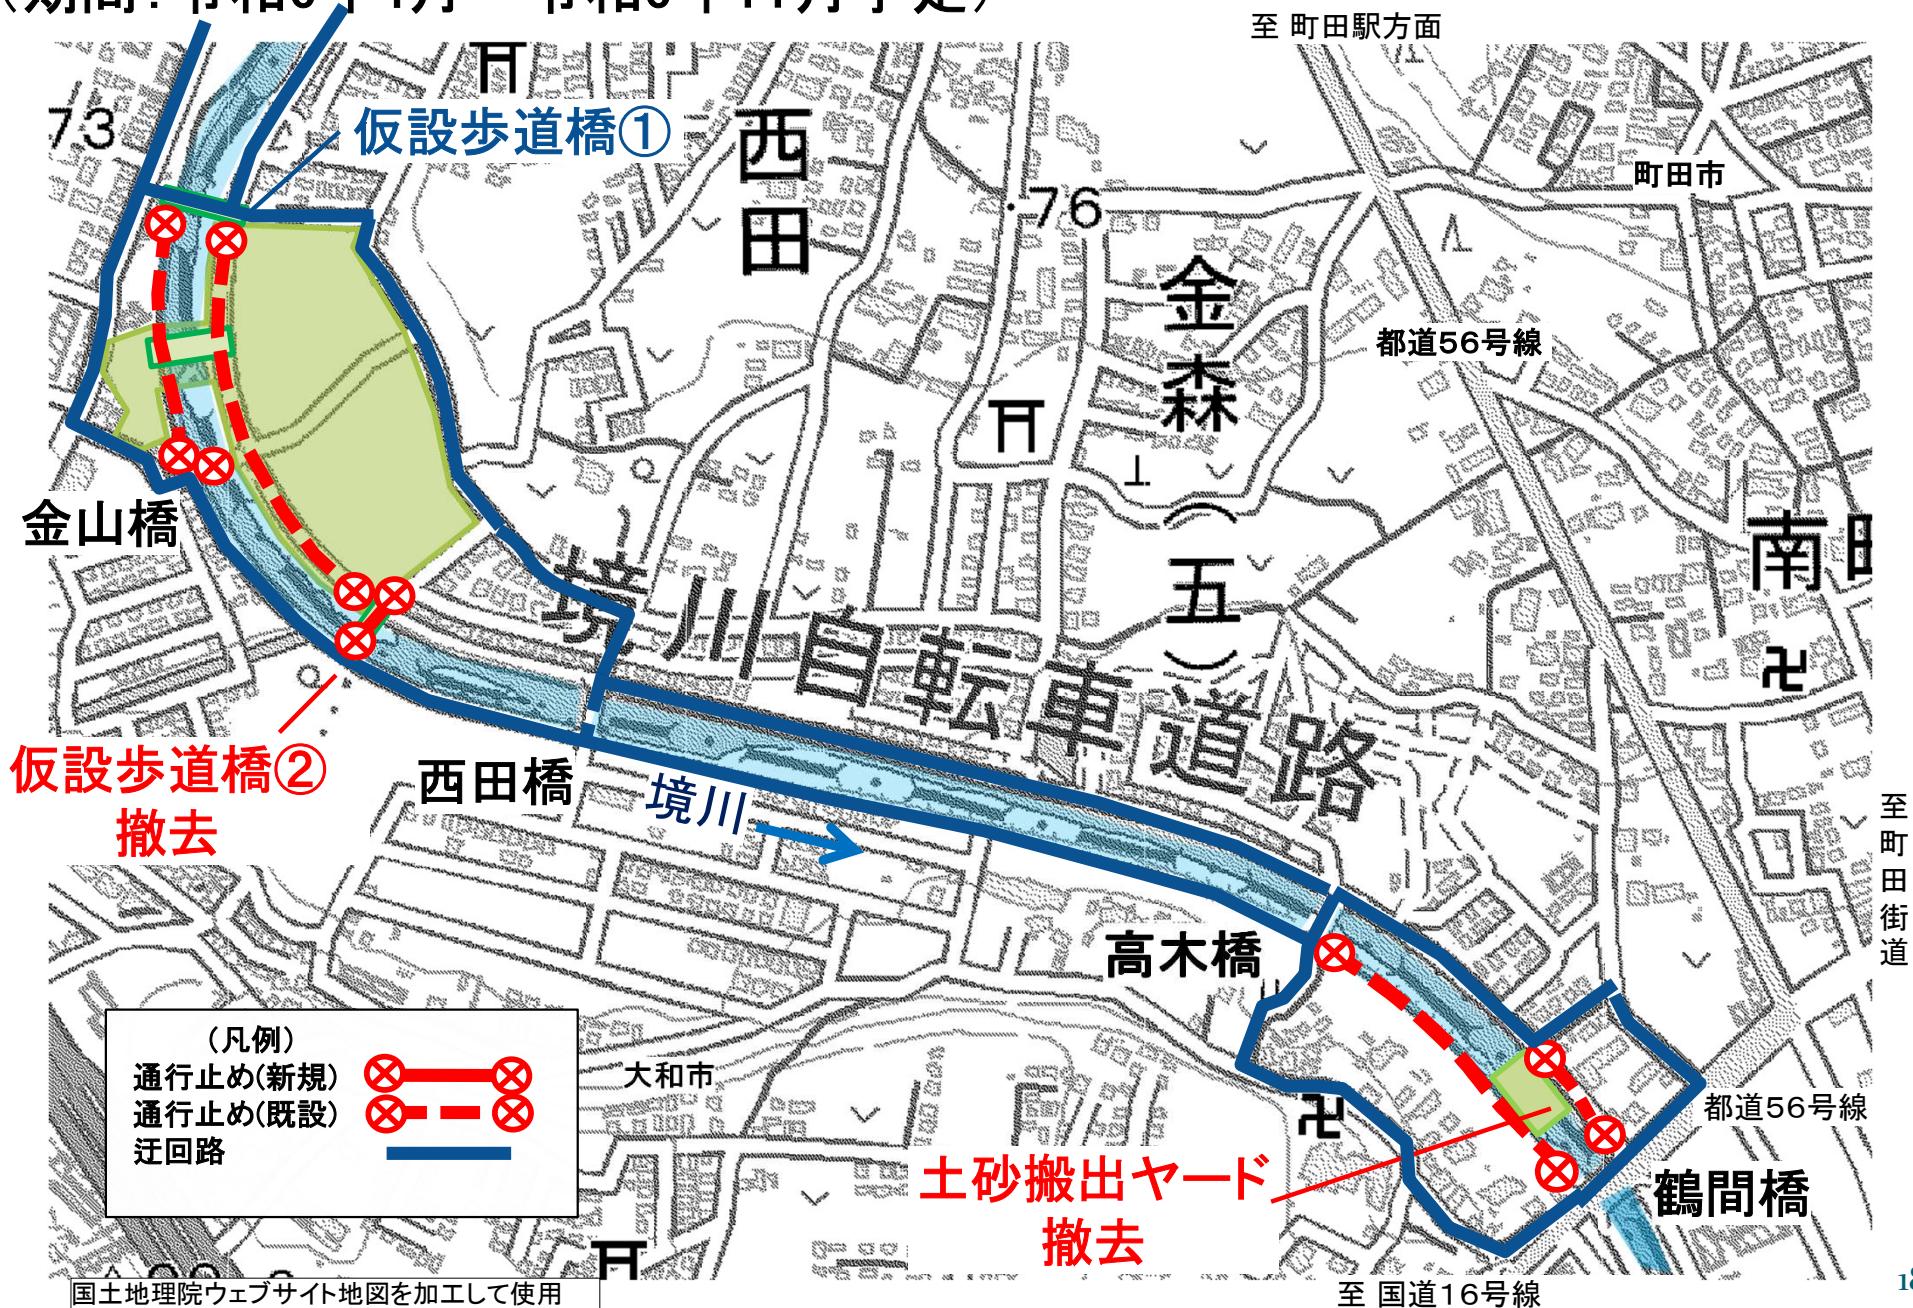

工事中の通行規制

撤去及び復旧完了後の通行規制と迂回路

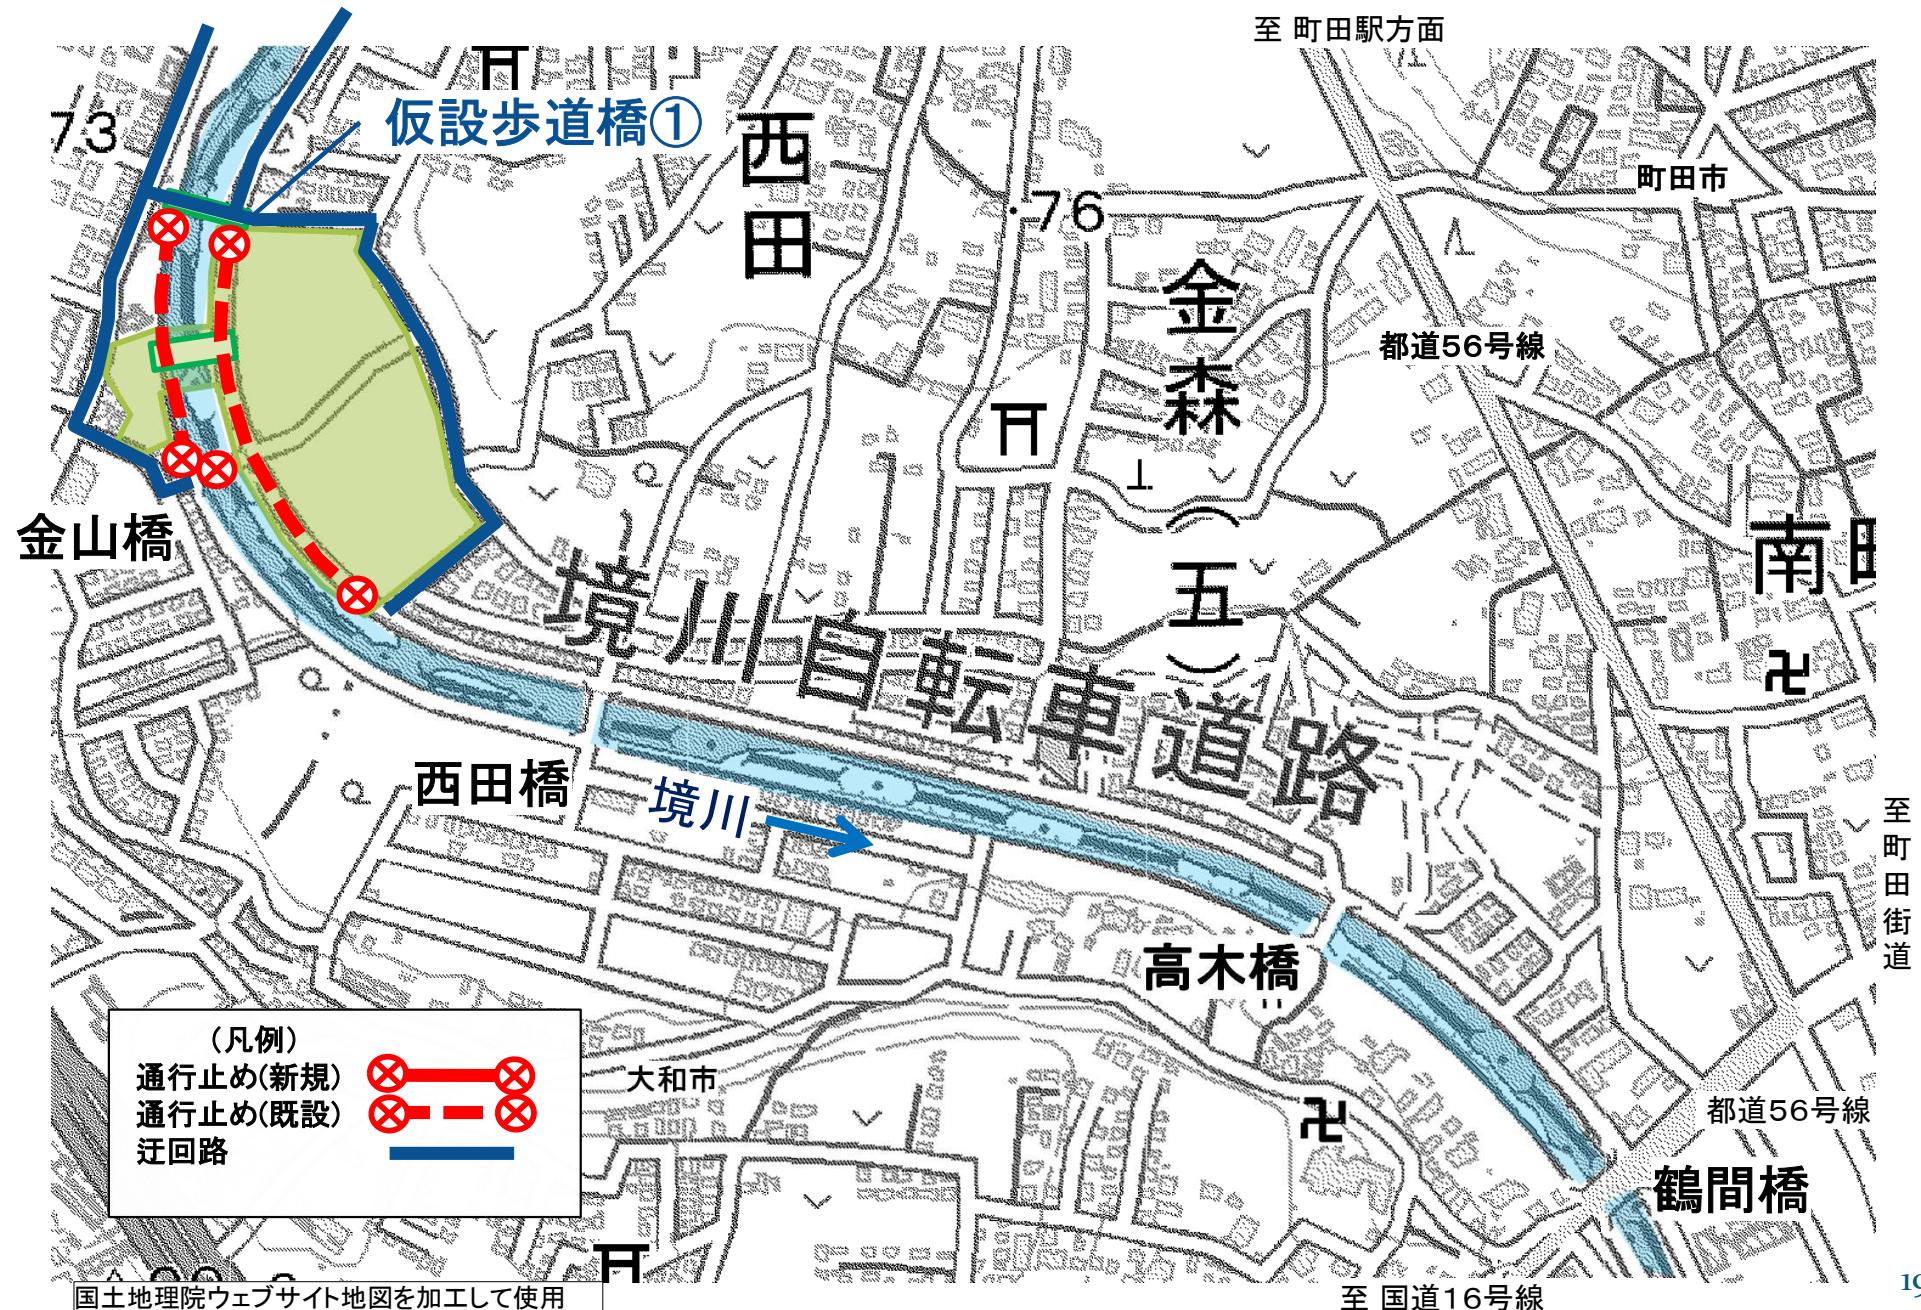


事業スケジュール

事業スケジュール予定


工事内容	平成30年度		平成31年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	28									
当初	境川金森調節池工事その2 【調節池本体工事】		2018年 10月着手								当初工期 2024年11月									
	境川金森調節池工事に伴う越流堤工事 【越流堤構築工事】						2024年2月 ⇒契約不調													
	境川金森調節池工事に伴う設備工事 【機械・電気設備工事】																			
	境川金森調節池工事に伴う管理棟建築工事 【管理棟建築工事】																			
変更	境川金森調節池工事その2 【調節池本体工事】										工期延伸 2025年11月									
	①境川金森調節池工事に伴う越流堤準備工事 【越流堤構築準備工事】										分割検討 ・再設計	仮締切工 土工事		完了時期 検討中						
	②境川金森調節池工事に伴う越流堤工事 【越流堤構築工事】		分割								分割検討 ・再設計		越流堤構築							
	境川金森調節池工事に伴う設備工事 【機械・電気設備工事】																			
	境川金森調節池工事に伴う管理棟建築工事 【管理棟建築工事】										着手時期検討中									

- 現在、②境川金森調節池工事に伴う越流堤工事の再発注に向けて検討・設計中
(1本目の①境川金森調節池工事に伴う越流堤準備工事については現在契約手続き中)
⇒詳細なスケジュールは②境川金森調節池工事に伴う越流堤工事契約後に
工事説明会等を開催し、説明予定



その他

工事後家屋調査手順について

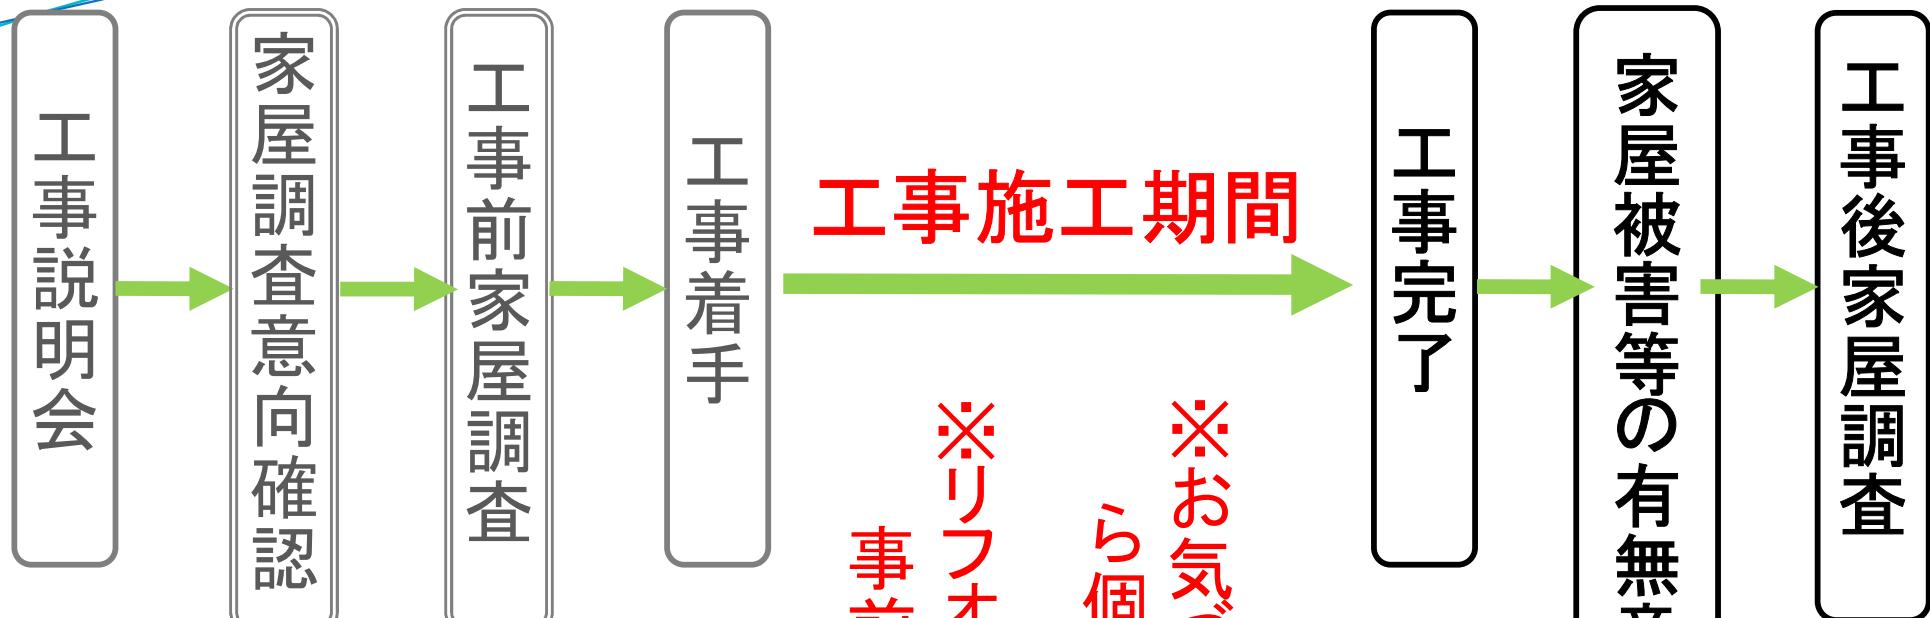

※お気づきの点がございましたら個別で対応致します。
※リフォーム修繕ある場合は事前にご連絡下さい。

インフォメーションセンター等設置位置図

インフォメーションセンター



(凡例)

防音壁

インフォメーションセンター

オープン日時

- ・毎週月～金曜日 午前9時～午後5時(工事稼働日)

主な設備

- ・事業の概要説明(模型、パネル、映像)
- ・工事の概要説明(工程等)
- ・ご意見箱



境川金森調節池模型



ご意見箱

お問合せ

①電話でのお問合わせ

東京都南多摩東部建設事務所工事課 TEL 042-720-8676

安藤ハザマ・東鉄・松尾建設共同企業体 TEL 042-850-6631

[受付時間] 平日 午前9時～午後5時

②メールでのお問合せ

工事情報ホームページのお問合せメールフォームからご連絡ください。

境川金森調節池 安藤ハザマJV



QRコード

お問合せ

③対面でのお問合せ

※ 少人数での事前予約制とさせていただきます。

[期間] 令和6年10月9日(水)、10日(木)

[時間] 午前9時～午後8時

[場所] インフォメーションセンター

注意事項

- ・前日までに予約をお願いします。
- ・予約は1回1時間までとします。
- ・ご家族やグループ等でお申し込みの方は、代表者2名様までの入室とさせていただきます。

ご希望の日時をお電話にてお申込みください。
