


境川金森調節池の概要



長さ：約190m
幅：約 90m
深さ：約 20m

貯留量 151,000m³
25mプール約500杯

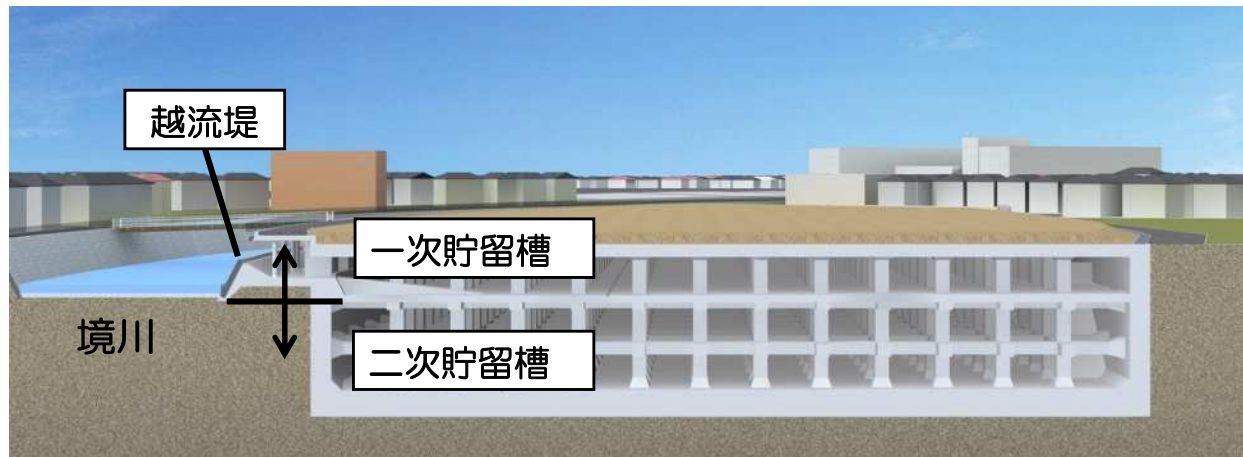

調節池本体工事の進捗について

調節池本体の頂版までコンクリートの打設を完了しました。

(天井の部分)

土工 掘削工 最終掘削完了 (約20m)
工事作業期間：令和2年12月～令和5年3月



※撮影日：令和5年3月

構築工 底版コンクリート打設状況



※撮影日：令和5年10月

構築工 頂版コンクリート打設状況



※撮影日：令和7年6月

構築工 頂版コンクリート打設完了



※撮影日：令和7年9月

越流堤準備工事の進捗について

河川内に進入するための仮設のスロープを設置し、
越流堤を施工するための仮締切の鋼矢板を設置中です。




仮設スロープの設置状況




河川内の仮締切のための
鋼矢板の打設状況

越流堤工事について

令和7年7月に越流堤工事が契約になりました。

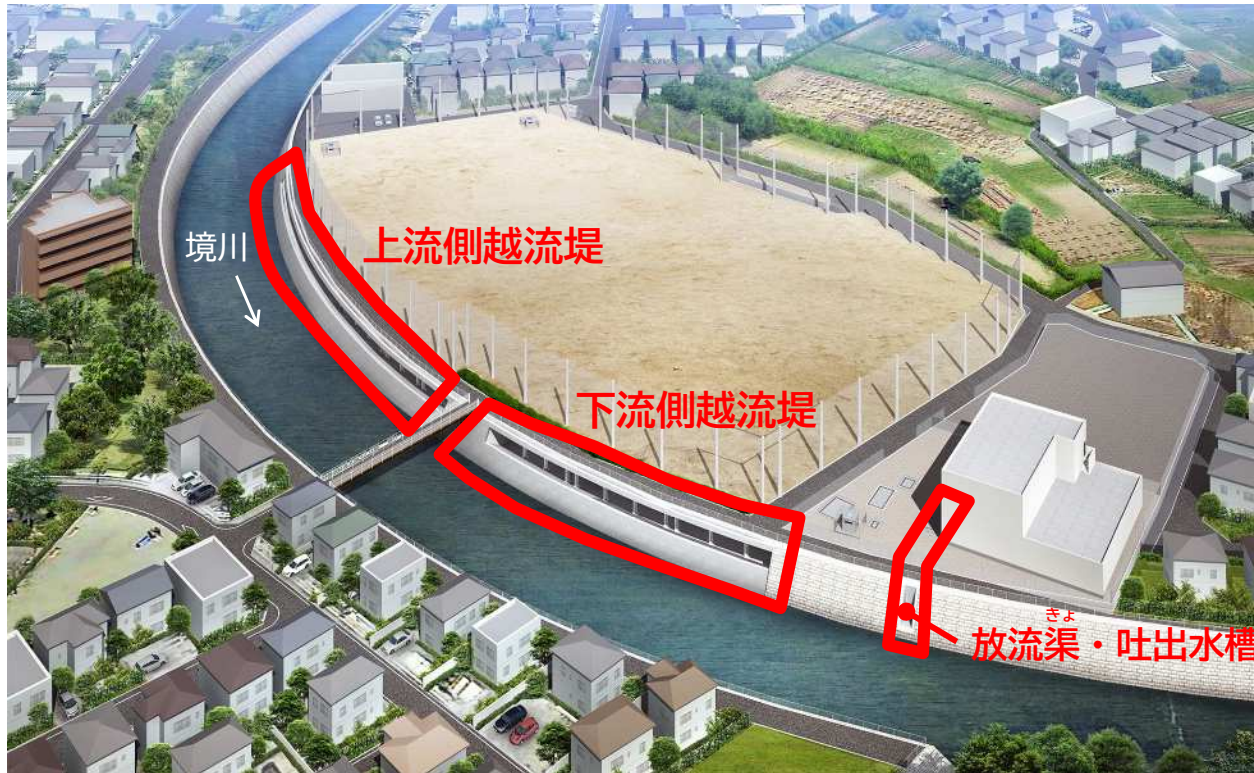


横断図

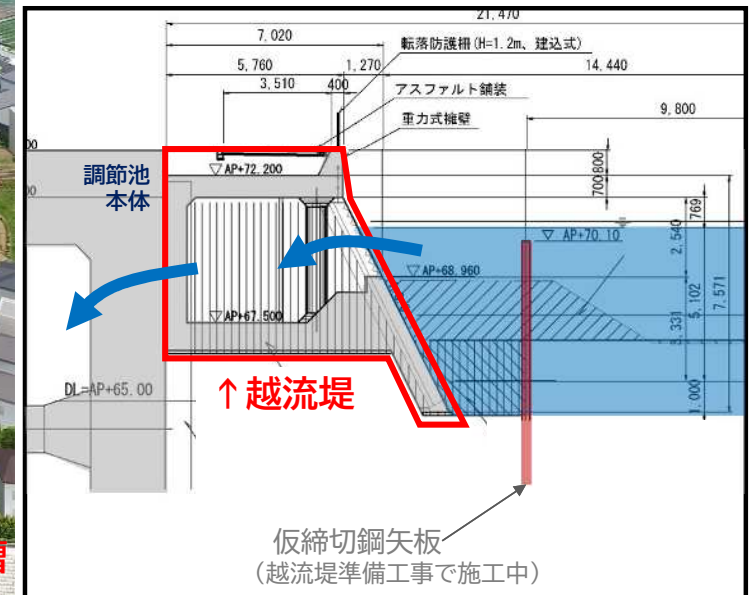

工事件名：境川金森調節池工事に伴う越流堤工事その2
受注者：多田建設株式会社
工期：令和7年7月14日～令和9年2月4日

越流堤工事について

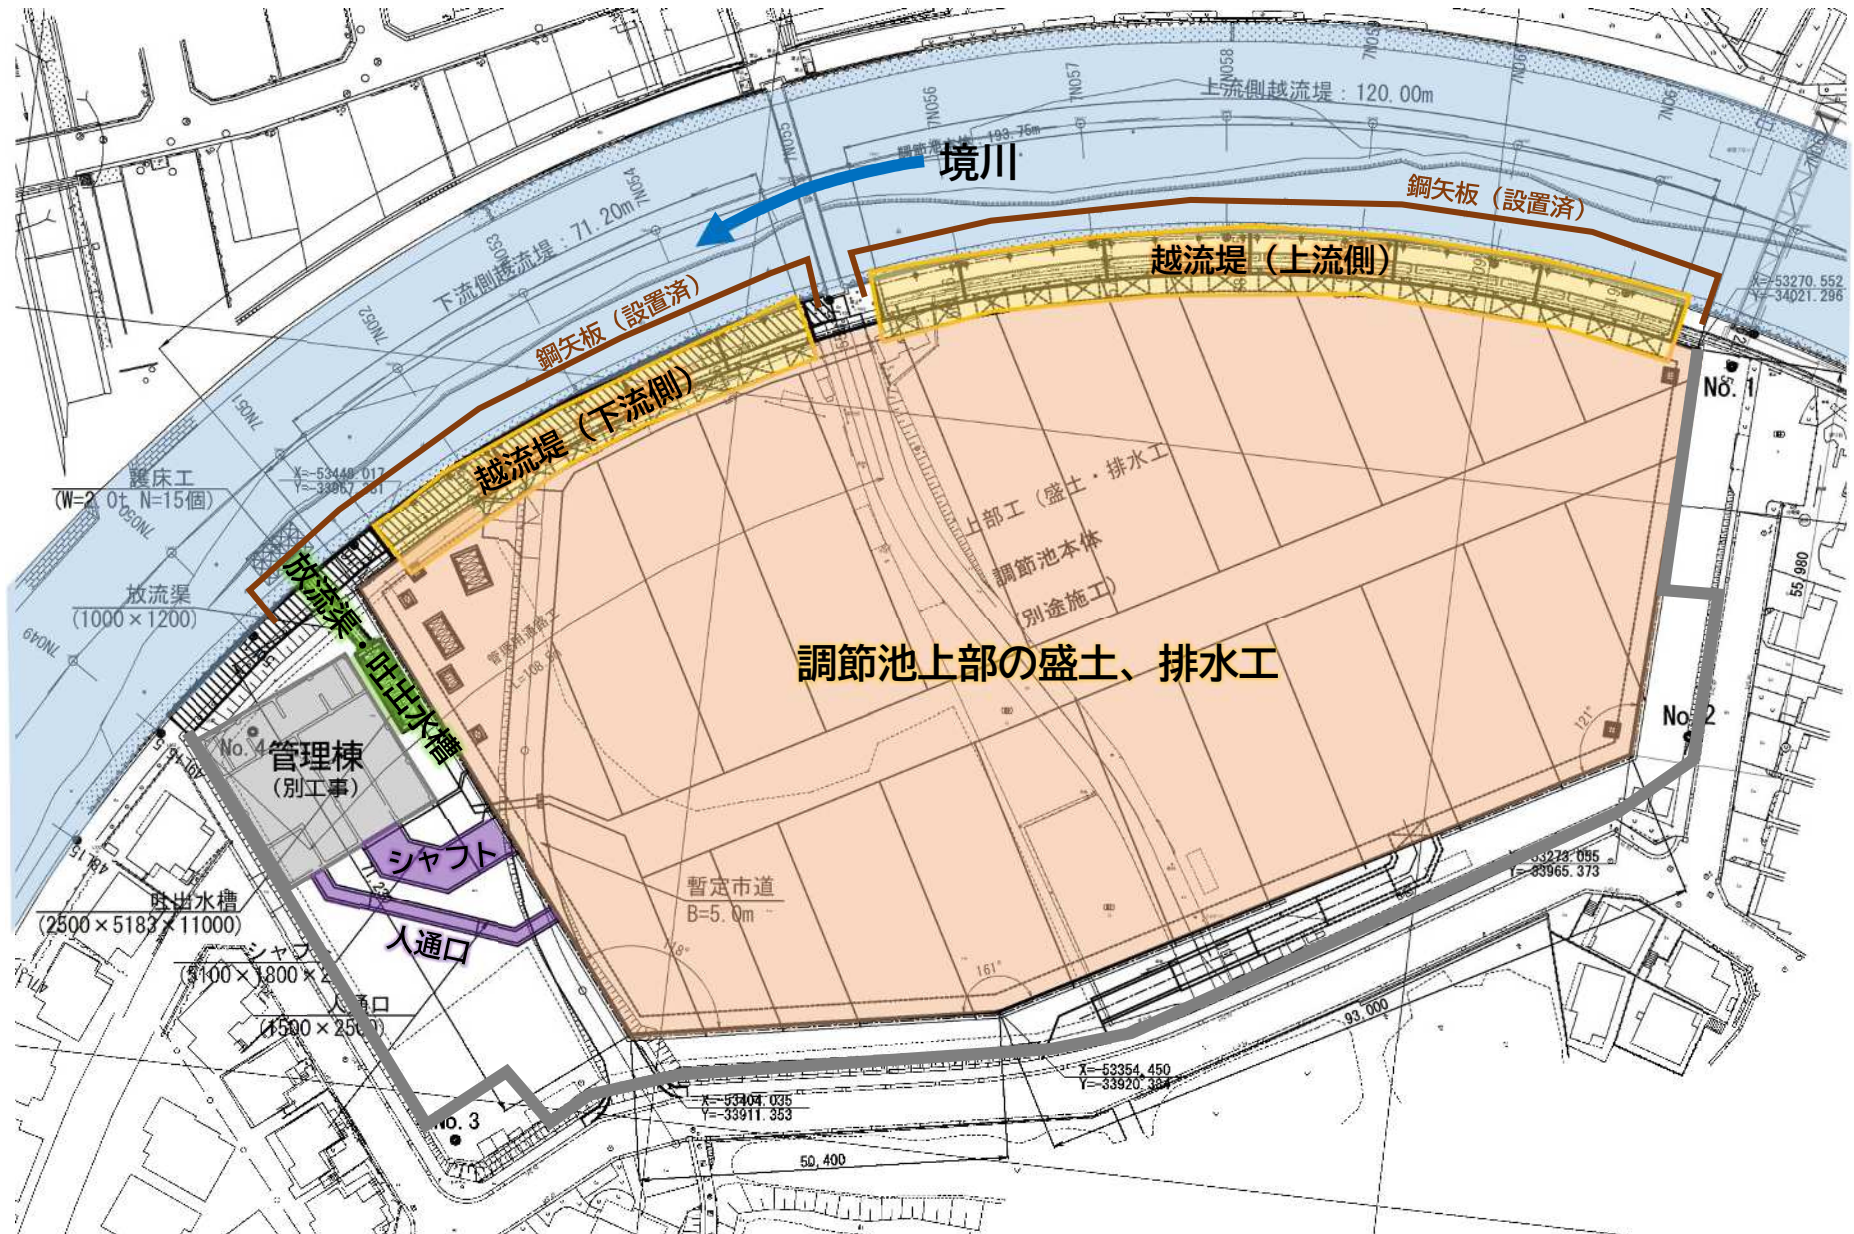

越流堤工事の施工イメージ



越流堤の完成状況
(境川木曽東調節池工事より)

① 越流堤を施工するために掘削を行います。



② 鉄筋を組み立てます。



③ コンクリートを打設します。



工事の搬出入ルート

工事用車両は相模原市側から進入し、町田市側を通ります。



通行車両台数予測

調節池付帯構造物構築時（令和8年2月～4月）

- ・週1～2回程度の頻度で1日に約30台



通行車両台数予測

越流堤構築時（令和8年5月～12月）

- ・週1～2回程度の頻度で1日に約20台 車両通行が集中する日：1日に約40台（月3回程度）



交通ルール

○工事車両の運行ルール

これまでと同様です。

- (1) 4t車以上の工事車両は、ルート①、ルート②を9:00～17:00に通行します。
相模原市道 町田市道
- ※ 大型トレーラー・クレーン車等の特殊車両は、法令で運行時間が21:00～6:00に制限されているため、深夜・早朝に入場する場合があります。
- ※ 通勤車両(4t車未満、乗用車など)は7:30前までに入場します。
- (2) 工事車両及び通勤車両には、運転席前に認識カードを明示します。
- ※ 配達車両(郵便、宅配)などは除きます。
- (3) ルート②は徐行して走行します。
町田市道
- (4) 横断歩道の横断者及び一般車両の通行を優先します。
- (5) 決められたルート以外の通行を禁止します。
- ※ 周辺道路(都道56号線等)に待機駐車はしません。

東京都南多摩東部建設事務所

境川金森調節池

NO. 1

多田建設

認識カード

交通ルール

これまでと同様です。

○交通誘導員ルール

- (1) 地域の方を優先し、工事車両を誘導します。
- (2) 工事車両の誘導時には、歩行者の安全確保に努めます。
- (3) 安全で分かりやすい誘導に努めます。

※ 警備業法上、工事車両が関わらない一般車両の誘導はできません。

工事中の通行規制

引き続き、工事範囲周辺の通行時の迂回にご協力お願いします。



事業スケジュール

■ 早期の事業完了に向けて、安全に十分配慮しながら着実に工事を進めます

工事内容		平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
当初（R6年9月説明時）	境川金森調節池工事その2 【調節池本体工事】										
	境川金森調節池工事に伴う越流堤準備工事 【越流堤構築準備工事】										
	境川金森調節池工事に伴う越流堤工事 【越流堤構築工事】										
	境川金森調節池工事に伴う設備工事 【機械・電気設備工事】										
	境川金森調節池工事に伴う管理棟建築工事 【管理棟建築工事】										
変更	境川金森調節池工事その2 【調節池本体工事】										
	境川金森調節池工事に伴う越流堤準備工事 【越流堤構築準備工事】										
	境川金森調節池工事に伴う越流堤工事 【越流堤構築工事】										
	境川金森調節池工事に伴う設備工事 【機械・電気設備工事】										
	境川金森調節池工事に伴う管理棟建築工事 【管理棟建築工事】										

仮締切工
土工事

越流堤構築

工期延伸
令和8年6月

○ 越流堤準備工事にて、**地盤条件が当初想定と異なる**ことが判明

○ **工事の遅れが最小**になるよう、関連する3つの工事工程を調整

施工方法
再検討
仮締切工
土工事

越流堤構築

※工事件名の太字は“契約済”、細字は“未契約”を表す

令和8年度
取水開始予定

最後に

引き続き、皆様にはご不便等をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
工事についてご不明な点などがございましたら、下記の方法にて
お問い合わせください。

①電話でのお問い合わせ

東京都南多摩東部建設事務所工事課

TEL 042-720-8676

【調節池本体工事及び越流堤準備工事受注者】

安藤ハザマ・東鉄・松尾建設共同企業体

TEL 042-850-6631

【越流堤工事受注者】

多田建設株式会社

TEL 090-8776-2178

【受付時間】 平日 午前9時 ～ 午後5時

②メールでのお問合せ

工事情報ホームページのお問合せメールフォーム
からご連絡ください。

境川金森調節池 安藤ハザマJV



QRコード
15
