
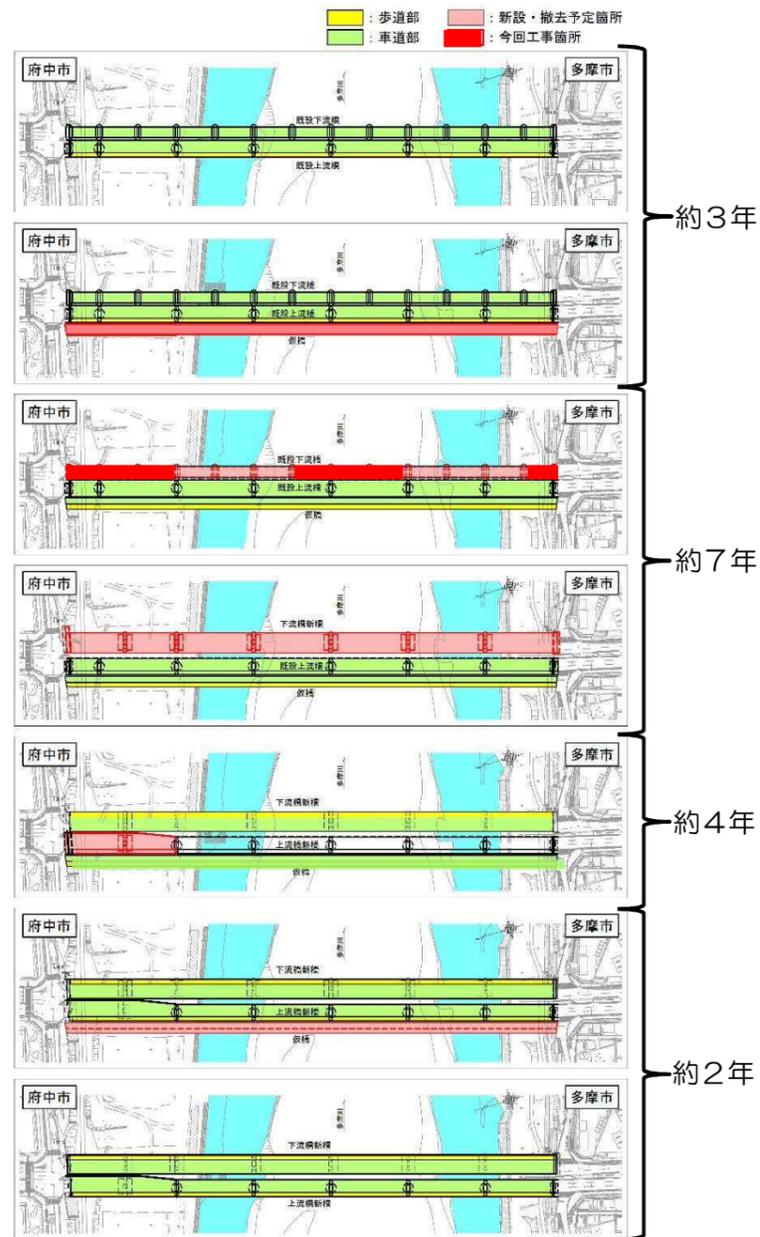


■ 関戸橋架け替え工事手順

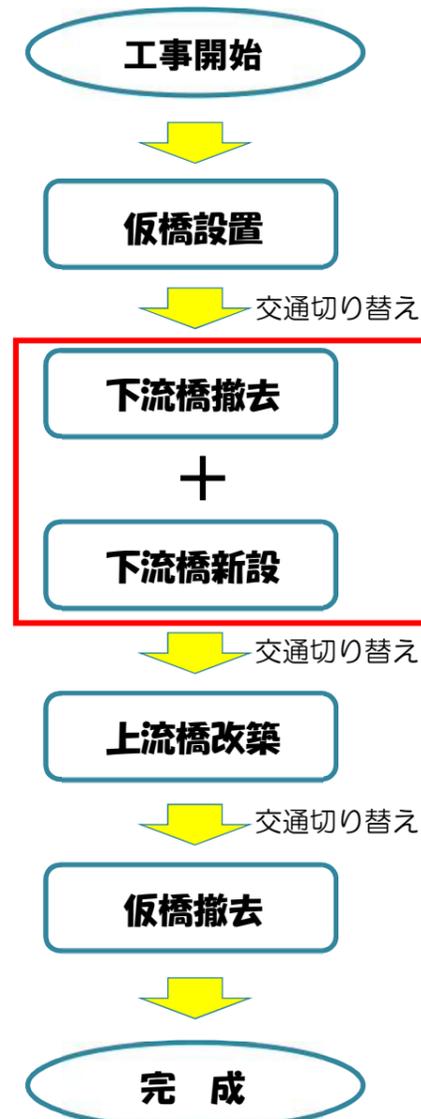

【お問い合わせは・・・】

○事業・下流橋撤去工事に関すること

東京都北多摩南部建設事務所

工事第一課 設計担当 ☎ 042-330-1838
 〒183-0006 東京都府中市緑町1-27-1
<http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kitanan/>

○仮橋工事・交通切り替えに関すること

東京都南多摩東部建設事務所

工事課 道路設計総括担当 ☎ 042-720-8643
 〒194-0021 東京都町田市中町1-31-12
<http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/nantou/>

※ 「関戸橋通信」バックナンバーは、HPにて公開中です。

関戸橋通信

～多摩市と府中市を結ぶ
 関戸橋架け替え事業～



Vol. 5
 2018.10

発行
 東京都北多摩南部建設事務所 工事第一課
 東京都南多摩東部建設事務所 工事課
<http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kitanan/>
 ※「関戸橋通信」バックナンバーは、HPにて公開中です。

■いよいよ下流橋の撤去工事がスタート ～ 4年目からの撤去工事に着手 ～

日頃より東京都の道路整備事業の推進に、ご理解とご協力を賜り御礼申し上げます。
 平成28年1月から現場着手した仮橋設置工事は、地域にお住いの皆様や橋を利用する多くの方々のご理解とご協力により、当初計画通り、無事完了することができました。事業として大きな節目を無事に迎えられたこと、改めて皆様に深く御礼申し上げます。
 着手から4年目となる今年11月からは、いよいよ下流橋の撤去・新設工事を進めてまいります。

今後も車両の出入りや一時的な交通規制などで、ご利用の皆様には何かとご不便をおかけする場面もございますが、安全第一で着実に工事を進めてまいりますので、引き続き、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。



けんちゃん・せつちゃん

東京都北多摩南部建設事務所長
 東京都南多摩東部建設事務所長



仮橋舗装工事及び取付道路改修工事の状況（府中市側から多摩市側を望む） 平成30年9月撮影

下流橋撤去及び新設工事の概要

今年 11 月から以後約 7 年かけて行う工事は、下流橋（旧橋：昭和 12 年築造）の撤去工事と新設工事を合わせて行う工事となります。橋脚は、現在水が流れている滞筋の中にも位置しているため、橋脚の撤去・新設工事は、非出水期^{※1} ごとに、数回の瀬替え^{※2} を繰り返しながら施工していく必要があります。大きな瀬替えに伴い、期間のかかる工事となるため、撤去した箇所から順次新しい橋脚を設置していく効率的な工程としています。


撤去工事の初年度にあたる、今回の 4 年目工事では、瀬替えを行わず撤去できる箇所（橋桁 7 径間、橋脚 4 基）を撤去する予定です。施工にあたっては、騒音や一時的な交通規制など周辺の皆様には何かとご不便ご迷惑をおかけするかとと思いますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

※1 非出水期：夏場に比べ雨量が少なく河川内の水位が低くなる 11～5 月の期間のこと。別名「渇水期」。河川内工事は特定の工種を除いて、原則非出水期に工事を行います。


※2 瀬替え：新しい河道を掘削して滞筋の流れを変える工事のこと。工事完了後は元の位置に戻します。（vol. 3 参照）

■ 旧下流橋 ※今年 11 月から撤去開始予定

※来年秋頃から撤去工事と新設工事を並行して施工

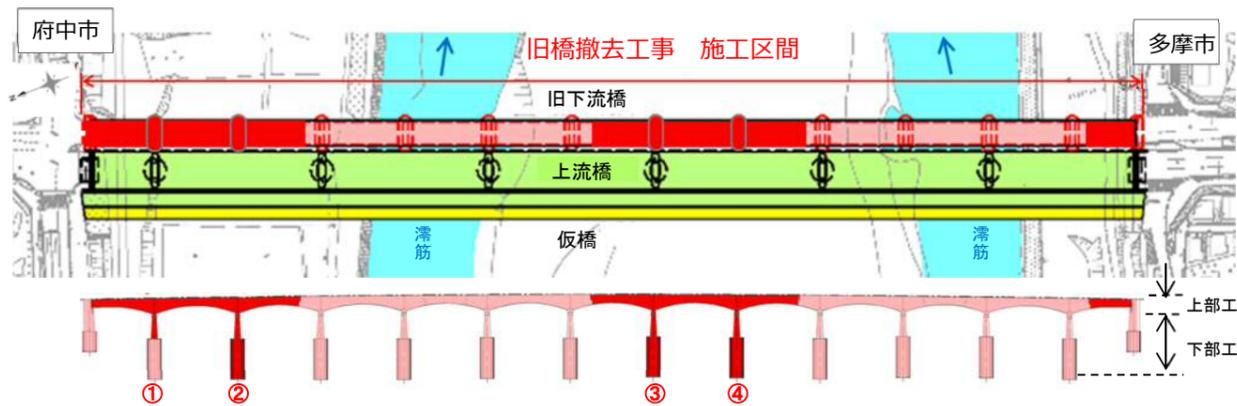

■ 新下流橋 ※来年秋頃から着手予定

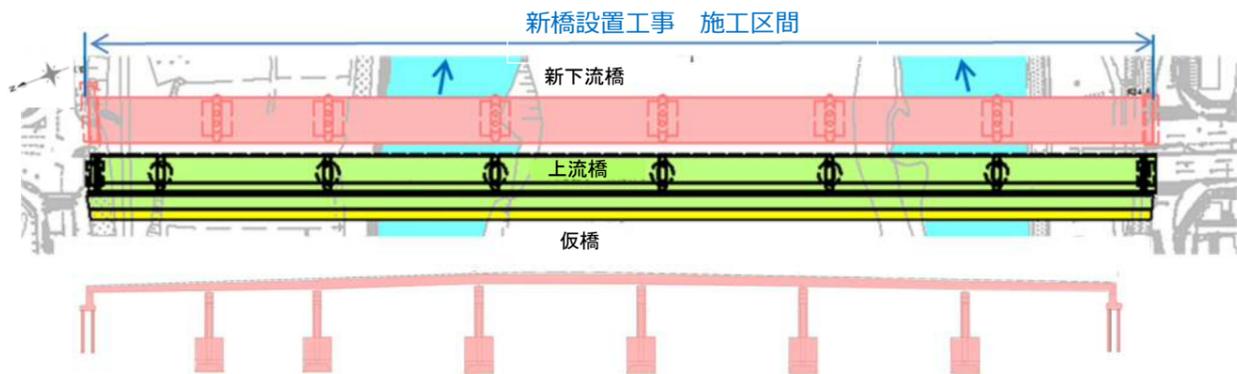


[凡例] 緑色部 車道部 赤色部 今回施工箇所
黄色部 歩道部 赤色部 次回以降施工箇所

交通切り替えの状況


下流橋の撤去工事を行うためには、現在の下流橋の交通を上流橋と仮橋に切り替える必要があります。現況は下図のようになっており、今後、段階的に交通を切り替えていきます。

■ 現況（第 1 回切り替え後）

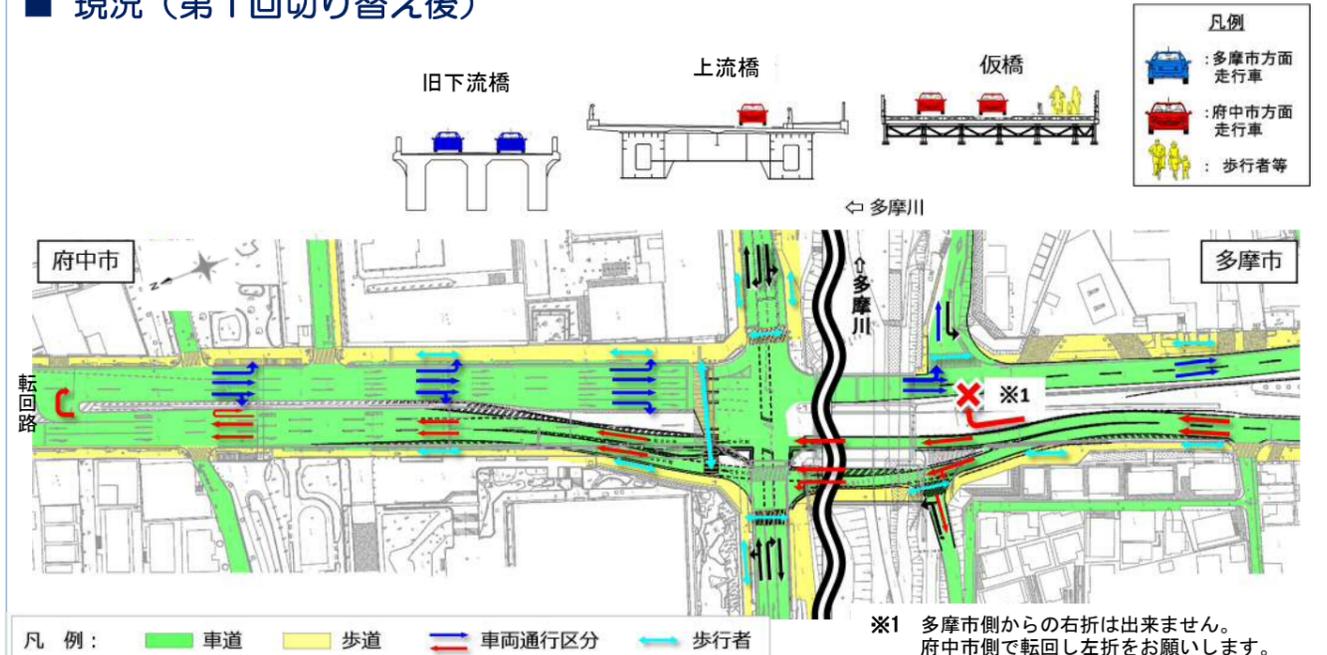

引き続き、交通の切り替えを行い、旧下流橋撤去時には下図のような交通の流れになります。

■ 交通切り替え完了後

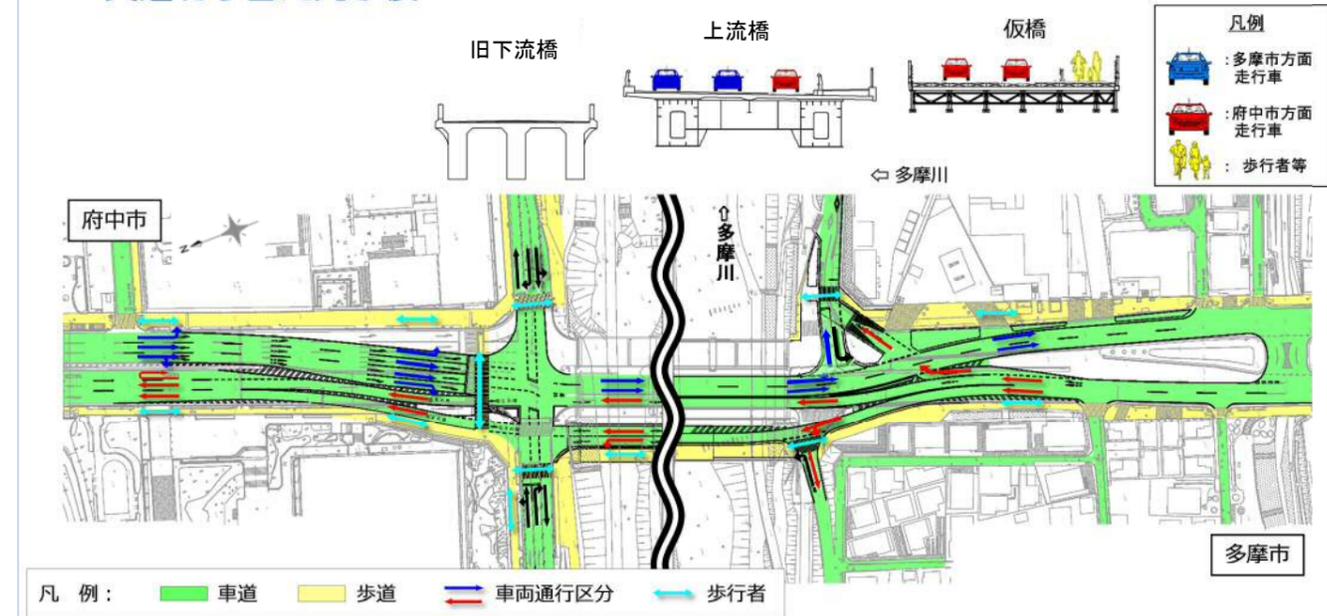

今後の交通切り替えについては、日程等が決まり次第周知させていただきます。
