

# 工事説明会資料

篠崎公園園地等整備準備工事

令和4年8月

# 工事概要

工事件名：篠崎公園園地等整備準備工事

工事場所：東京都江戸川区上篠崎一丁目 地内

工事期間：令和4年8月下旬～令和5年5月9日

受注者：アゴラ造園株式会社      現場代理人：柚木 秀和(ゆのき ひでかず)



作業時間：原則 8:00～18:00

\* 土日祝日の作業は工事の進捗により判断します。

## 主な工事内容

- ・ 排水, 電気, 通信設備の撤去・新設
- ・ 樹木の処理
- ・ 公園内施設, 舗装の一部撤去
- ・ 第一駐車場の一部撤去
- ・ 区道の舗装, 埋設排水管撤去


# 工事エリア

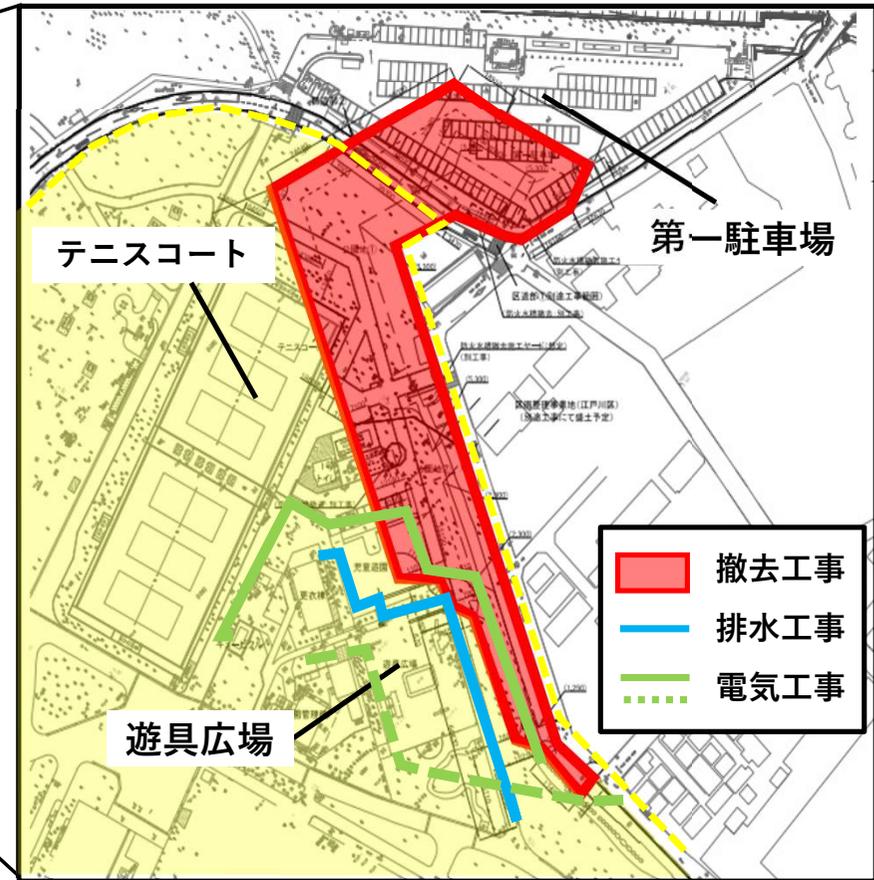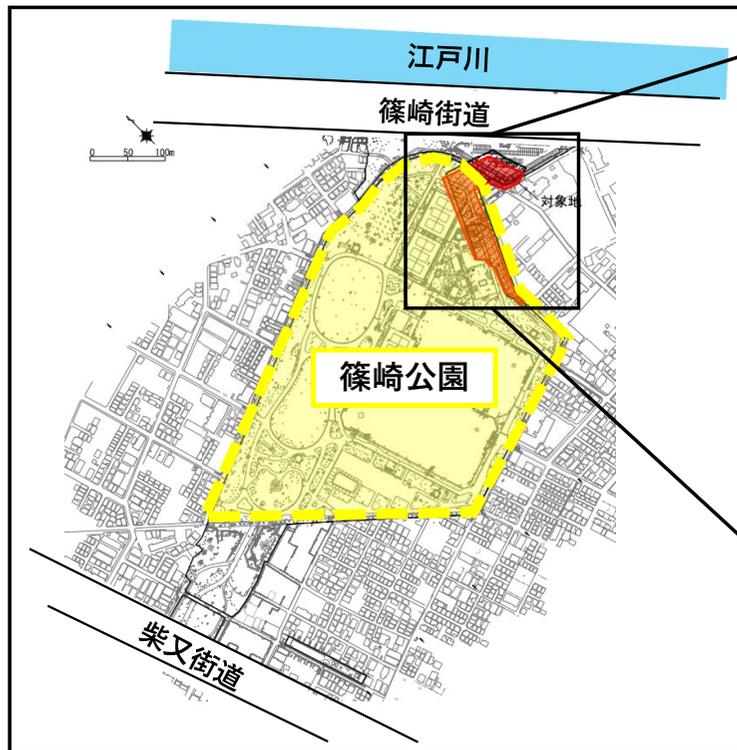


\* **■** の範囲では撤去工事，**—** ではそれぞれ排水管工事，電気の配管・配線工事を行います。（**⋯** は通信線工事）

# 工事内容①

## 仮設・安全施設

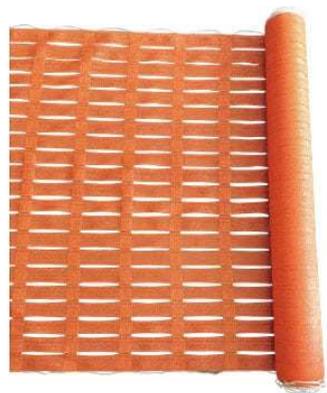

オレンジネット

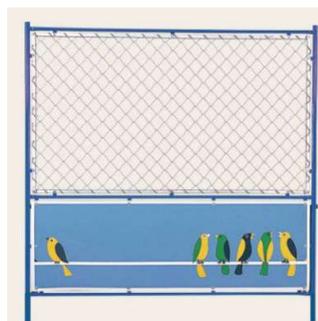

B型バリケード




単管バリケード





カラーコーン

# 工事内容②

## 排水設備工事

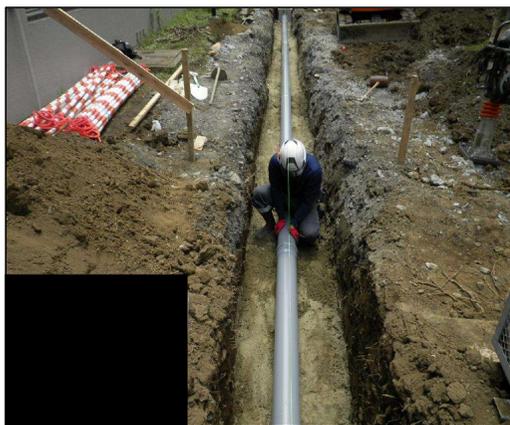

## 電気・通信設備工事

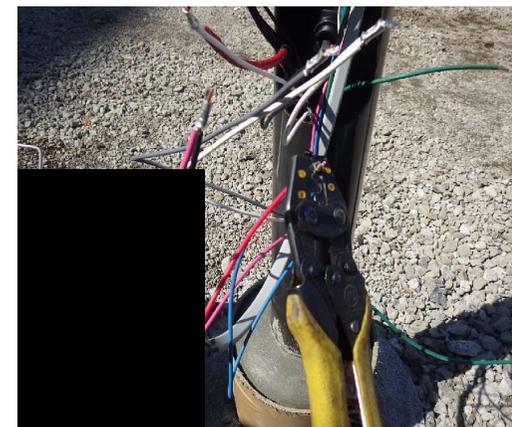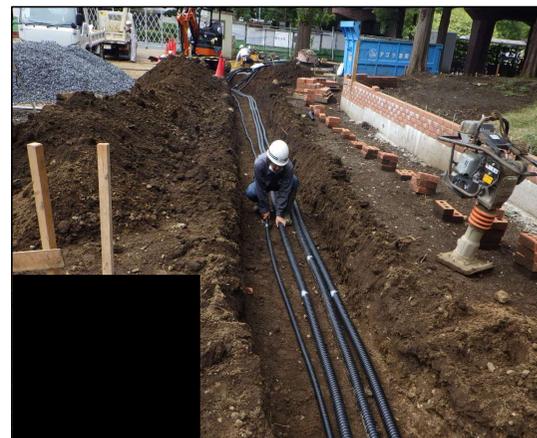

# 工事内容③

## 樹木の処理

伐採・抜根





移植




## 施設・舗装撤去



# 工事内容④ ～樹木の移植伐採について～

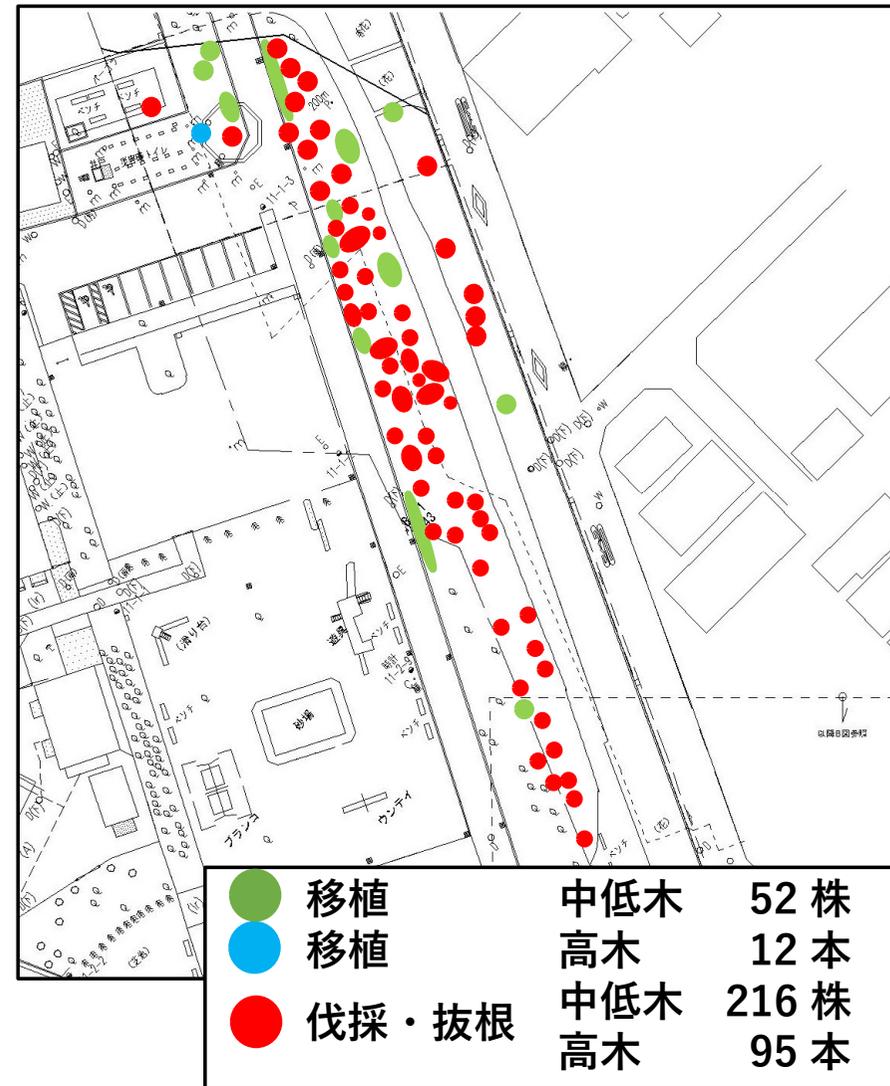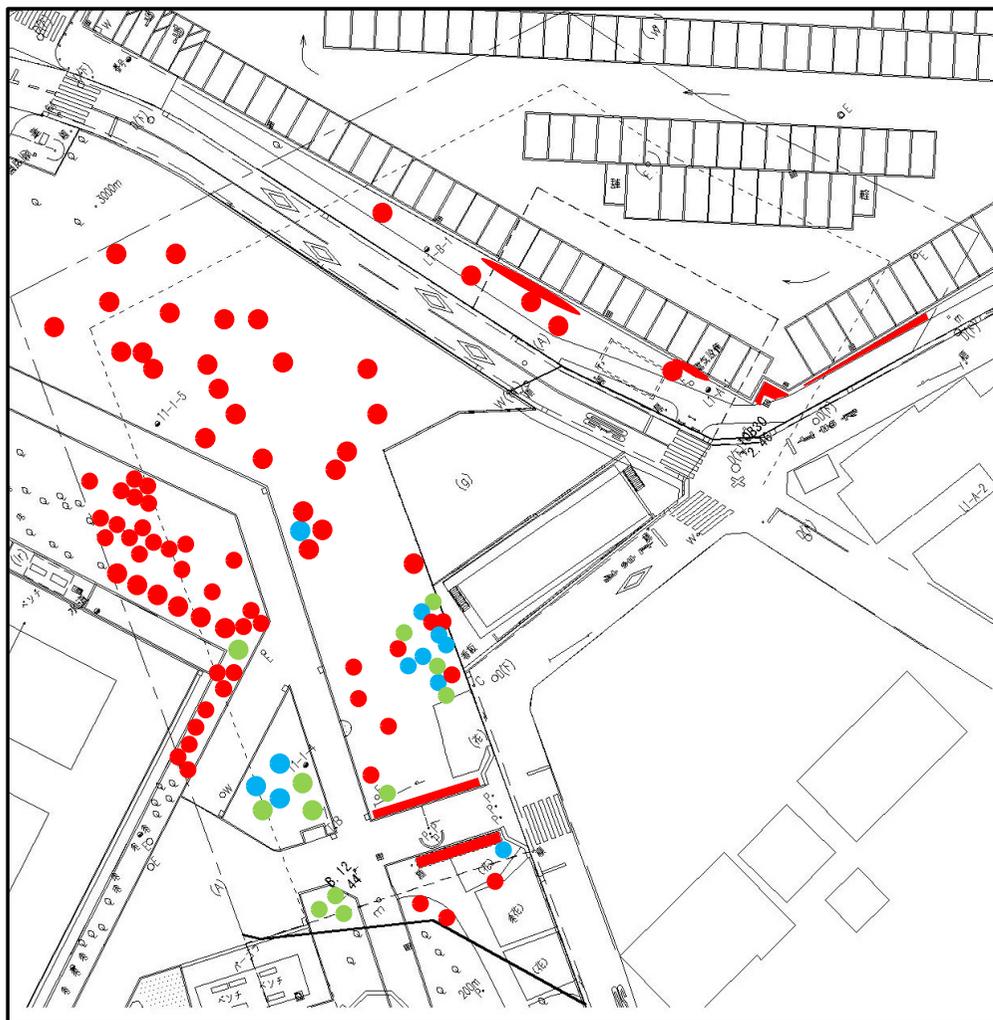

# 本工事の流れ①

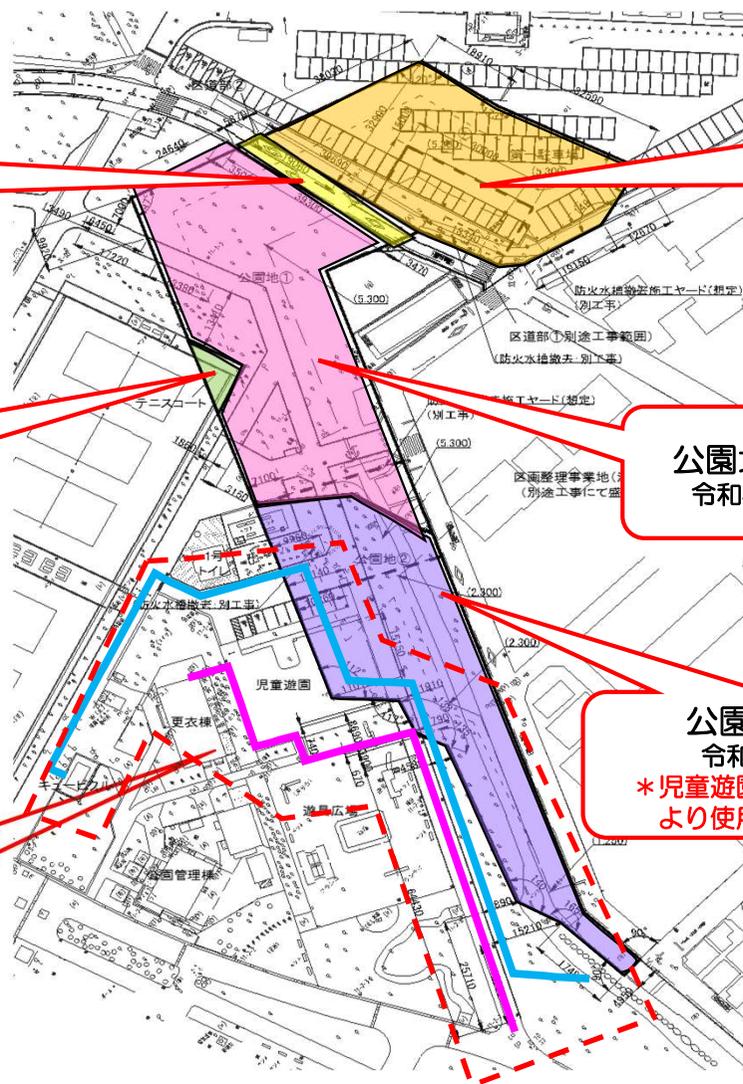

区道部②エリア  
仮設道路完成後（令和4年12月）着工  
\*令和4年11月末より通行止め予定

第一駐車場エリア  
令和4年8月下旬着工  
\*令和4年11月から新駐車場  
完成まで一部を暫定使用

テニスコートエリア  
令和5年4月着工  
\*令和5年4月より使用中止

公園地①エリア  
令和4年9月着工

公園地②エリア  
令和4年9月着工  
\*児童遊園は令和4年11月  
より使用中止

施設切回し工事  
令和4年9月～10月


# 本工事の流れ②

## 工程表

種 別	令和4年 8月	9月	10月	11月	12月	令和5年 1月	2月	3月	4月	5月
準備・調査・仮設	■	■								
施設切回し工事		■	■							
公園地①エリア		■	■	■				■		
公園地②エリア		■	■	■			■			
第一駐車場エリア	■	■	■	■	■					
区道部②エリア					■	■				
テニスコートエリア									■	
片付け								■	■	■


# 作業予定(9月, 10月)①

作業予定(9月~10月)

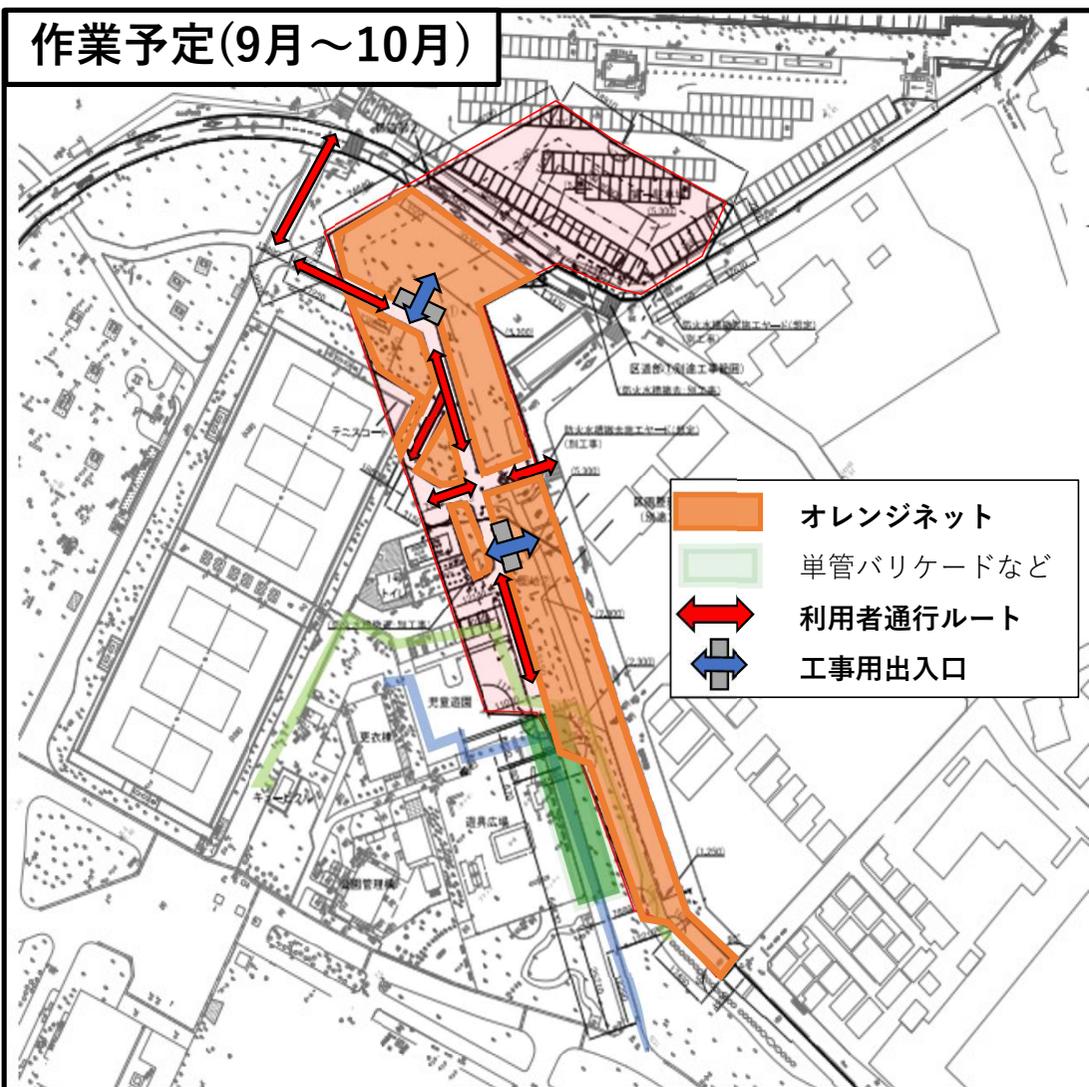


## ○撤去工事

\* オレンジネットで区画された中で作業を行います。

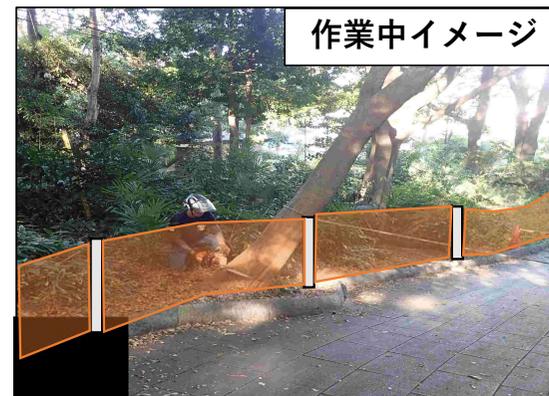


\* 歩行者、自転車が通行する際は誘導員が合図を送り適宜、作業を一旦停止します。

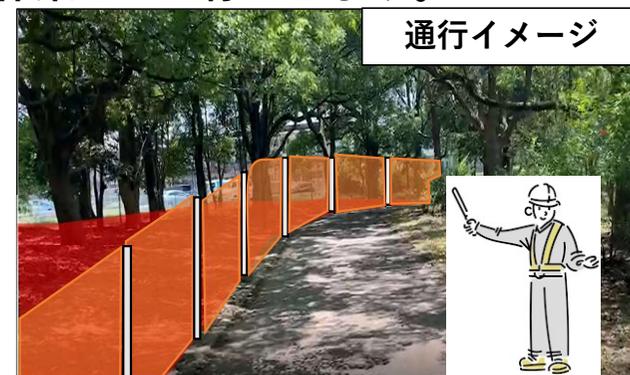

# 作業予定(9月, 10月)②

作業予定(9月~10月)

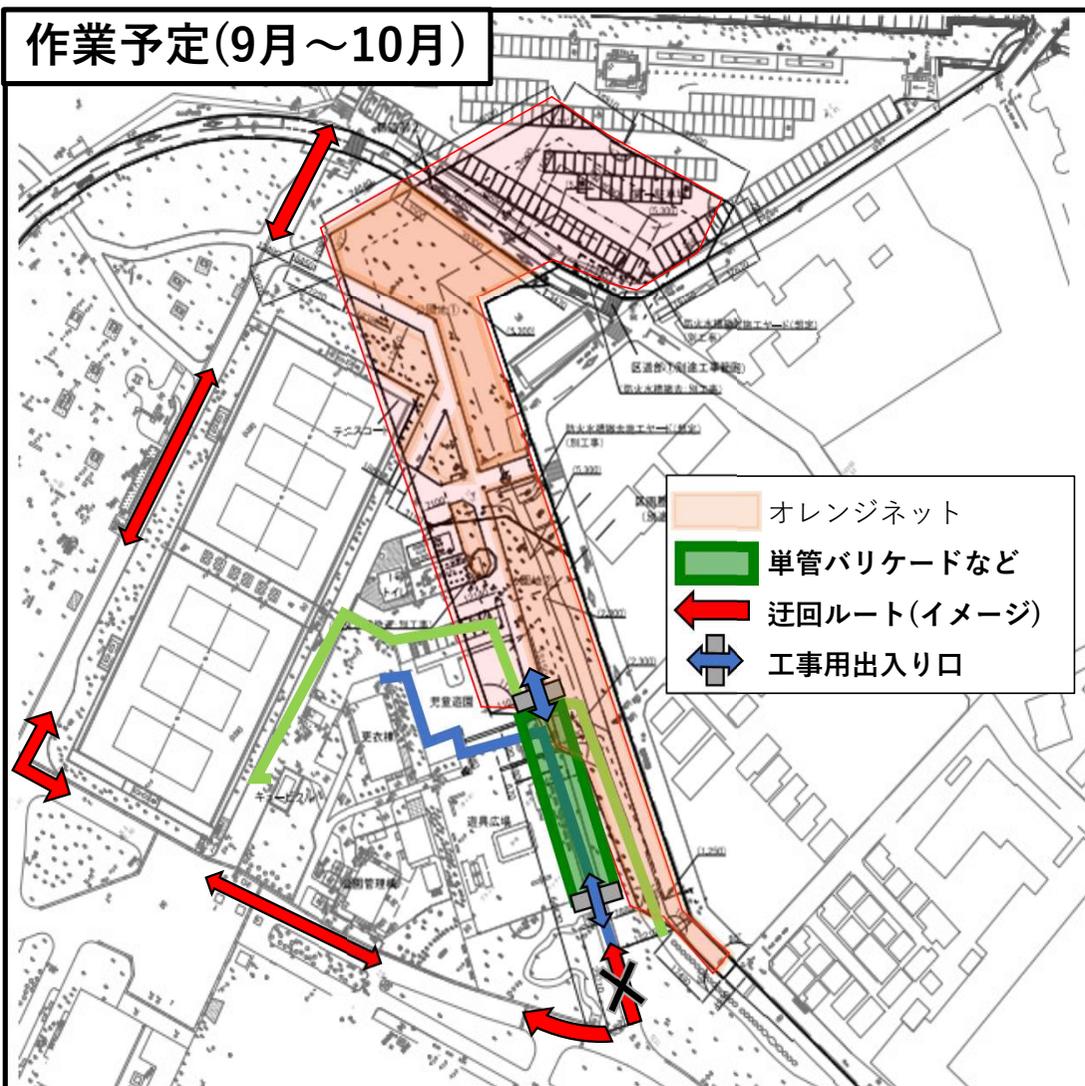


## ○排水・電気設備工事

\*単管バリケード, カラーコーン, コーンバーで作業範囲を区画し進捗に沿って区画を移動させます。




作業中イメージ

\*園内歩道の一部通行止めにして作業を行います。その際は迂回をお願いいたします。

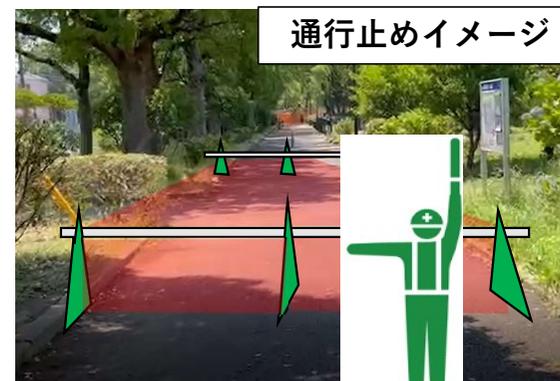

通行止めイメージ

# 作業予定(11月)①

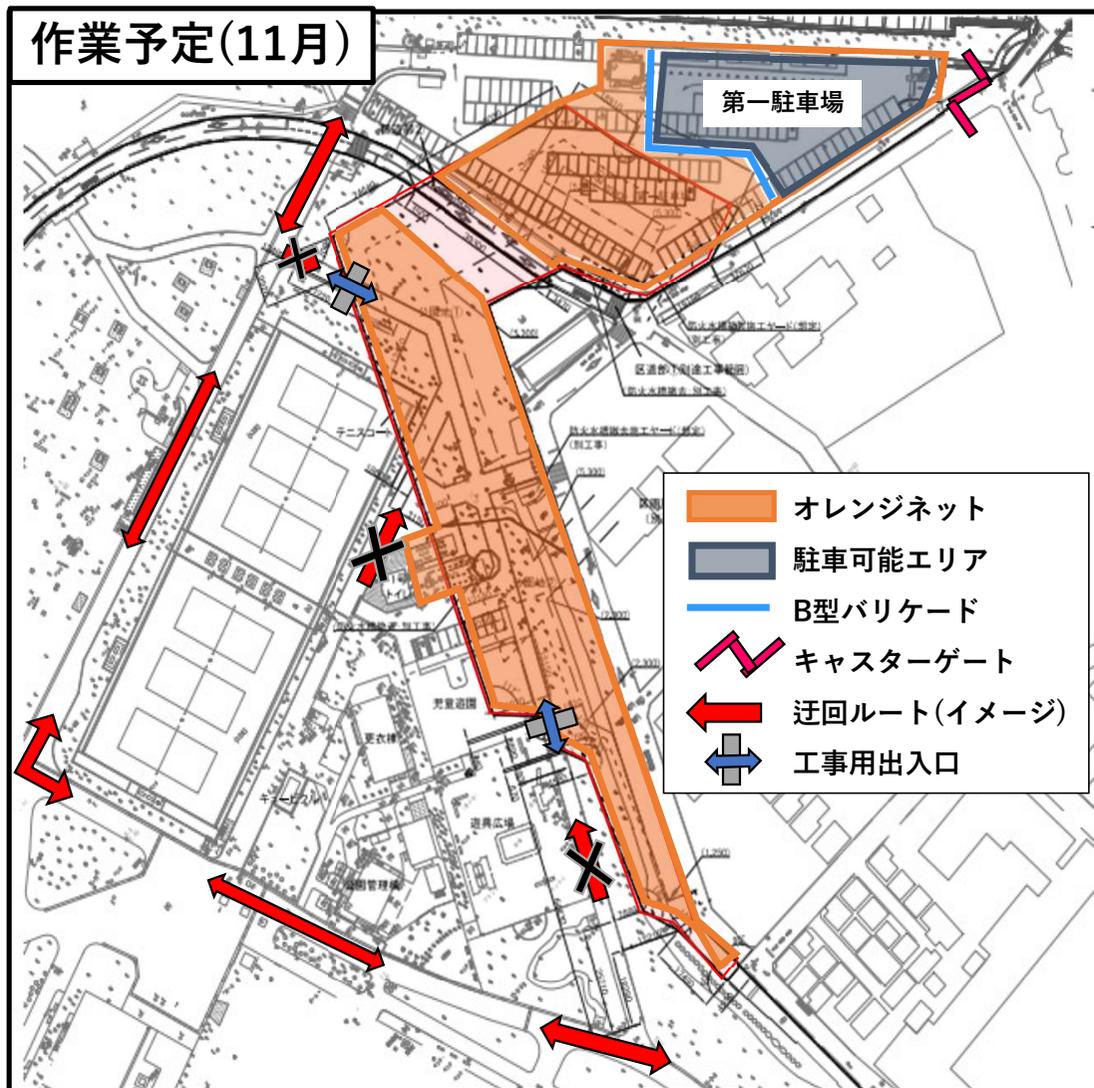

## ○撤去工事

- \* 排水・電気の設備工事はこれまでに終了予定
- \* オレンジネットでの区画を広げ、引き続き撤去工事を進めます。




- \* 通行止めや一部利用できない施設が発生します。

## ○駐車場の利用制限


- \* 園内に加え、第一駐車場での撤去工事を開始するため駐車エリアが制限されます。

# 作業予定(11月)②

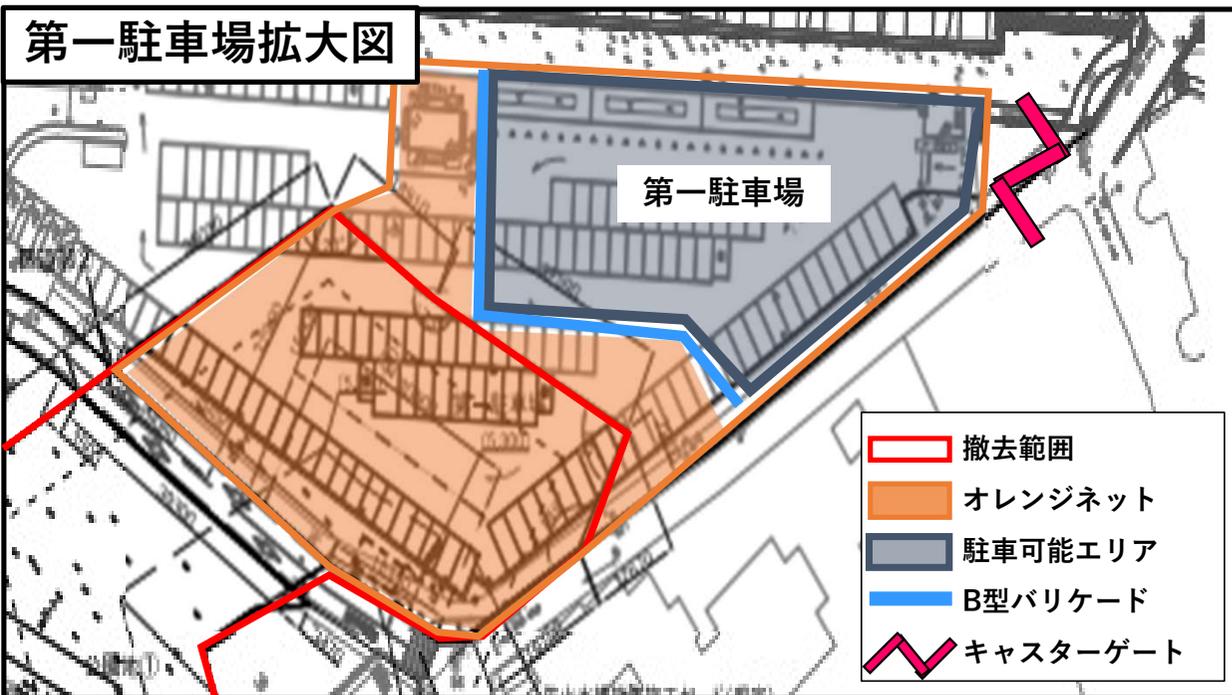

## ○駐車場の利用制限

\*B型バリケードとキャスターゲートを用いて作業エリアと駐車エリアを区画します。

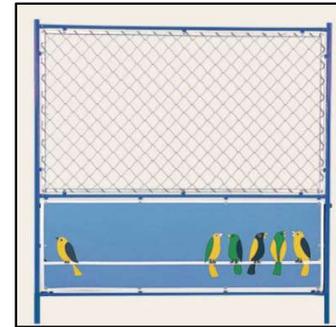



# 今後の予定

今後の詳細な予定は現在調整中です。  
また、**区画の範囲や作業工程などは進捗や施工条件を考慮し変更する可能性があります。**

その際は適切な形でお知らせいたしますので  
何卒ご了承ください。



# 問い合わせ先

受注者：アゴラ造園 株式会社

現場代理人：柚木 秀和（ゆのき ひでかず）

TEL 03-3997-2108

発注者：東部公園緑地事務所 事業推進課

上野再生整備担当 TEL 03-3821-7334

工事期間中は、何かとご迷惑をお掛け致しますが、  
ご理解・ご協力の程、何卒宜しくお願い致します。
