



I 道路の建設	(33)	II 道路の管理	(47)
第1 あらまし	(33)	第1 あらまし	(47)
第2 都市の骨格を形成する 幹線道路の整備	(38)	第2 路線の認定等	(47)
第3 橋梁の整備	(41)	第3 道路の適正管理	(49)
第4 地域幹線道路の整備	(41)	第4 道路・橋梁の維持補修	(56)
第5 山間・島しょ地域の振興を図る 道路の整備	(41)	第5 沿道環境の整備	(62)
第6 都市計画道路の整備	(42)	第6 交通安全施設の整備	(66)
第7 道路と鉄道の立体交差化	(42)	第7 集中的な渋滞対策	(69)
第8 公共交通の充実	(45)	第8 快適な道路空間の整備	(70)
第9 市町村支援事業	(46)	第9 都営駐車場の運営及び 路外駐車場届出受理事務	(73)

道 路

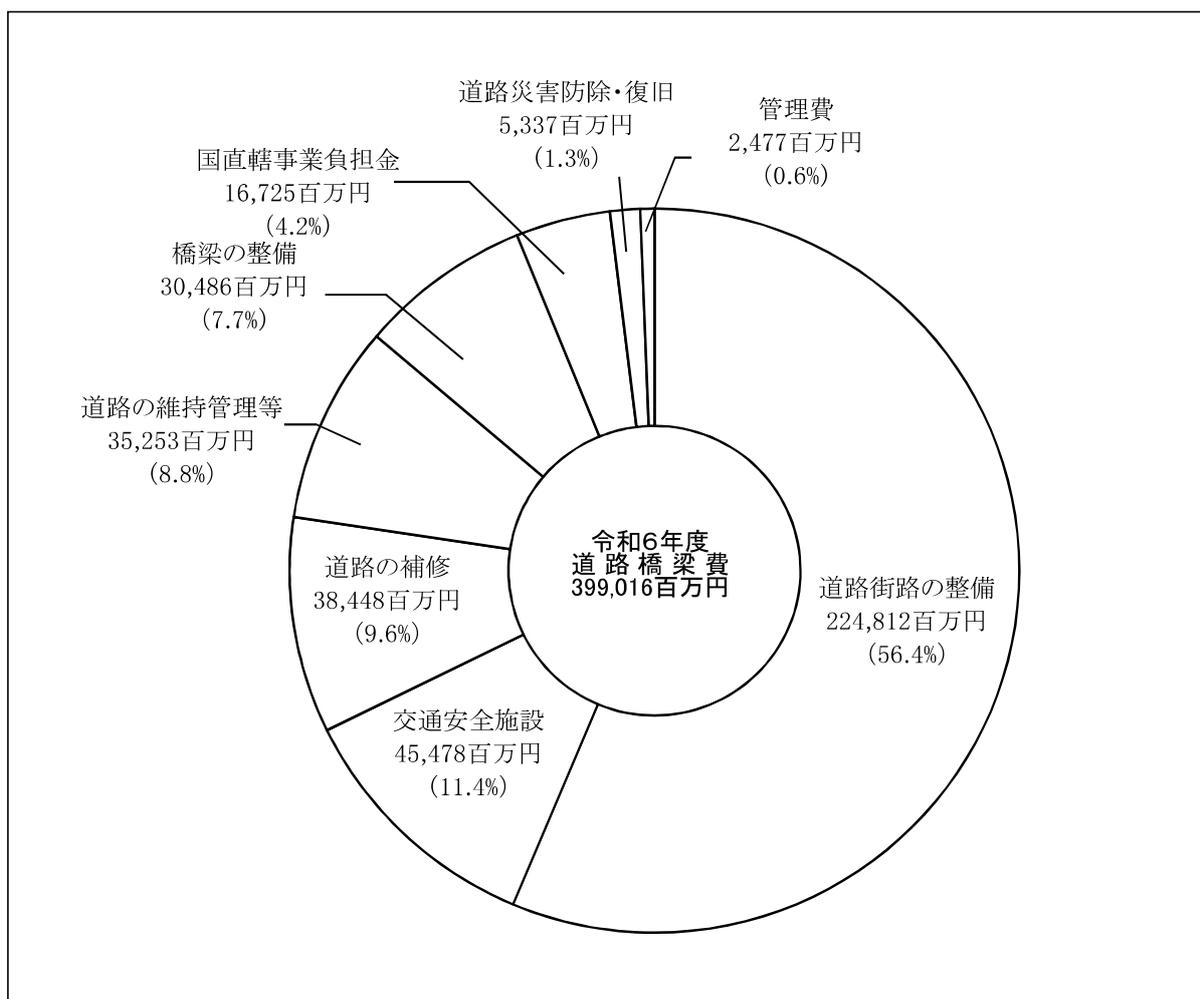

第2・1図 主な道路の現況図

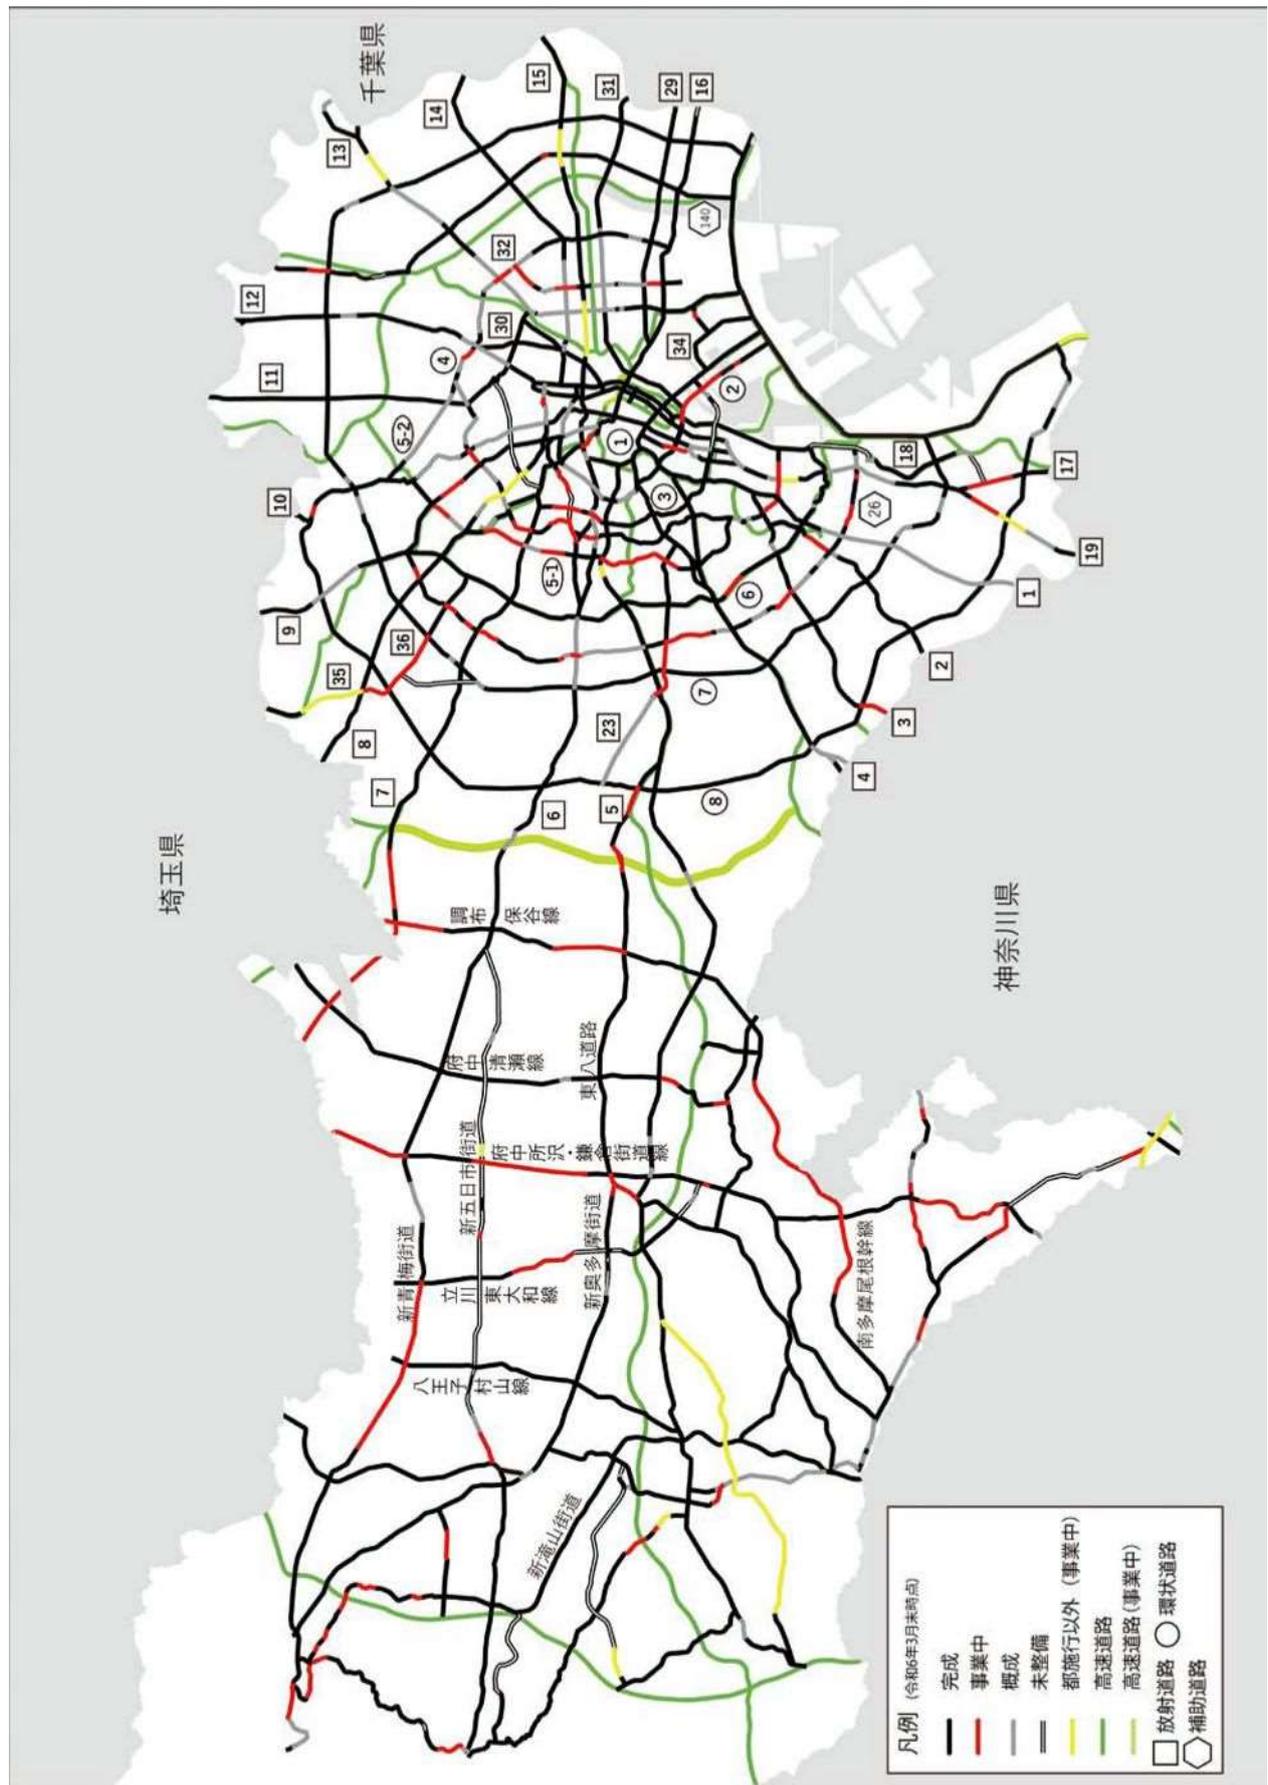

I 道路の建設

第1 あらまし

道路は、都民生活を支える最も基礎的な社会基盤として、重要な役割を担っている。この役割とは、膨大な交通需要に対応するとともに、災害時の避難・救援路として、また、電気・ガス・上下水道・電話などの施設を収容する空間としての機能である。

東京の道路整備は、交通渋滞の解消により国際競争力を高めるとともに、快適で利便性が高く、環境負荷の少ない都市を実現する上で重要である。また、震災時の救援物資輸送や迅速な復旧・復興活動を支え首都機能を守るとともに、延焼遮断帯を形成し、燃え広がらないまちを実現するなど、東京を高度な防災性を備えた都市へ進化させるためにも道路整備は不可欠である。

1 現状と課題

都内には、現在、延長3,207kmの都市計画道路が計画されているが、第2・1表に示すとおり、令和4年度末時点でその完成率は約65.1%と、いまだ道半ばで多くの未完成区間が存在している。なお、区部の完成率は約66.7%、多摩地域の完成率は約62.8%となっている。令和3年度全国道路・街路交通情勢調査の朝夕旅行速度（混雑時旅行速度）をみると、第2・2図に示すとおり、全国31.7km/hに対して、東京都全域16.1km/h、区部15.0km/h、市郡部（多摩及び島しょ）17.6km/h、と低い速度となっている。

(1) 道路交通の課題

東京の交通渋滞の解消に向け、首都圏三環状道路や都市計画道路の整備に取り組んでいるが、都市の中心部から1時間で移動できるエリアに着目すると、東京は欧米の主要都市の約半分にとどまっており、道路交通環境は大きく後れを取っている。こうした状況は、多大な時間的・経済的損失、産業の高コスト構造を招くとともに、バスなどの都民の重要な足である公共交通の運行のほか、二酸化炭素（CO₂）の排出量などに影響を与えている。

また、都内の交通事故（死傷事故）件数全体は近年減少傾向にあるが、交通渋滞を回避するため

の通過交通が生活道路に流入していることなどにより、狭い生活道路における事故件数全体に占める割合が増加している。このほかにも、概成の都市計画道路の中には、車道はあるものの、歩道が十分に整備されていない道路があり、安全に歩行しづらい場所も存在する。

(2) 防災都市の実現に向けた課題

災害時における緊急物資輸送や迅速な救援・救護活動などを支えるため、都内には緊急輸送道路が指定されているが、これらの道路の中には十分な幅員が確保されていない箇所があることに加え、延焼遮断帯や避難路に指定されているにもかかわらず、未着手となっている都市計画道路もある。大規模災害の際には、都県間を含め、発生する大量のごみやがれきの処理なども必要となる。

また、都内には土砂災害危険箇所に沿って道路が存在する場所などがあり、大規模土砂災害などの発生時には、道路の閉塞により孤立する集落の発生が懸念される。

(3) 質の高い生活の実現に向けた課題

成熟都市東京においては、生活の豊かさを実感でき、高齢者や子育て世代など誰もが活動しやすく、快適に暮らせる集約型の地域構造へと再編していくことが求められている。

近年、手軽な交通手段として自転車の利用が拡大し、自転車と歩行者が接触するなど、自転車が関係する交通事故が発生している。また、鉄道駅や公共施設周辺をはじめとした拠点における交通結節機能が十分でないことも課題の一つである。

商店街や観光地、住宅地など様々な地域において、地域の活性化や住みやすいまちを実現するため、地域の特性を生かしたまちづくりが進められている。これらのまちづくりに資する道路整備も期待されている。

第2・1表 都市計画道路の整備状況

(令和5年3月31日現在：出典 都市整備局)


都 道	市 路	計 画	全体計画		完成延長 (km)	事業中延長 (km)	未着手延長 (km)	完成率 (%)
			路線数	延長 (km)				
合 計			1,445	3,207	2,088	310	808	65.1
内 訳	区 部		778	1,770	1,181	165	423	66.7
	区部の内訳	放射線	36	366	273	28	65	74.4
		環状線	12	251	182	32	36	72.6
		補助線その他	730	1,151	724	105	321	62.9
	多 摩		662	1,426	896	144	384	62.8
島 しょ		5	10	10	0	0	100	

※ 各項目の合計は、小数点以下の端数処理により一致しない場合がある。

※ 路線数には、支線数は含まれていない。

※ 都市高速道路及び自動車専用道路は含まれていない。

第2・2図 朝夕旅行速度（混雑時旅行速度）

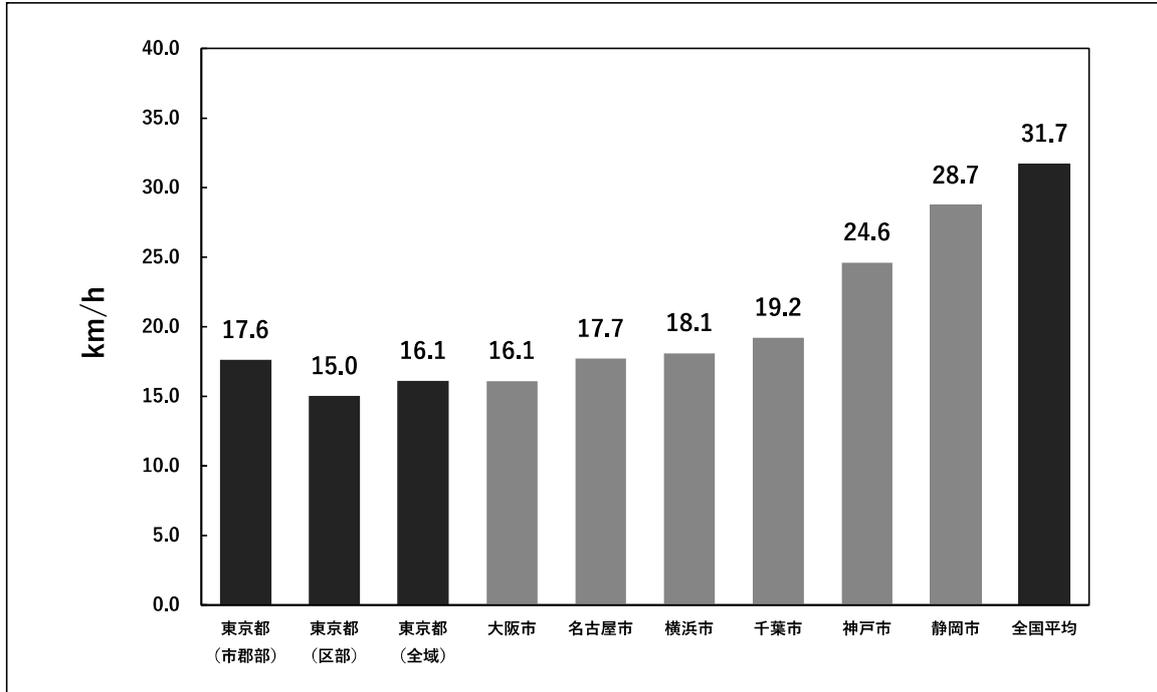

出典：令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査

第2・2表 年度別地域別投資額

(単位：百万円)

年度 地域	昭和62年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
区部	(73) 134,489 <100>	(68) 123,032 <91>	(71) 115,020 <86>	(71) 113,268 <84>	(81) 200,434 <149>	(77) 142,127 <106>	(76) 141,878 <105>	(74) 135,780 <101>	(75) 147,098 <109>	(71) 123,856 <92>	(72) 126,984 <94>	(69) 127,860 <95>	(70) 210,972 <157>
多摩	(23) 42,912 <100>	(31) 55,776 <130>	(28) 44,771 <104>	(28) 44,588 <104>	(18) 43,400 <101>	(22) 41,092 <96>	(23) 43,202 <101>	(25) 46,451 <108>	(24) 48,059 <112>	(28) 49,462 <115>	(26) 45,675 <106>	(29) 53,536 <125>	(27) 81,983 <191>
島しょ	(4) 6,528 <100>	(1) 2,155 <33>	(1) 2,515 <39>	(1) 2,302 <35>	(1) 2,005 <31>	(1) 2,469 <38>	(1) 1,795 <27>	(1) 2,766 <42>	(1) 2,484 <38>	(1) 2,540 <39>	(2) 2,978 <46>	(2) 3,845 <59>	(3) 9,052 <139>
合計	(100) 183,929 <100>	(100) 180,963 <98>	(100) 162,306 <88>	(100) 160,158 <87>	(100) 245,839 <134>	(100) 185,688 <101>	(100) 186,875 <102>	(100) 184,997 <101>	(100) 197,641 <107>	(100) 175,858 <96>	(100) 175,637 <95>	(100) 185,241 <101>	(100) 302,007 <164>

(注) 1. 上段()は各年度、区分構成比であり、下段< >は昭和62年度を100とした指数である。
 2. 道路投資額は、道路建設部所管事業から、直轄事業負担金を除き交通安全施設費、用地会計等を加えた額。
 3. 令和5年度までは決算額、令和6年度は当初予算額。
 4. 鉄道連続立体交差基金は除く。

第2・3表 道路事業当初予算額

(単位：百万円)

事業名	令和6年度		令和5年度		差引増△減		
	予算額	構成比	予算額	構成比			
都市骨格幹線道路の整備	81,267	(1,231)	26.9%	89,259	(2,648)	29.2%	△7,992
都市計画道路	80,883		26.8%	88,900		29.1%	△8,017
都市計画道路外	384		0.1%	359		0.1%	25
地域幹線道路の整備	72,859		24.1%	77,056		25.2%	△4,197
都市計画道路	71,745		23.7%	75,850		24.8%	△4,105
都市計画道路外	1,114		0.4%	1,206		0.4%	△92
地域振興道路の整備	3,489		1.2%	4,247		1.4%	△758
都市計画道路	0		0%	0		0.0%	0
都市計画道路外	3,489		1.2%	4,247		1.4%	△758
橋梁の整備	10,492		3.5%	10,214		3.3%	278
鉄道の連続立体交差化	54,490		18.0%	43,995		14.4%	10,495
無電柱化の推進	5,448		1.8%	5,658		1.9%	△210
流域貯留浸透事業	578		0.2%	256		0.1%	322
都市高速道路の整備	315		0.1%				315
その他	73,069		24.2%	74,713		24.5%	△1,644
計	302,007		100.0%	305,398		100.0%	

(注) ()は用地会計等で内書きである。

3 今後の対応方針

東京の道路整備は、交通渋滞を解消し、国際競争力を高めるとともに、快適で利便性の高い都市を実現する上で重要な役割を担っている。

一方、東日本大震災では、救援活動や救援物資輸送を支えるなど、改めて道路ネットワークの重要性が明らかになった。

また、首都直下地震の切迫性等を踏まえると、都民の生命と東京の都市機能を守るため、東京の弱点である木密地域の改善を一段と加速しなければならない。

今後とも、首都東京の渋滞解消・防災性の向上・環境改善を図るため、以下の方針に基づき、道路施策を実施していく。

- 首都圏の道路交通の円滑化を図り、日本全体の社会・経済活動を支える三環状道路を整備すると同時に、そのアクセス道路も重点的に整備する
- 都市の骨格となる道路ネットワークを形成するため、区部の放射・環状方向、多摩の南北方向や区部と多摩を東西方向に結ぶ骨格幹線道路について、つながっていない区間（ミッシングリンク）や橋梁等を重点的に整備する
- 市街地では、地域の防災性の向上や円滑な交通を確保するなど地域生活を支える基幹的な幹線道路を、山間・島しょでは、生活基盤を強化し産業の振興を図る道路を整備する
- 道路交通の円滑化と安全性の向上を図るため、交差点の整備・交通安全施設の整備、道路と鉄道の立体交差化などを進める
- 震災時の救援・支援活動や復興支援を支える交通・物流ネットワークの強化に資する道路整備を進めていく
- 震災時に特に甚大な被害が想定される木造住宅密集地域（整備地域）において、延焼を遮断し、避難路や緊急車両の通行路ともなる防災上効果の高い特定整備路線の整備を進めていく

第2 都市の骨格を形成する 幹線道路の整備

道路建設部計画課
三環状道路整備推進部
整備推進課

1 幹線道路網の整備

(1) 概要

東京の道路ネットワークは、区部においては放射・環状型、多摩地域においてはおおむね東西と南北の格子状に構成されている。

区部の放射線については、古来の諸街道に沿った国道が戦前から整備されており、戦後もこれらを中心として整備の拡充が図られている。また、環状線については、放射線に比べ整備が遅れているが、都心への通過交通の分散を図るため、現在、重点的に整備を進めている。

多摩地域については、東西方向の路線である甲州街道や、新青梅街道、五日市街道など、旧街道を中心に整備を進めてきたが、地域の均衡ある発展を目指し、現在、南北方向の路線や南多摩尾根幹線についても、積極的に整備を進めている。

令和6年度の骨格幹線道路の整備の総事業費は約813億円で、施工する箇所は、環状第4号線、国分寺3・2・8号線などである。

(2) 快適で環境にやさしいみちづくり

道路における環境配慮への社会的関心が高まる中、東京都では主要な幹線道路の整備にあたり、環境影響評価条例に基づき、通過交通による大気汚染や騒音・振動の軽減、安全で快適な歩行空間や緑豊かなおおいある都市空間の創出など、沿道環境に配慮した道路整備を進めている。これまで施行している主な箇所は、区部では、放射第5号線や、放射第35号線など、多摩地域では、調布保谷線や、府中所沢線などである。その中で、調布保谷線の環境施設帯については、住民参加型によるみちづくりに取り組み、緑道や、副道などの整備を行った。

2 三環状道路の整備

(1) 概要

首都圏三環状道路とは、首都圏中央連絡自動車道、東京外かく環状道路、首都高速中央環状線の総称である。首都圏三環状道路は、交通渋滞の解消のみならず、都市機能の向上や都市環境の改善を図るため、早期整備が不可欠である。令和6年8月現在の整備率は、約82%である。

(2) 首都圏中央連絡自動車道

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、都心から40～60km圏を環状に連絡する延長約300kmの道路である。本道路は、横浜、厚木、八王子、川越、つくば、成田、木更津などの中核都市を連絡することにより、都心に集中する業務機能を適切に分散させ、地域開発を促進するなど、首都圏のさらなる発展に対して重要な役割を担う道路である。

平成26年6月に高尾山IC～神奈川県境までの約2.3kmが開通し、東京都区間約24.6kmが全線開通した。平成29年2月には茨城県区間が全線開通し、東名高速から東関東道までの6つの高速道路が圏央道で結ばれた。圏央道全体の整備率は、令和6年8月現在で約90%となっており、早期全線開通に向けて、引き続き、国・関係県市と協力していく。

(3) 東京外かく環状道路（関越道～東名高速間）

東京外かく環状道路（外環道）は、都心から約15kmの圏域を環状に連絡する延長約85kmの道路である。首都圏の交通・物流の根幹を成し、防災力向上にも資する極めて重要な道路である。平成30年6月に千葉区間が開通し、東関東道から関越道までの4つの高速道路が外環道で結ばれた。外環道の整備率は、令和6年8月現在で約58%となっている。

関越道～東名高速間（延長：16.2km）については、平成19年4月に高架構造から大深度地下構造への都市計画変更が行われ、平成21年5月に整備計画決定、事業化された。平成24年4月には関越道～中央道間はNEXCO東日本が、中央道～東名高速間はNEXCO中日本が事業許可を受け、国とともに事業主体として決定し、同年9月に着工した。

現在、本線シールドトンネル及びJCT・ICからのランプ（連絡路）のシールドトンネルなどの整備が進められている。また、大深度地下において、本線シールドトンネルとランプシールドトンネルをつなぐ地中拡幅部について調査・検討が進められてきている。

都は、国など事業者に対し、事業の実施に当たっては、安全を最優先に工事を進め、コスト削減を図

りながら、早期に開通することを求めている。引き続き、国から受託した大泉 JCT 及び青梅街道 IC の用地取得において、測量や用地折衝を進めるなど、積極的に支援していく。

なお、令和 2 年 10 月に調布市で陥没・空洞事故が発生し、外環のシールドトンネルの施工が原因とされ、事業者は地元で丁寧な説明を行った上で、家屋補償や、緩んだ地盤を元に戻す地盤補修工事等を進めている。

また、大泉側本線及び東名・中央 JCT ランプのシールドトンネル工事について、地元で説明の上、取りまとめた再発防止対策等を確認しながら、慎重に掘進作業を行っている。都は事業者に対して、引き続き、再発防止対策等の確実な実施、住民の不安払拭に向けた丁寧な説明やきめ細やかな対応を求めている。

第 2・5 図 三環状道路ネットワーク図



第 2・6 図 外環（関越道～東名高速間）平面図



(2) 日本橋区間の地下化

首都高日本橋区間は、首都高速都心環状線の神田橋 JCT から江戸橋 JCT に至る 1.8km の区間である。

この区間は、1日あたり約 10万台の自動車が走行する過酷な使用状況にあり、構造物の損傷が激しく、長期的な安全性を確保するため、構造物の更新が必要となっている。

日本橋川周辺では、多くの再開発計画が立ち上がり、国家戦略特区の都市再生プロジェクトに位置付けられている。

首都高速道路株式会社では、都心環状線の交通機能を確保しつつ、まちづくりと連携しながら、日本橋区間の令和 17 年度の地下ルート開通、令和 22 年度の高架橋撤去に向けて、令和 2 年度より整備を進めている。

(3) 高速第 1 号線（新京橋連結路）

新京橋連結路は、高速都心環状線築地川区間と高速八重洲線を結ぶ約 1.1km の路線である。日本橋区間地下化により、現在の大型車通行ルートである江戸橋 JCT の都心環状線連結路が廃止となることから、代替機能を確保するための新たな都心環状ルートとして整備する。

令和 6 年度より首都高速道路株式会社と東京都とが共同で事業を進めており、日本橋区間の地下ルート開通に合わせた令和 17 年度の完成を目指している。

第 3 橋 梁 の 整 備

道路建設部道路橋梁課

1 概 要

橋梁の整備事業は、老朽化による架け替えや、災害発生時における避難・輸送ルートの確保、都県境の道路ネットワークの強化を図る上で重要な事業である。

令和 6 年度の橋梁整備の総事業費は約 105 億円で区部・多摩の 15 箇所の橋梁について新設・架け替え事業を実施している。事業中の主な橋梁は、等々力大橋（仮称）、関戸橋、日野橋などである。

2 多摩川に架かる橋梁の整備

多摩川を横断する道路では、多摩地区の市街化進展や生活圏の拡大に伴い、橋梁周辺での慢性的な渋滞が発生していたため、多摩川の橋梁整備を

重点的に取り組んできた。

特に、多摩川中流部では、昭和 55 年当時、一般道路橋が 5 橋（12 車線）しかなく、ボトルネックによる渋滞が慢性化していた。現在までに着実に整備を進めた結果、令和 5 年度末の多摩川中流部の橋梁整備状況は、直轄国道を含め 9 橋（34 車線）、平均橋梁間隔は約 2.2km、交通容量は約 3 倍となった。このように、整備前と比べ大幅な交通渋滞の解消が図られたところである。

また、多摩川下流部では、東京と神奈川の都県境を新たに結ぶ等々力大橋（仮称）で事業を行っている。

第 4 地 域 幹 線 道 路 の 整 備

道路建設部計画課

地域幹線道路は、市街地において骨格幹線道路と一体となって東京の道路網を形成し、地域の防災性や円滑な交通を確保するなど、地域生活を支える基幹的な道路として整備するものである。

令和 6 年度の地域幹線道路の整備の総事業費は約 729 億円で、施工する箇所は、補助第 96 号線、調布 3・4・2 号線などである。

第 5 山 間 ・ 島 しょ 地 域 の 振 興 を 図 る 道 路 の 整 備

道路建設部道路橋梁課

山間・島しょ地域では、人の移動や物資の輸送の多くを道路が担っており、生活及び産業・経済・文化などの活動・振興に重要な基盤施設となっている。

とりわけ、地域住民の日常生活を支え、自然災害等緊急時に対応できる安全な道路として、主要道路である都道を整備する必要がある。

そのため、大型車のすれ違いが困難な道路の拡幅整備、バイパス道路整備、歩道整備、線形改良、法面防護などの整備により安全で円滑な交通を確保する。

令和 6 年度の山間・島しょ地域の道路整備の総事業費は約 35 億円で、主な箇所は、多摩川南岸道路（奥多摩町）、秋川南岸道路（檜原村、あきる野市）、大島循環線（大島町）、三宅循環線（三

宅村)、八丈循環線(八丈町)、父島循環線(小笠原村)などである。

第6 都市計画道路の整備

道路建設部街路課・道路橋梁課・計画課

1 概要

都市計画道路は、「『未来の東京』戦略」の実現を目指し、第2・1表(P.34)に示すように全体で310kmで事業中である。

令和6年度は総額約1,526億円で、前年度事業費と比べ、約122億円減になっている。

令和5年度は放射第35号線等の5路線約2.7kmを交通開放した。令和6年度は放射第10号線等の5路線約3.3kmで交通開放を予定している。

区部においては、都心に流入する交通を分散し渋滞解消を図るため、放射第25号線や環状第4号線など放射・環状道路の整備を重点的に進めている。

多摩地域においては、府中所沢線など多摩南北主要5路線や新青梅街道線など多摩東西主要4路線をはじめとする骨格幹線道路の整備を重点的に推進している。令和6年3月末において、多摩南北主要5路線は、計画延長79.8kmに対し整備済延長65.5km、整備率82%、多摩東西主要4路線は、計画延長96.8kmに対し整備済延長67.3km、整備率70%となっている。引き続き、早期完成を目指し整備を推進していく。

2 木密地域・特定整備路線の整備

木造住宅密集地域(木密地域)は、老朽化した木造住宅や狭い道路が多いことなどから、防災上の課題を抱えており、「首都直下地震等による東京の被害想定」(令和4年度東京都防災会議)においても、地震火災など大きな被害が想定されている。

東京都では、震災時に特に甚大な被害が想定される木密地域(整備地域)約6,500haを、燃え広がらない・燃えないまちにすることを目指し、市街地の不燃化を促進するとともに、延焼遮断や避難、救援など防災性の向上に資する都施行の都市計画道路(特定整備路線)28区間、約25kmの整備を推進している。

特定整備路線は、平成23年3月の東日本大震災を踏まえ、平成24年1月に立ち上げた「木密地域不燃化10年プロジェクト」において、路線選定を行い、平成26年度末までに全区間で事業に着手した。

これまでに6割を超える用地を取得するとともに、補助第136号線の関原・梅田地区及び補助第26号線の三宿地区の2区間、延長約1.5kmを交通開放した。

引き続き、関係権利者の生活再建に十分配慮し、理解と協力を得ながら用地を取得していくとともに、用地が確保できた箇所から順次、工事を実施するなど、地域の防災性を向上させる特定整備路線の整備を着実に推進していく。

第7 道路と鉄道の立体交差化


道路建設部鉄道関連事業課・計画課

1 概要

都民生活を支える快適な交通体系を確立するためには道路ネットワークの形成が不可欠であるが、現状は不十分であり、既成市街地内では、依然として慢性的な交通渋滞などが生じている。特に、都内に残る約1,040箇所の踏切は、円滑な道路交通を著しく阻害しており、安全で効率的な都市活動の妨げとなっている。

この問題を解決するため、東京都では、重点的に対策を実施すべき箇所を抽出し、道路と鉄道との立体交差化を推進している。

道路と鉄道との平面交差を立体化する方法には、道路をオーバー又はアンダーにする道路立体と鉄道を高架化又は地下化する鉄道立体がある。

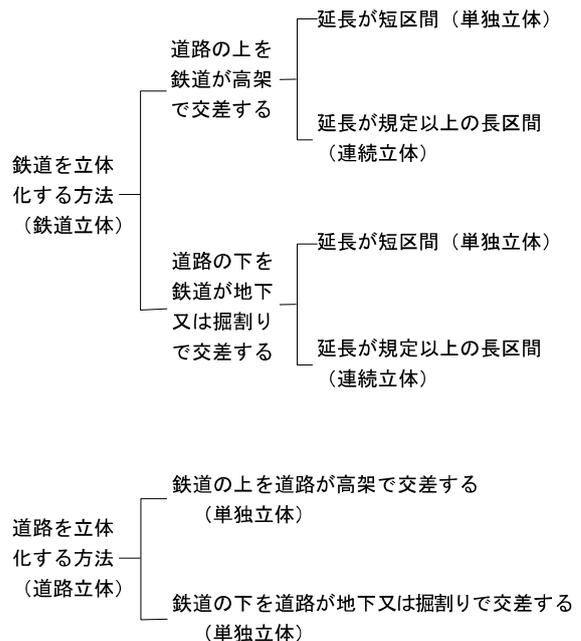

2 連続立体交差事業

道路と交差している鉄道を一定区間連続して高架化又は地下化することで多くの踏切を除却し、既設及び新設交差道路との立体交差を一挙に実現する事業であり、東京都が事業主体となり、地元区市及び鉄道事業者と相互に連携して進めている。施行方法、費用負担等は「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する要綱（平成19年8月）」により定められている。

この事業の意義は次のとおりである。

- (1) 数多くの踏切を同時に除却することで、踏切遮断による交通渋滞及び踏切事故を解消することができる。また、道路ネットワークの形成が促進される。
- (2) 鉄道により分断されていた沿線市街地の一体化を図ることができ、併せて市街地再開発事業や土地区画整理事業等を行うことにより、都市の再生、活性化に強いインパクトを与える。
- (3) 新たに生み出される高架下等の空間を周辺の土地利用計画に合わせて、自転車駐輪場や公園等の多目的な形で利用できる。
- (4) 鉄道事業者にとっても、鉄道輸送の安全性の向上、踏切経費の節減、輸送力の増強等に寄与する。

なお、この事業は市街地の中で施行する大規模事業であるため、実施に当たっては、地域住民との合意形成を図るとともに、環境対策などを行うことで理解と協力を得ながら進めていく必要がある。

これまで、平成31年3月に事業を完了した小田急小田原線（代々木上原駅～梅ヶ丘駅間）など東京都が施行した39事業で395箇所の踏切を除却している（第2・8図、P.44）。今後は、令和19年度までに累計479箇所の踏切を除却することを目標としている。

令和6年度の事業費は約545億円で、京王京王線、西武新宿線、京成押上線、JR埼京線、京浜急行本線、東武東上本線の6路線8箇所で行われている。


また、新規事業として、西武新宿線、JR南武線、東急大井町線、京成本線の4路線4箇所について、事業化に向けた検討を進めているところである。（第2・4表、P.44）

3 単独立体交差事業

道路建設部街路課・道路橋梁課・計画課
道路を単独で立体化、あるいは鉄道を比較的短い

区間で立体化する事業である。令和6年度の事業費は約83億円で、現在、環状第4号線（港南・高輪）、補助第26号線（豊町）、補助第92号線（中里）など10箇所で行われている。（第2・8図、P.44）

第2・8図 道路と鉄道の立体交差事業

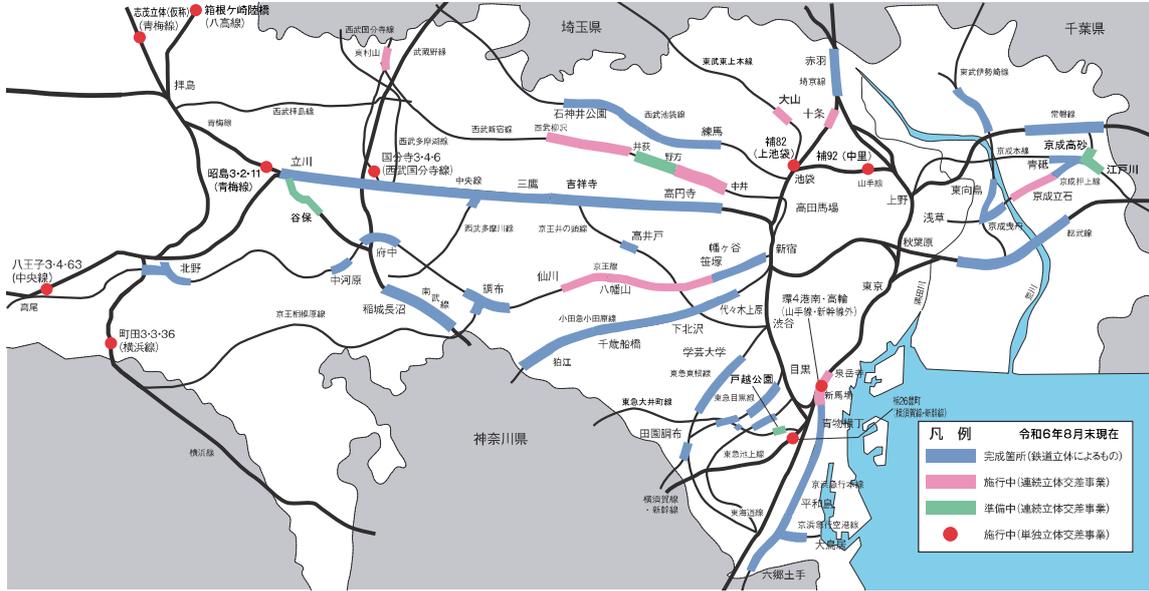

第2・4表 連続立体交差事業 事業箇所

施行中箇所

(令和6年8月末現在)

路線名	区間	延長 km	交 方	差 式	交差する主な 都市計画道路	踏 切 除 却 数	施行年度
京成押上線	四ツ木駅～青砥駅間	2.2	高	架	補140、補274	11	H14～R12
西武新宿線	中井駅～野方駅間	2.4	地	下	補220、補26	7	H25～R8
西武新宿線・国分寺線 ・西武園線	東村山駅付近	4.5	高	架	東村山3・3・8、 東村山3・4・10	5	H25～R12
京王京王線	笹塚駅～仙川駅間	7.2	高	架	放23、補154、補128、 補133、補215 補216、補217	25	H25～R12
J R 埼京線	十条駅付近	1.5	高	架	補85	6	R元～R12
京浜急行本線	泉岳寺駅～新馬場駅間	1.7	高	架	補149	3	R2～R11
東武東上本線	大山駅付近	1.6	高	架	補26	8	R3～R12
西武新宿線	井荻駅～西武柳沢駅間	5.1	高	架	補229、補132、外環 の2、補135、補230	19	R5～R21

準備中箇所

路線名	区間	予定延長 km	交差する主な 都市計画道路	予定踏 切 除 却 数	備考
西武新宿線	野方駅～井荻駅付近	3.1	補227、補133、補215	13	—
J R 南武線	谷保駅～立川駅間	3.7	国立3・3・15、 国立3・4・5ほか	17	—
東急大井町線	戸越公園駅付近	0.9	補29	6	R5. 10. 10都市計画決定
京成本線等	京成高砂駅～江戸川駅付近	5.3	補282、補143、補264	13	—

第8 公共交通の充実

道路建設部鉄道関連事業課・計画課

1 概要

新交通システム及び都市モノレールは道路を立体的に利用した専用軌道上を走行する、バスと鉄道の間程度の輸送力を持つ新しいタイプの交通機関である。インフラ部（支柱、桁、駅舎等の主要構造物）は道路の一部として建設局が整備し、インフラ外部（車両、電気設備等）は運営主体の第三セクターが整備した。

また、副都心線（地下鉄13号線）は、道路特定財源の使途拡大のため、道路交通の円滑化に資する地下鉄整備に道路特定財源を導入することになったため、都道である環状第5の1号線（明治通り）の直下に建設するインフラ部（駅部の壁、床、柱、階段等構造物、一般部のトンネル躯体）を街路事業として整備した路線である。

2 日暮里・舎人ライナーの整備

日暮里・舎人ライナーは、区部北東部の交通利便性の向上、道路混雑の緩和や沿線の地域開発の促進などを目的に、荒川区日暮里駅から足立区舎人地区まで約10kmの区間に導入した新交通システムである。

本路線は、昭和60年の運輸政策審議会答申を受け、平成8年8月都市計画決定、平成9年10月工事施行認可、同年11月都市計画事業認可を取得、同年12月インフラ部の工事に着手して、平成20年3月開業した。

3 ゆりかもめの整備

ゆりかもめ（東京臨海新交通臨海線）は、臨海部の開発及び発展に寄与する交通基盤を強化するため、新橋～豊洲間の約15km（うち建設局施工約8km）に導入した新交通システムである。

竹芝～有明間は、平成元年3月都市計画決定、平成2年4月工事施行認可、事業認可を取得、同年6月工事に着手した。また、新橋～竹芝間は、平成2年7月都市計画決定、平成3年6月工事施行認可、事業認可を取得、平成4年8月工事に着手した。平成7年11月新橋～有明間が開業し、平成13年3月新橋本駅、さらに平成14年11月汐留駅が開業した。

また、有明～豊洲間は、平成11年3月都市計画

決定、同年11月事業認可、同年12月施行認可を取得、工事に着手して、平成18年3月開業した。

4 多摩都市モノレールの整備

多摩都市モノレールは、多摩における南北方向の公共交通を充実させ、併せて多摩の自立性を高めるために、多摩センター～上北台間の約16kmに導入した跨座式の都市モノレールである。

平成元年9月多摩センター～上北台間で都市計画決定をし、I期区間（立川北～上北台間）は、平成2年6月工事施行認可、同年7月事業認可（立川～桜街道間）を取得、同年11月工事に着手して、平成10年11月開業した。

また、II期区間（多摩センター～立川北間）は、平成3年9月工事施行認可及び事業認可を取得、同年11月工事に着手して、平成12年1月全線開業した。

令和2年度より、上北台から箱根ヶ崎間の延伸の事業化に向けて、インフラ部の整備にかかる調査及び設計等を進めている。

5 副都心線（地下鉄13号線）の整備

副都心線（地下鉄13号線）は、明治通りなどの交通渋滞の緩和及び池袋、新宿、渋谷の3副都心の連携強化を図るために整備された、池袋と渋谷を結ぶ延長8.9kmの地下鉄である。

昭和60年及び平成12年の運輸政策審議会答申を受け、池袋以西で、東武東上線及び西武池袋線と相互乗り入れを行い、渋谷では東急東横線と相互乗り入れを行う路線として計画された。

平成13年5月都市計画決定、同年6月鉄道事業として工事に着手した。また、平成15年度からは、道路特定財源を導入し、都道直下部の延長7.9kmを街路事業として整備することになり、平成15年10月事業認可を取得し、引き続き工事を行い、平成20年6月開業した。

第9 市町村支援事業

道路建設部管理課・道路橋梁課

1 みちづくり・まちづくりパートナー事業

多摩地域の都市計画道路については「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）平成28年3月」に基づき整備を進めているが、本事業は、地域にとって重要な役割を果たす都道のうち、都市計画道路の事業化計画における優先整備路線以外で、地元市町村から要望が強い路線を都と市町村が連携協力して整備を行い、交通の円滑化・歩行者の安全性・利便性の向上など、地域のまちづくりに寄与することを目的としている。

平成11年度からの「みちづくり・まちづくりパートナー事業」に続き、平成21年度から平成28年度まで実施してきた「新みちづくり・まちづくりパートナー事業」により、これまでに、17路線、約5.4kmが完成している。本事業は地域にとって効果が大いことから、地元市の要望も踏まえ、「第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業」を平成29年度から10か年で11市18路線（新規10路線、継続8路線）整備することとし、令和5年度までに3路線、約1.0kmが完成している。

令和6年度は、予算約56億円を確保している。

2 市町村土木補助事業

市町村道は、国道や都道と一体となって道路網を形成し、地域交通を支えるとともに、日常における地域交通や電気・上下水道などのライフラインの収容スペースとして、また、安全で良好な生活環境の形成に不可欠な基盤施設であるが、国道、都道に比べ整備は遅れている。

都は、市町村に対する補助事業を通じて、市町村への財政的、技術的支援を行いながら、市町村道整備とまちづくりの促進を図っている。また、令和6年度より舗装の補修等に要する経費に対する補助率を引き上げ、市町村道事業の維持補修の財政支援強化に取り組んでいる。

令和6年度は、予算約50億円（道路事業関係）を確保している。
