



羽村大橋補修工事に関する説明会

令和7年6月

東京都 西多摩建設事務所

次第

1. 羽村大橋整備事業について
2. 令和7年度実施工事について
3. 質疑応答

1. 羽村大橋整備事業について

羽村大橋の経緯

昭和45年（1970年） 工事着手

昭和49年（1974年） 現在の橋が完成
（多摩川の下流側半分）

平成11～13年（1999年～2001年） 耐震補強

現在の羽村大橋は計画されている断面の
半分ほどしか整備されていません。

課題① 車道や歩道が狭い状況となっています。

＜車道の状況＞



＜歩道の状況＞




課題② 羽村大橋東詰交差点を中心に朝夕は混雑が生じています。





羽村大橋の東詰交差点部に右左折レーンが無いことによる渋滞の発生

未整備の上流側半分を整備し、
現在の橋と併せ「羽村大橋」として完成させます。

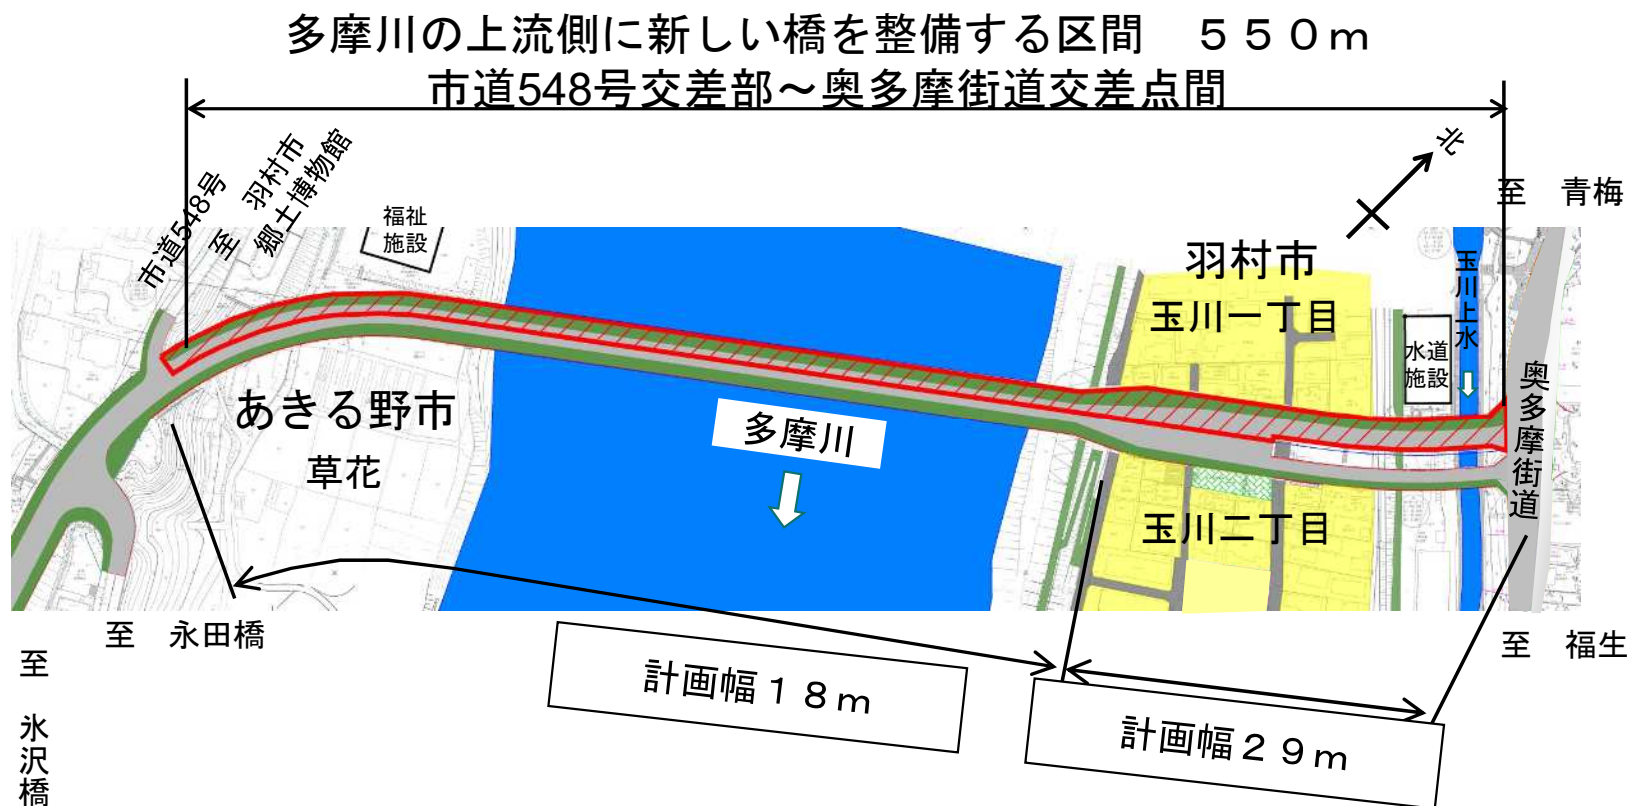

計画幅 18m（あきる野側～多摩川を渡る部分）

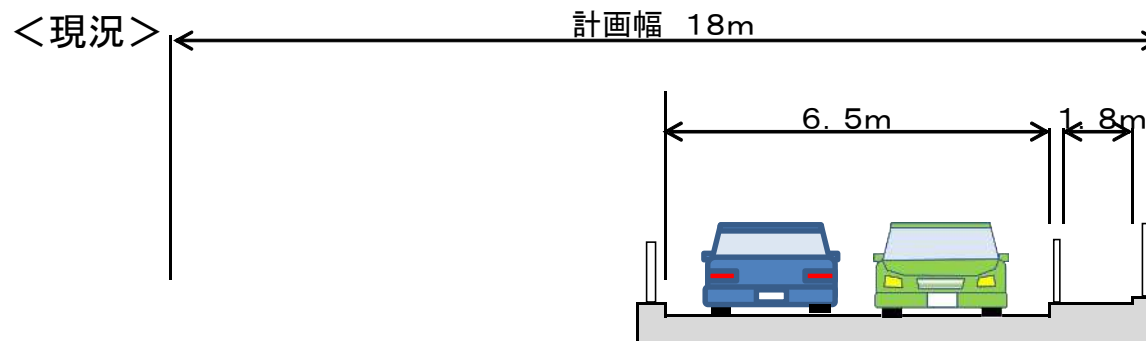


＜整備後＞

- ・ 上流側にも歩道を設けます。
- ・ 自転車は路肩を走行することを想定しています。

上流側

下流側

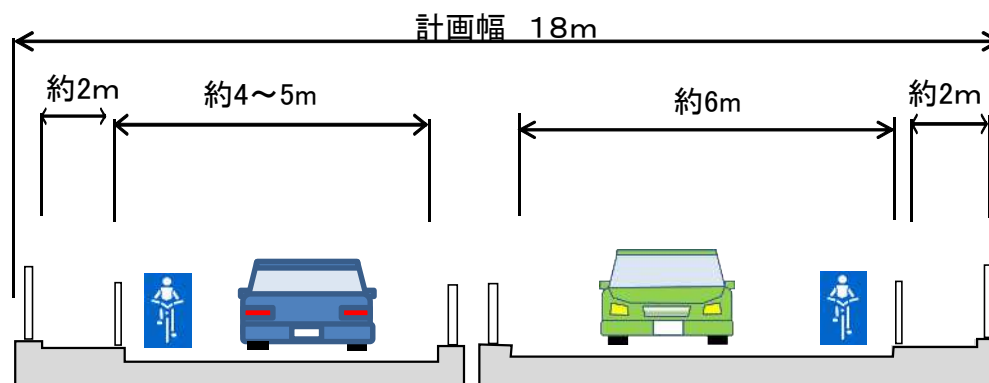

計画の断面（歩道幅、車道幅）は検討中で、確定したものではありません。

計画幅 29m（奥多摩街道交差点手前部分）




上
流
側

＜整備後＞

- ・上流側にも歩道を設けます。
- ・右左折車線を設ける予定です。

下
流
側

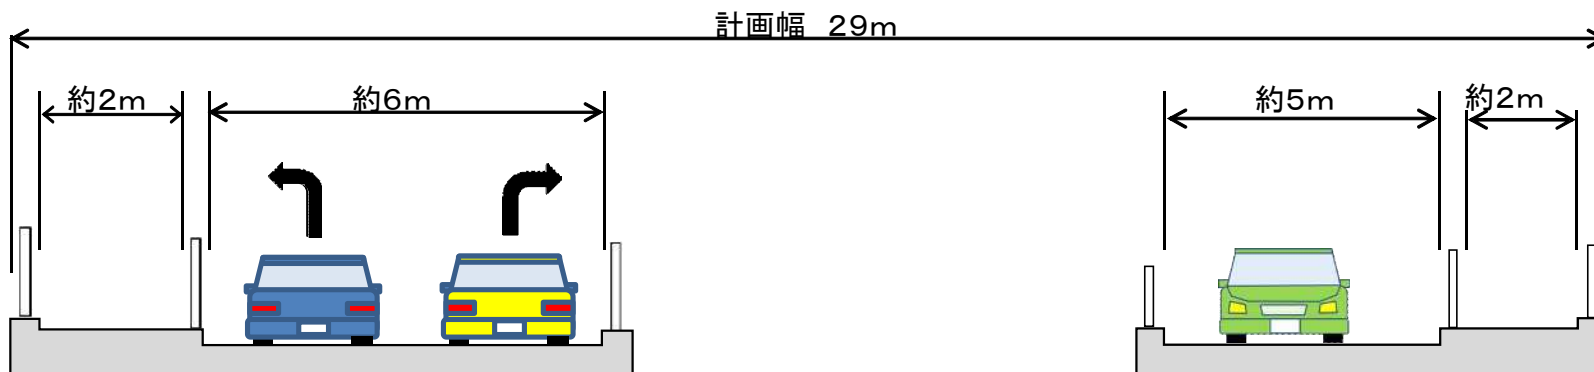

計画の断面（右折車線、車道幅、歩道幅）は検討中で、確定したものではありません。

今後の整備スケジュール

桁下の市道移設工事（羽村市側） 【昨年度実施済み】



補修工事

（羽村市側、あきる野市側、渡河部の3つの区間に分割し施工）



搬入路整備工事



上流橋の整備工事

2、令和7年度実施工事について

工事概要

工事件名 羽村大橋補修工事

施工会社 双栄基礎工業株式会社

工事期間 令和7年7月上旬～令和8年2月下旬（予定）

作業時間 昼間 8：00～18：00

※1 土・日・祝日は原則として作業しません。

※2 緊急時または作業上の都合により、上記以外の日時も作業を行うことがあります。

工事概要 施工延長 約144m

足場、コンクリート断面修復、ひび割れ注入、階段補修、支承防錆

2、令和7年度実施工事について


【位置図】



羽村大橋工事箇所図 (側面図)

あきる野市側

羽村市側

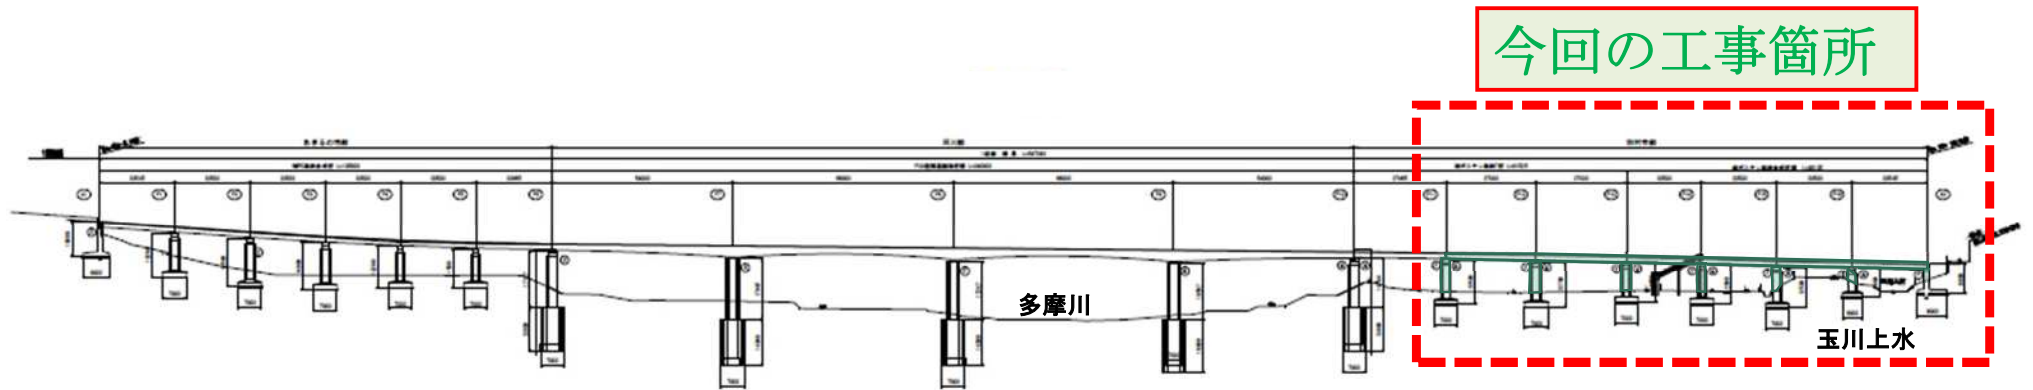


【工事箇所図】

足場

測面図

足場設置区間：手摺先行型枠組足場 A=1272掛m2、単管足場 A=306掛m2、吊り足場 A=1543m2
プラスト養生シート張防護工 A=1543m2、環境対策資機材 一式

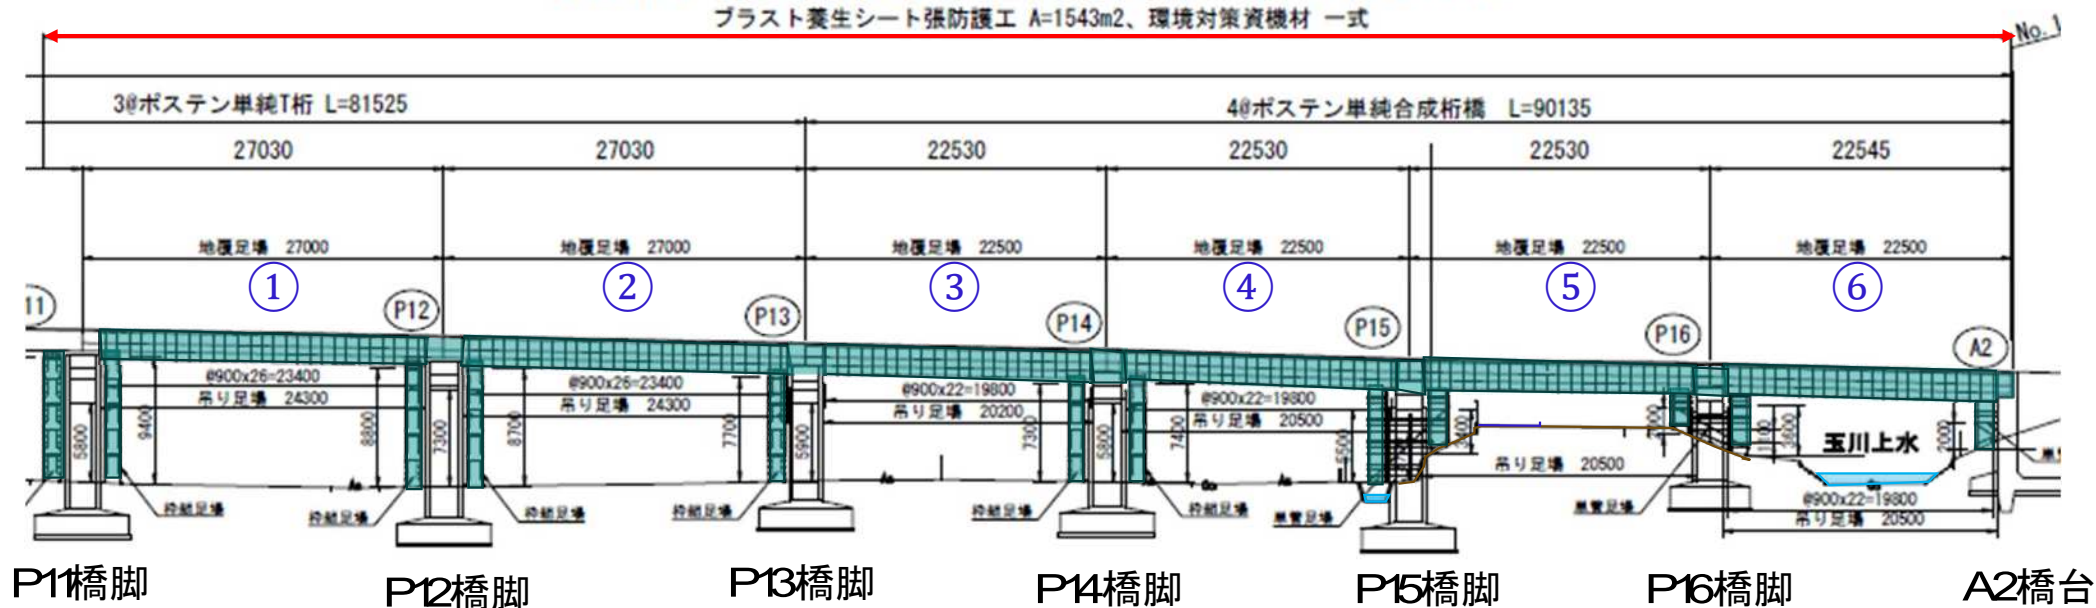


P13

【工事箇所図】（橋下からの作業）

測面図

足場設置区間：手摺先行型枠組足場 A=1272掛m2、単管足場 A=306掛m2、吊り足場 A=1543m2
 プラスト養生シート張防護工 A=1543m2、環境対策資機材 一式

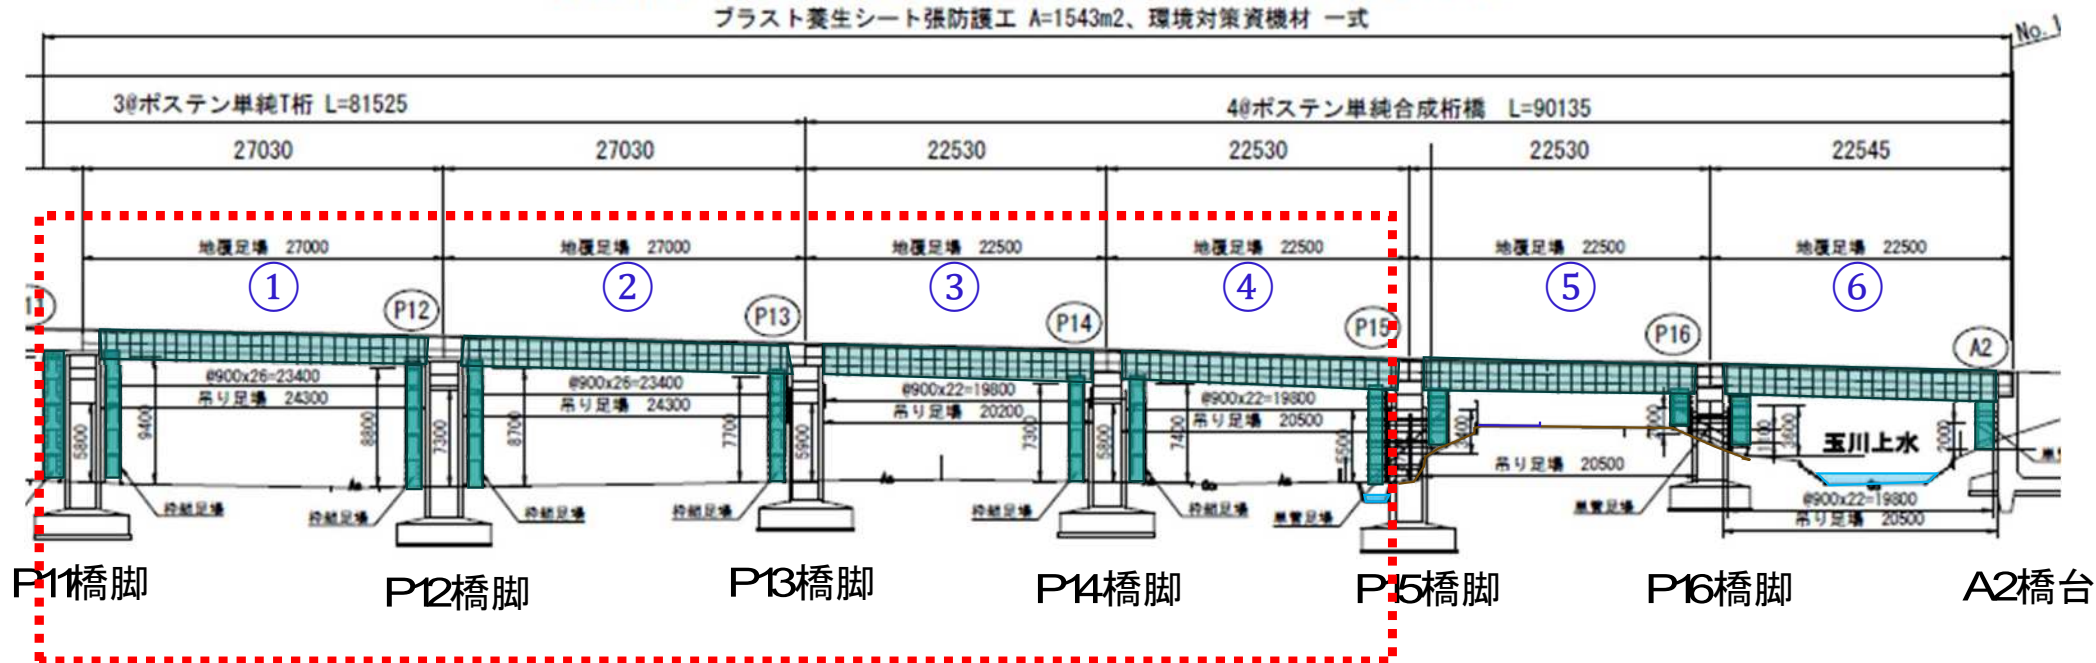

橋下からの作業

P14

搬入路について（橋下からの作業時）



工事用車両は、
高所作業車 1 台/日
資材搬入用トラック (4~7t) 4 台/日
を予定しています。

工事車両の通行は、9 : 00 以降とします。

工事関係職員や作業員等の車両は、9 : 00 前にも通行させていただきますが、速度を落とし安全に配慮いたします。

高所作業車イメージ写真


高所作業車



高所作業車・足場設置例



足場設置例（吊り足場）

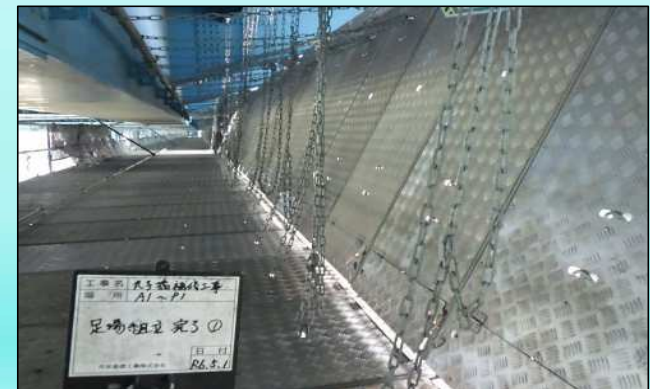

高所作業車による足場設置時の作業場所 (橋下・市駐車場)



※足場設置及び撤去期間は、駐車場のご利用できませんが、それ以外は、ご利用可能です。

高所作業車による足場設置時の交通規制①

交通規制①



①交通規制期間〈足場設置期間〉
2025.7月上旬～2025.8月上旬（土日除く）

※①と②の規制は同時に行いません。

①交通規制期間〈足場撤去期間〉
2025.12月中旬～2026.1月下旬（予定）

規制時間は、9：00～17：00を予定しています。

高所作業車による足場設置時の交通規制②

交通規制②



②交通規制期間〈足場設置期間〉

2025.7月上旬～2025.8月下旬（土日除く）

※①と②の規制は同時に行いません。

②交通規制期間〈足場撤去期間〉

2025.12月中旬～2026.1月下旬（予定）

規制時間は、9:00～17:00を予定しています。

高所作業車による足場設置時の交通規制③



交通規制③

多摩川

③交通規制期間〈足場設置期間〉
2025.7月上旬～2025.8月上旬（土日除く）

※③と④の規制は同時に行いません。

③交通規制期間〈足場撤去期間〉
2025.12月中旬～2026.1月中旬（予定）



羽村大橋

玉川上水

規制時間は、9：00～17：00を予定しています。

高所作業車による足場設置時の交通規制④



規制時間は、9：00～17：00を予定しています。

交通規制④

多摩川


④交通規制期間〈足場設置期間〉
2025.7月中旬～2025.8月下旬（土日除く）

※③と④の規制は同時に行いません。

④交通規制期間〈足場撤去期間〉
2025.12月中旬～2026.1月中旬（予定）




玉川上水




【工事箇所図】（玉川上水敷地内での作業）

測面図

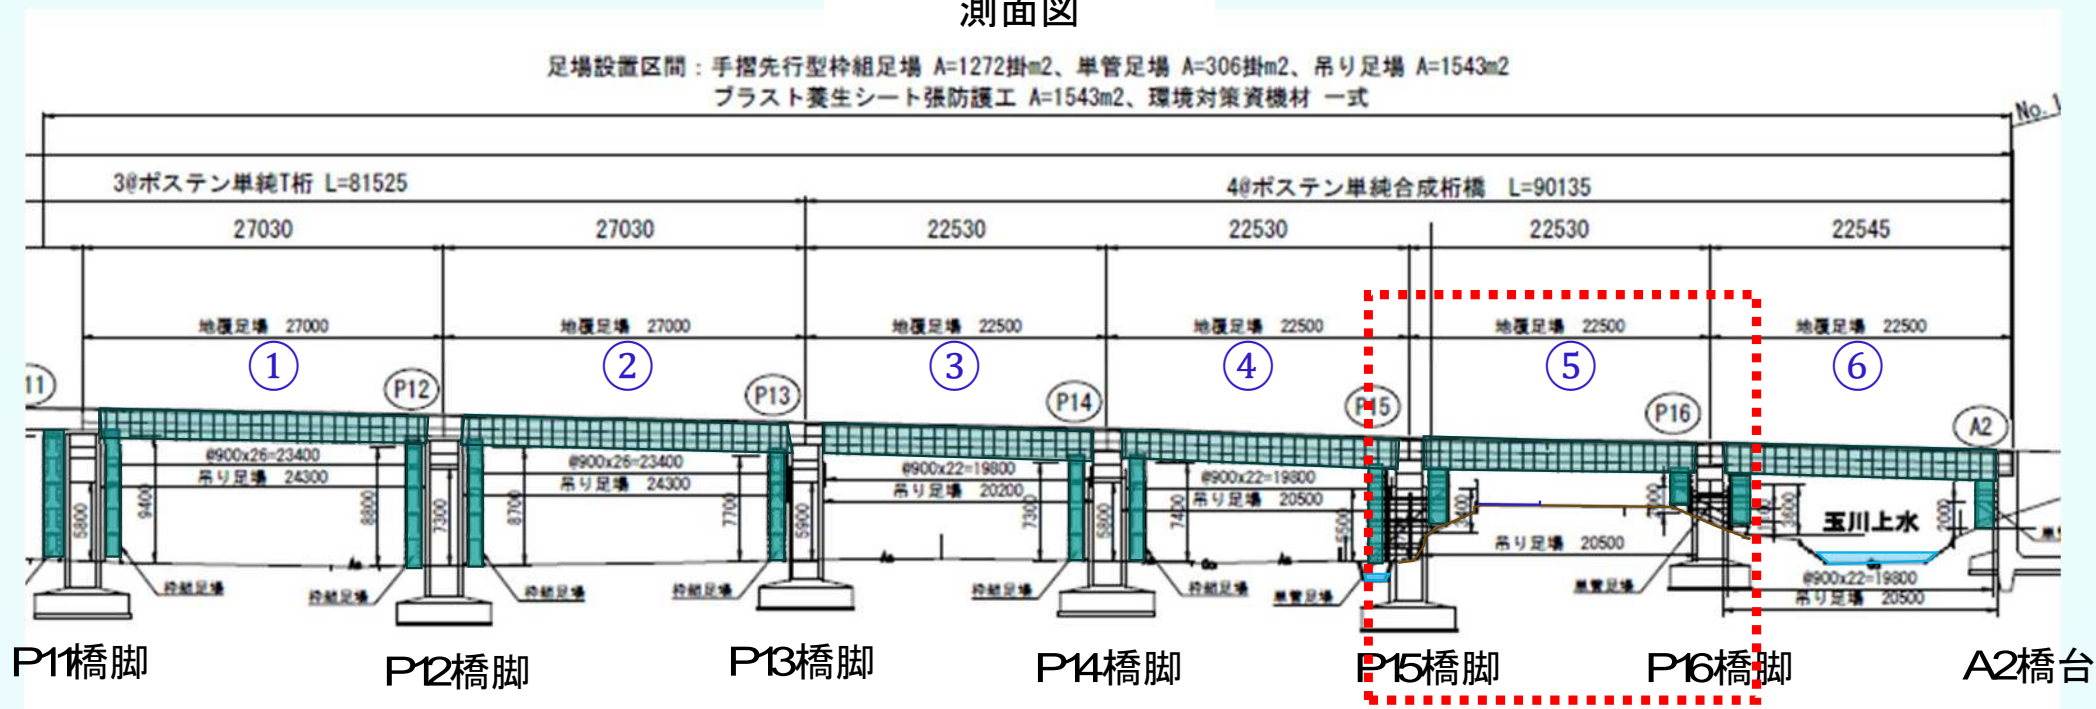

玉川上水敷地内作業

搬入路について（玉川上水敷地内作業時）

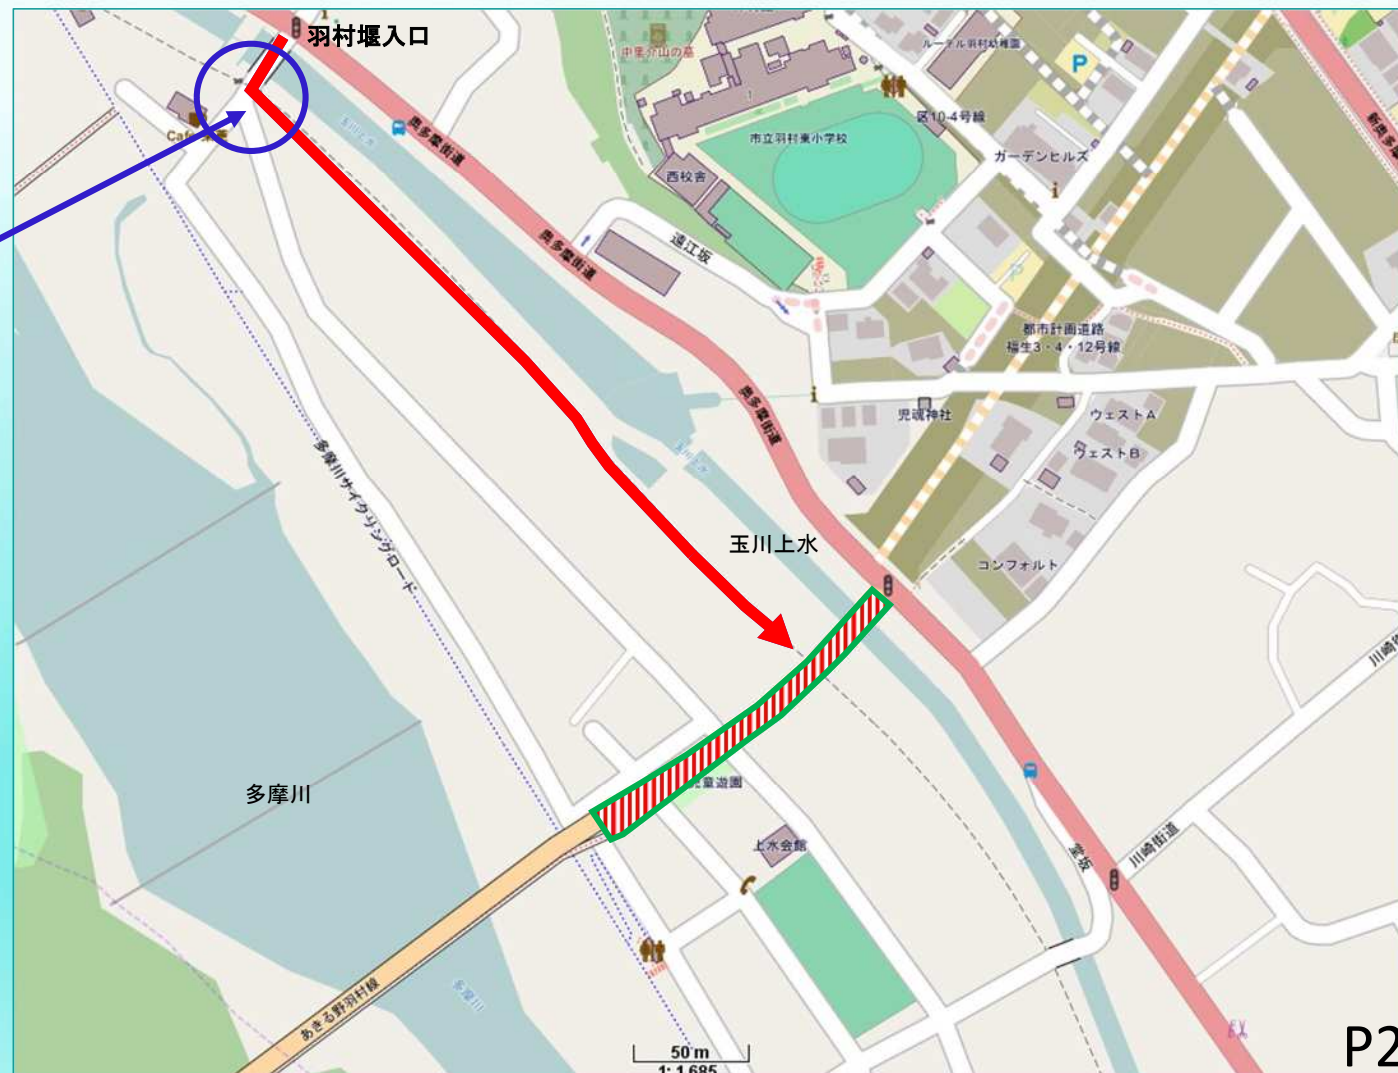


高所作業車による作業場所（橋下・玉川上水敷内）



【工事箇所図】

側面図

足場設置区間：手摺先行型枠組足場 A=1272掛m2、単管足場 A=306掛m2、吊り足場 A=1543m2
プラスト養生シート張防護工 A=1543m2、環境対策資機材 一式

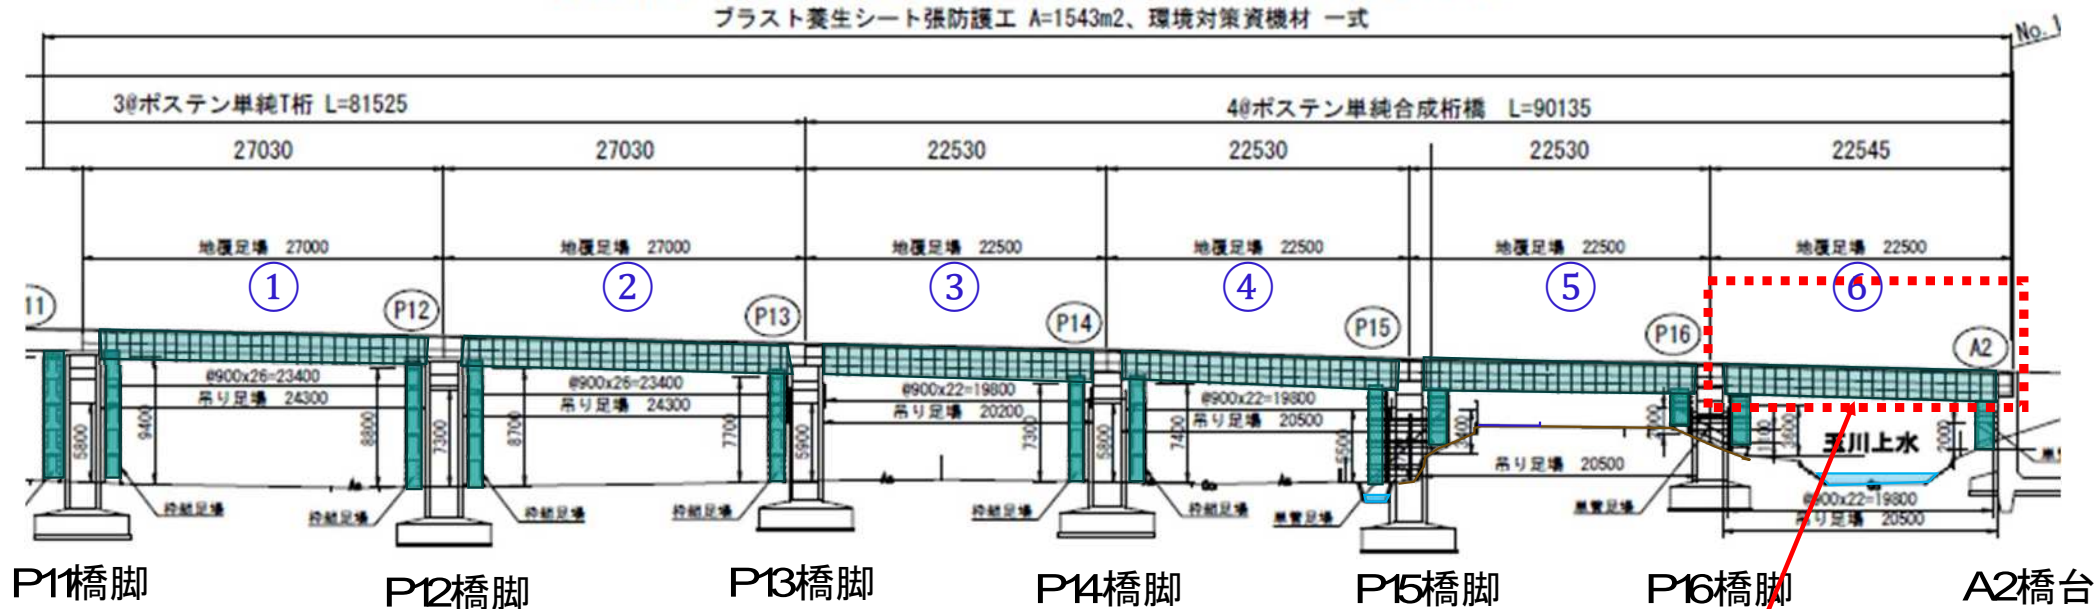

橋上からの作業

P25

橋上からの施工イメージ写真



交通規制（橋上からの作業時）

⑤交通規制期間〈足場設置期間〉
2025.9.上旬～2025.9.中旬（土日除く）

⑤交通規制期間〈足場撤去期間〉
2025.12月中旬～2026.1月中旬（予定）



補修方法の事例

コンクリート断面補修



ひび割れ注入



現場事務所・資材置場等



令和7年度 羽村大橋補修工事

工程表

No.	工 程	25年3月		25年4月		25年5月		25年6月		25年7月		25年8月		25年9月		25年10月		25年11月		25年12月		26年1月		26年2月	
		15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	28
1	準備工																								
2	仮設・足場工																								
3	調査・補修工																								
4	後片付け																								

足場設置期間

足場撤去期間

夏季休暇

冬季休暇

凡例: 計画工程表

問い合わせ先

西多摩建設事務所 工事第一課

【事業に関すること】

橋りょう設計担当 ☎ 0428-22-2710

【工事に関すること】

橋りょう工事担当 ☎ 0428-22-2746

双栄基礎工業株式会社 ☎080-7222-8178

皆様のご理解、ご協力を
お願いいたします。



東京都
