

第8回 東京都水防本部報告 (令和6年7月31日の大雨)

R6 No.8

- **大雨警報（23区西部、多摩北部）**が発表されたため、今年**8回目**の**水防本部**を設置
- 赤塚観測所で、総雨量116mm、最大1時間降水量109mmを観測
- 白子川（子安橋）で**氾濫発生情報**を発表

◆ 主な防災情報の発表履歴等

7月31日（水）

- 17:03 大雨注意報、洪水注意報 ⇒ 連絡態勢
- 18:10 大雨警報（23区西部、多摩北部） ⇒ **警戒配備態勢（水防本部設置）**
- 18:10 白子川（三ツ橋）氾濫危険情報発表
- 18:18 白子川（子安橋）氾濫発生情報発表
- 18:35 野川・仙川氾濫危険情報発表
- 18:40 記録的短時間大雨情報第1号 板橋・練馬区付近で100mm
- 19:09 記録的短時間大雨情報第2号 北区志茂102mm、北区付近で100mm
- 20:30 白子川（三ツ橋・子安橋）情報解除
- 20:35 野川・仙川情報解除
- 21:38 大雨・洪水警報、注意報解除
⇒ **警戒配備態勢解除（水防本部廃止）・連絡態勢解除**

◆ 最大1時間降水量（総雨量）

- 赤塚 109mm(116mm)
- 紅梅小学校 109mm(117mm)
- 志村五小 108mm(120mm)
- 北部土木 106mm(113mm)
- 志茂橋 106mm(111mm)

【7月31日 17:03～21:38】

◆ 被害状況

- 道路 なし
- 河川 外水氾濫あり
- 公園 なし

第8回 東京都水防本部報告 (令和6年7月31日の大雨)

R6 No.8

◆ 氾濫発生情報 ➤ 水位周知河川 (白子川)

■ 白子川 子安橋観測所




平常時



7/31 18:25頃



■ 水位グラフ

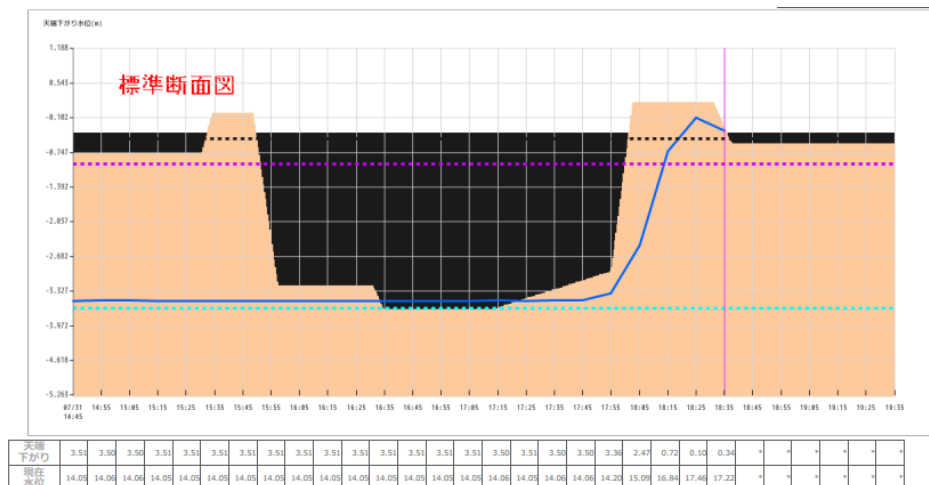

■ 河川位置図



第8回 東京都水防本部報告 (令和6年7月31日の大雨)

R6 No.8

◆ 氾濫危険情報 ➤ 水位周知河川 (白子川)

■ 白子川 三ツ橋観測所




平常時




7/31 18:20頃

■ 水位グラフ

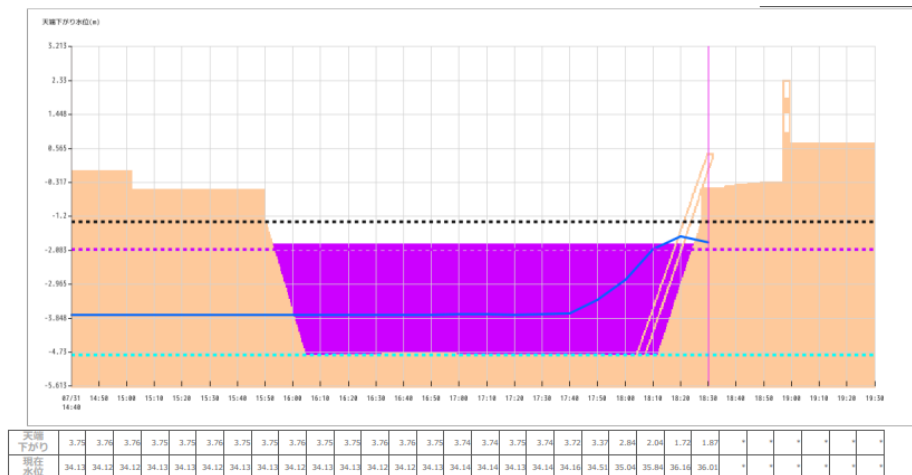

■ 河川位置図





第8回 東京都水防本部報告 (令和6年7月31日の大雨)

R6 No.8

等雨量線図 (総雨量)

令和6年7月31日 17:03~21:38



第8回 東京都水防本部報告

(令和6年7月31日の大雨)

R6 No.8

調節池貯留量実績（令和6年7月31日）

確定

事務所	区	河川名	調節池		貯留量実績（注1） 〔m3〕	貯留率 〔％〕	流 入		施設形式		
			名 称	貯留量〔m3〕			開始時間	終了時間			
一建		古川	古川地下調節池	135,000	0	0	：	～	：	地下トンネル式	
二建		目黒川	船入場調節池	55,000	0	0	：	～	：	地下箱式	
二建			荏原調節池	200,000	0	0	：	～	：	地下箱式	
三建		神田川	神田川・環状七号線地下調節池	540,000	0	0	：	～	：	地下トンネル式	
三建	中野		北江古田調節池	17,000	0	0	：	～	：	掘込式	
三建				妙正寺川第一調節池	30,000	0	0	：	～	：	掘込式
三建				妙正寺川第二調節池	100,000	0	0	：	～	：	地下箱式
三建			上高田調節池	160,000	19,300	12	18:31	～	19:25	地下箱式	
三建			落合調節池	50,000	0	0	：	～	：	地下箱式	
三建			鷺宮調節池	35,000	2,900	8	18:17	～	18:28	掘込式	
三建			和田堀公園調節池	17,500	0	0	：	～	：	掘込式	
三建	杉並	善福寺川	和田堀第六調節池	48,000	0	0	：	～	：	掘込式	
三建				善福寺川調節池	35,000	0	0	：	～	：	地下箱式
四建	練馬		比丘尼橋上流調節池	34,400	900	3	18:06	～	18:35	掘込式	
四建		白子川	比丘尼橋下流調節池	212,000	27,100	13	18:05	～	18:40	地下箱式	
四建			白子川地下調節池	212,000	98,800	47	18:12	～	19:38	地下トンネル式	
西建		霞川	霞川調節池	88,000	0	0	：	～	：	地下箱式	
北南建			芝久保調節池	11,000	0	0	：	～	：	掘込式	
北南建		石神井川	向台調節池	81,000	13,600	17	17:50	～	18:38	掘込式	
北南建			南町調節池	12,000	9,600	80	18:57	～	19:08	掘込式	
四建	練馬		富士見池調節池	33,800	22,400	66	18:20	～	19:21	掘込式	
北南建			野川第一調節池	21,000	0	0	：	～	：	掘込式	
北南建		野川	野川第二調節池	28,000	0	0	：	～	：	掘込式	
北南建			野川大沢調節池	158,000	68,000	43	18:20	～	20:00	掘込式	
北北建		黒目川	黒目橋調節池	221,000	5,500	2	18:01	～	20:11	地下箱式	
北北建		柳瀬川	金山調節池	46,000	0	0	：	～	：	掘込式	
北北建		残堀川	残堀川調節池	60,000	0	0	：	～	：	掘込式	

計（掘込式・地下式）： 2,640,700 268,100 10.2%

稼働箇所数 計（掘込式・地下式）： 10

北北建		空堀川	上砂神明調節池	19,800	0	0	：	～	：	河道内（注2）
北北建			武蔵村山調節池	13,800	0	0	：	～	：	河道内（注2）

計（河道内）： 33,600 0 0%

稼働箇所数 計（河道内）： 0

※調節池の概要や効果等の詳細は、HPに掲載しています。
（注1）貯留量実績は、水位計観測値もしくは現地調査の結果等により算出しています。
（注2）整備した河道を暫定的に調節池として活用しています。
