

第14回 東京都水防本部報告

(令和6年8月21日の大雨)

R6 No.14

- **大雨警報（23区西部）**が発表されたため、今年**14回目**の**水防本部**を設置
- 新宿観測所で、総雨量98mm、最大1時間降水量98mmを観測

◆ 主な防災情報の発表履歴等

8月21日（水）

16:08 高潮注意報（小笠原諸島） ⇒ 連絡態勢
17:16 大雨注意報（23区西部）追加
17:26 大雨警報（23区西部） ⇒ **警戒配備態勢（水防本部設置）**
18:43 大雨警報（多摩北部）追加
18:52 洪水警報（23区西部）追加
19:07 記録的短時間大雨情報第1号 港区付近で100mm
19:10 渋谷川・古川氾濫危険情報発表
19:20 土砂災害警戒情報（品川区）発表
20:20 土砂災害警戒情報（品川区）解除
20:30 渋谷川・古川氾濫危険情報解除
21:34 大雨・洪水警報解除
⇒ 連絡態勢へ移行（**水防本部廃止**）

◆ 最大1時間降水量（総雨量）

- 新宿 98mm(98mm)
- 高浜 75mm(90mm)
- 砧 69mm(74mm)
- 品川 60mm(67mm)
- 長久保 51mm(53mm)

【8月21日 16:08～21:34】

◆ 被害状況

- 道路 なし
- 河川 なし
- 公園 なし

第14回 東京都水防本部報告 (令和6年8月21日の大雨)

R6 No.14

◆ 氾濫危険情報 ➤ 洪水予報河川 (渋谷川・古川)

■ 渋谷川 渋谷橋観測所




平常時



8/21 19:15頃

■ 水位グラフ

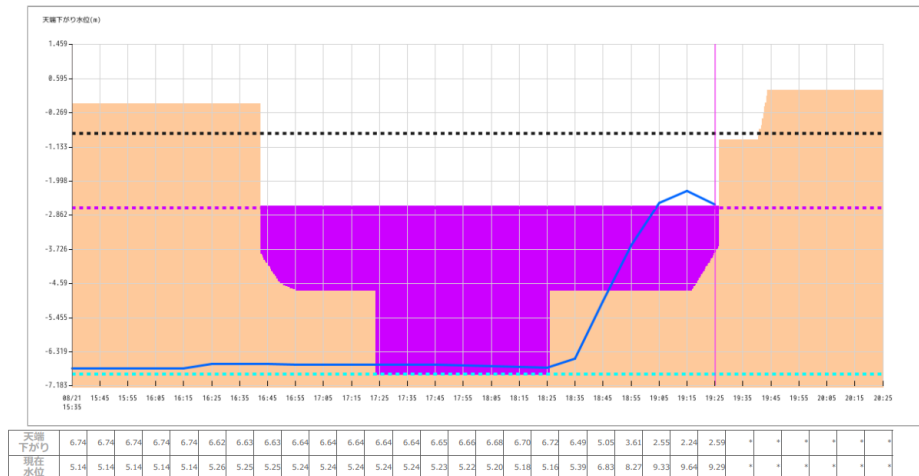

■ 河川位置図



■ 古川 四ノ橋観測所



平常時




8/21 19:15頃

■ 河川位置図





令和6年8月21日16:08~8月21日 21:34

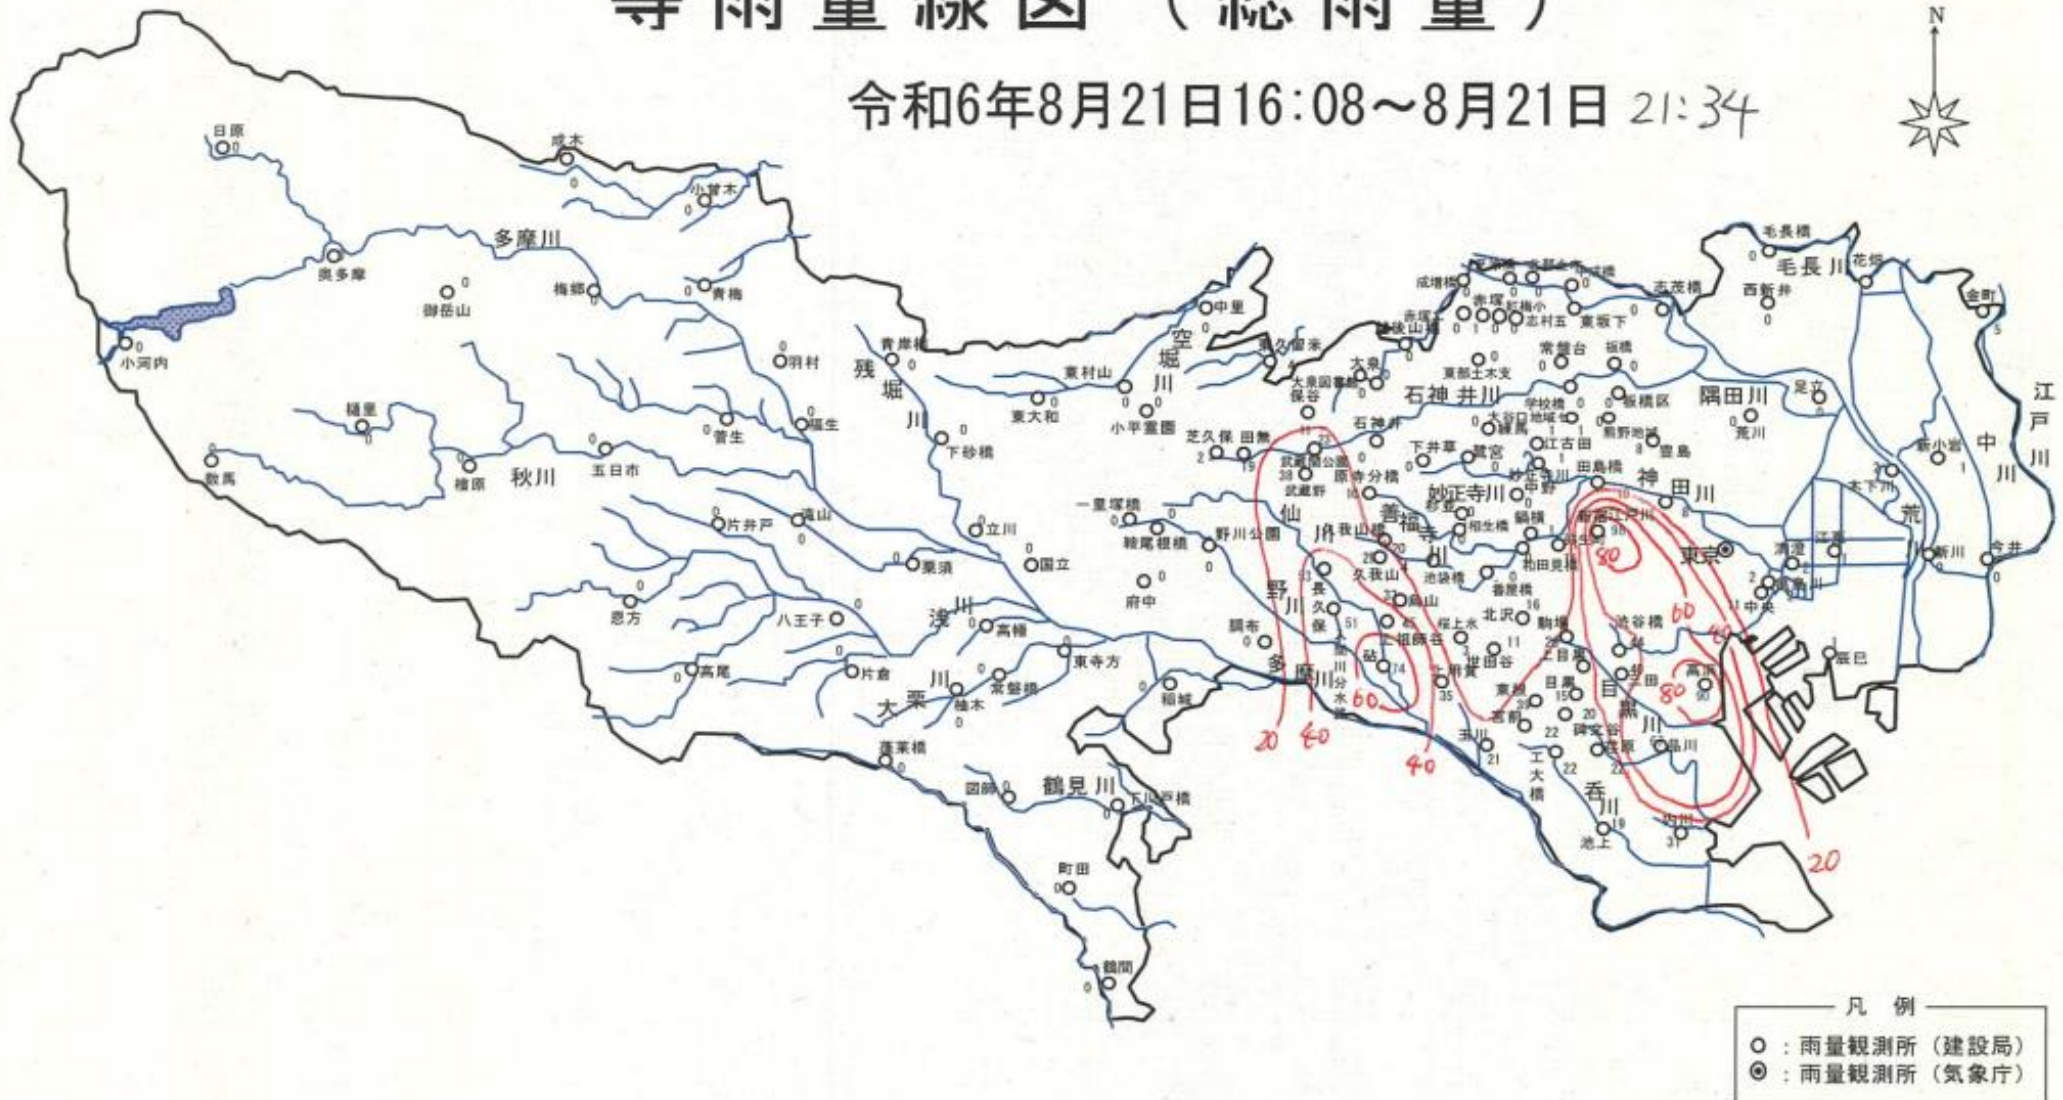

第14回 東京都水防本部報告

(令和6年8月21日の大雨)

R6 No.14

調節池貯留量実績（令和6年 8 月21日）									確定	
事務所	区	河川名	調節池		貯留量実績（注1） 〔m3〕	貯留率 〔％〕	流 入		施設形式	
			名 称	貯留量〔m3〕			開始時間	終了時間		
一建		古川	古川地下調節池	135,000	42,200	31	18:50	～ 19:34	地下トンネル式	
二建		目黒川	船入場調節池	55,000	0	0	：	～ ：	地下箱式	
二建			荏原調節池	200,000	0	0	：	～ ：	地下箱式	
三建		神田川	神田川・環状七号線地下調節池	540,000	0	0	：	～ ：	地下トンネル式	
三建	中野	妙正寺川	北江古田調節池	17,000	0	0	：	～ ：	掘込式	
三建				妙正寺川第一調節池	30,000	0	0	：	～ ：	掘込式
三建				妙正寺川第二調節池	100,000	0	0	：	～ ：	地下箱式
三建				上高田調節池	160,000	0	0	：	～ ：	地下箱式
三建				落合調節池	50,000	0	0	：	～ ：	地下箱式
三建				鷺宮調節池	35,000	0	0	：	～ ：	掘込式
三建		善福寺川	和田堀公園調節池	17,500	0	0	：	～ ：	掘込式	
三建	杉並		和田堀第六調節池	48,000	0	0	：	～ ：	掘込式	
三建				善福寺川調節池	35,000	0	0	：	～ ：	地下箱式
四建	練馬	白子川	比丘尼橋上流調節池	34,400	0	0	：	～ ：	掘込式	
四建				比丘尼橋下流調節池	212,000	0	0	：	～ ：	地下箱式
四建				白子川地下調節池	212,000	0	0	：	～ ：	地下トンネル式
西建		霞川	霞川調節池	88,000	0	0	：	～ ：	地下箱式	
北南建		石神井川	芝久保調節池	11,000	0	0	：	～ ：	掘込式	
北南建			向台調節池	81,000	0	0	：	～ ：	掘込式	
北南建			南町調節池	12,000	0	0	：	～ ：	掘込式	
四建	練馬		富士見池調節池	33,800	0	0	：	～ ：	掘込式	
北南建		野川	野川第一調節池	21,000	0	0	：	～ ：	掘込式	
北南建			野川第二調節池	28,000	0	0	：	～ ：	掘込式	
北南建			野川大沢調節池	158,000	0	0	：	～ ：	掘込式	
北北建		黒目川	黒目橋調節池	221,000	0	0	：	～ ：	地下箱式	
北北建		柳瀬川	金山調節池	46,000	0	0	：	～ ：	掘込式	
北北建		残堀川	残堀川調節池	60,000	0	0	：	～ ：	掘込式	
			計（掘込式・地下式）：	2,640,700	42,200	1.6%				

稼働箇所数 計（掘込式・地下式）：

1

北北建		空掘川	上砂神明調節池	19,800	0	0	: ~ :	河道内（注2）
北北建			武蔵村山調節池	13,800	0	0	: ~ :	河道内（注2）
			計（河道内）：	33,600	0	0%	※調節池の概要や効 （注4）の留意点等	

稼働箇所数 計（河道内）：

0

※調節池の概要や効果等の詳細は、HPに掲載しています。
（注1）貯留量実績は、水位計観測値もしくは現地調査の結果等により算出しています。
（注2）整備した河道を暫定的に調節池として活用しています。
