

第6回 東京都水防本部報告 (令和7年8月18日の大雨)

R7 No.6

- 荒川区で大雨警報が発表されたため、今年6回目の水防本部を設置
- 東久留米（東久留米市）で、総雨量84mm、最大1時間降水量68mmを観測

◆ 主な防災情報の発表履歴等

15:05 大雨注意報（23区東部）発表

⇒ 連絡態勢

15:45 大雨警報（23区東部（荒川区））発表

⇒ 水防本部設置

15:56 大雨警報（多摩西部）発表

16:03 大雨・洪水警報（多摩西部）発表

16:13 大雨・洪水警報（多摩北部）発表

16:43 大雨・洪水警報（23区西部・多摩北部）発表

17:33 洪水警報（多摩北部）発表（対象区市追加）

18:01 大雨警報（多摩北部）発表（対象区市追加）

18:12 大雨・洪水警報（多摩北部）発表（対象区市追加）

19:08 境川（昭和橋（神奈川県））水防警報（待機）発表

19:58 境川（昭和橋（神奈川県））水防警報解除

20:03 大雨・洪水警報解除

⇒ 水防本部廃止

20:12 大雨・洪水注意報解除

⇒ 連絡態勢解除

◆ 最大1時間降水量（総雨量）

- 東久留米 68mm(84mm)
- 保谷庁舎 49mm(52mm)
- 羽村 42mm(43mm)

【8月18日 13:00～ 20:00】

◆ 記録的短時間大雨情報


東久留米市 100mm

◆ 被害状況


- 道路 なし
- 河川 なし
- 公園 なし

◆ 気象庁解析雨量 08/18 13:00～ 08/18 20:00

○累加雨量

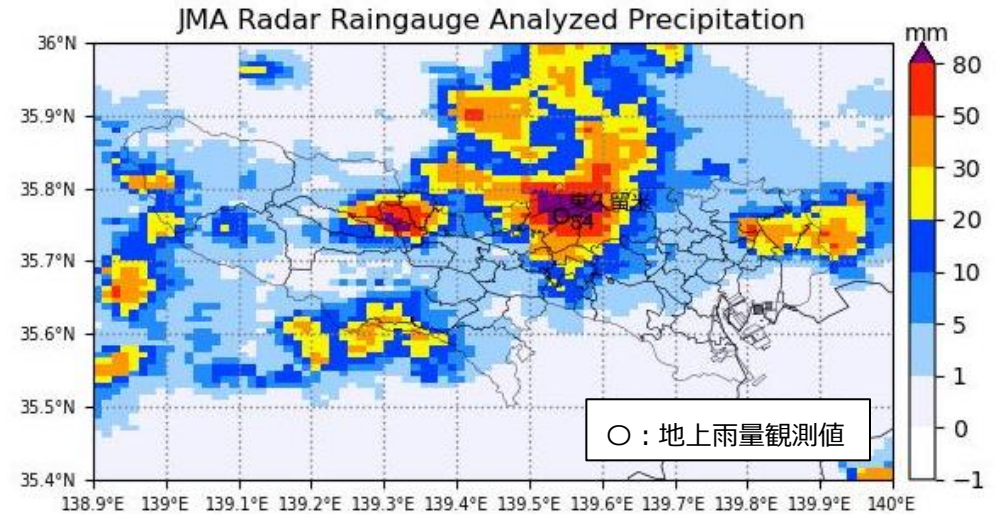

○1時間最大値

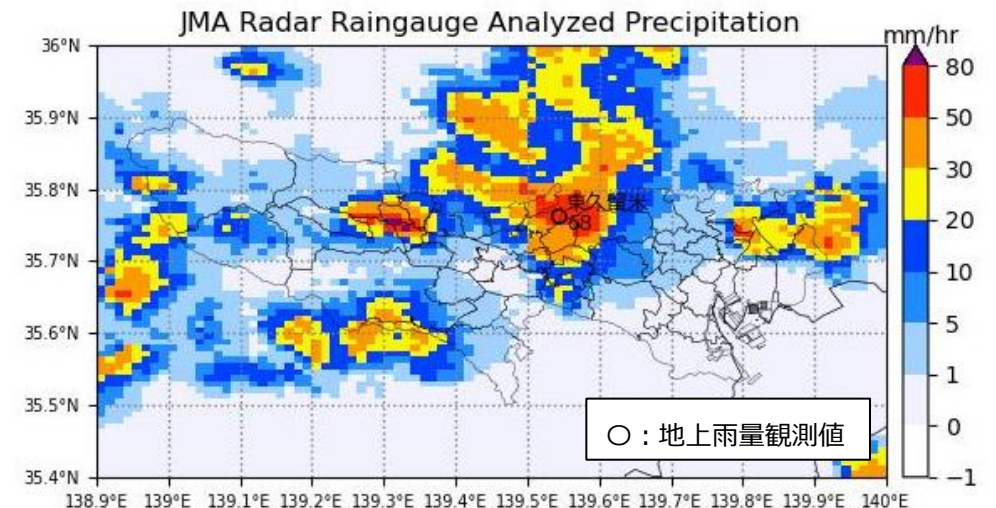

第6回 東京都水防本部報告

(令和7年8月18日の大雨)

R7 No.6

◆ 調節池貯留量実績

調節池貯留量実績（令和7年8月18日）											確定値	
事務所	区	河川名	調節池		貯留量実績（注1） 〔m3〕	貯留率 〔%〕	流 入			施設形式		
			名 称	貯留量〔m3〕			日付	開始時間	終了時間			
一建	港区	古川	古川地下調節池	135,000	0	0		：	～	：	地下トンネル式	
二建	目黒区	目黒川	船入場調節池	55,000	0	0		：	～	：	地下箱式	
	品川区		荏原調節池	200,000	0	0		：	～	：	地下箱式	
三建	杉並区	神田川	神田川・環状七号線地下調節池	540,000	0	0		：	～	：	地下トンネル式	
			下高井戸調節池	30,000	0	0		：	～	：	地下箱式	
	中野区	妙正寺川	北江古田川	17,000	0	0		：	～	：	掘込式	
			妙正寺川第一調節池	30,000	0	0		：	～	：	掘込式	
			妙正寺川第二調節池	100,000	0	0		：	～	：	地下箱式	
			上高田調節池	160,000	0	0		：	～	：	地下箱式	
	新宿区		落合調節池	50,000	0	0		：	～	：	地下箱式	
	中野区		鷺宮調節池	35,000	0	0		：	～	：	掘込式	
	杉並区	善福寺川	和田堀公園調節池	17,500	0	0		：	～	：	掘込式	
			和田堀第六調節池	48,000	0	0		：	～	：	掘込式	
善福寺川調節池			35,000	0	0		：	～	：	地下箱式		
四建	練馬区	白子川	比丘尼橋上流調節池	34,400	0	0		：	～	：	掘込式	
			比丘尼橋下流調節池	212,000	0	0		：	～	：	地下箱式	
			白子川地下調節池	212,000	0	0		：	～	：	地下トンネル式	
		石神井川	城北中央公園調節池	90,000	0	0		：	～	：	地下箱式	
			富士見池調節池	33,800	0	0		：	～	：	掘込式	
北南建		西東京市	石神井川	芝久保調節池	11,000	0	0		：	～	：	掘込式
	向台調節池			81,000	2,900	4	8/18	17:31	～	17:43	掘込式	
	南町調節池			12,000	3,900	33	8/18	17:36	～	18:02	掘込式	
北南建	小金井市	野川	野川第一調節池	21,000	0	0		：	～	：	掘込式	
			野川第二調節池	28,000	0	0		：	～	：	掘込式	
	三鷹市		野川大沢調節池	158,000	0	0		：	～	：	掘込式	
北北建	東久留米市	黒目川	黒目橋調節池	221,000	0	0		：	～	：	地下箱式	
		落合川	下谷橋調節池	9,500	0	0		：	～	：	掘込式	
	清瀬市	柳瀬川	金山調節池	46,000	0	0		：	～	：	掘込式	
	立川市	残堀川	残堀川調節池	60,000	0	0		：	～	：	掘込式	
西建	青梅市	霞川	霞川調節池	88,000	0	0		：	～	：	地下箱式	
計（掘込式・地下式）：				2,770,200	6,800	0.2%						
稼働箇所数 計（掘込式・地下式）：				2								
北北建	東大和市	空堀川	上砂神明調節池	19,800	0	0		：	～	：	河道内（注2）	
			武蔵村山調節池	13,800	0	0		：	～	：	河道内（注2）	
	武蔵村山市		計（河道内）：				33,600	0	0%			
	稼働箇所数 計（河道内）：				0							
貯留量実績 合計：				2,803,800	6,800	0.2%						
稼働箇所 合計：				2								

※ 調節池の概要や効果等の詳細は、HPに掲載しています。

（注1） 貯留量実績は、水位計観測値もしくは現地調査の結果等により算出しています。

（注2） 整備した河道を暫定的に調節池として活用しています。
