

第10回 東京都水防本部報告

(令和7年9月10日の大雨)

R7 No.10

- 文京区等に大雨警報が発表されたため、今年10回目の水防本部を設置
- 江古田（中野区）で、総雨量63mm、最大1時間降水量62mmを観測

◆ 主な防災情報の発表履歴等

11:20 大雨・洪水注意報（23区西部・東部）発表

⇒ 連絡態勢

11:37 大雨警報（23区西部・東部）発表

⇒ 水防本部設置（警戒配備態勢）

16:55 大雨・洪水警報、大雨・洪水注意報 解除

⇒ 水防本部廃止（連絡態勢解除）

◆ 最大1時間降水量（総雨量）

- 江古田 62mm(63mm)
- 学校橋 61mm(65mm)
- 板橋区役所 59mm(70mm)


【9月10日 10:00～ 9月10日 17:00】

◆ 被害状況


- 道路 なし
- 河川 なし
- 公園 なし

◆ 気象庁解析雨量 09/10 10:00～ 09/10 17:00

○累加雨量

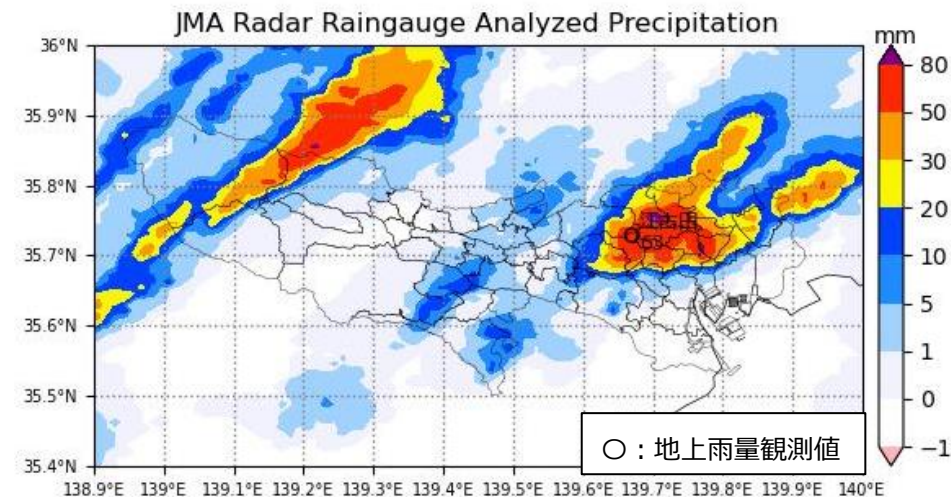

○1時間最大値

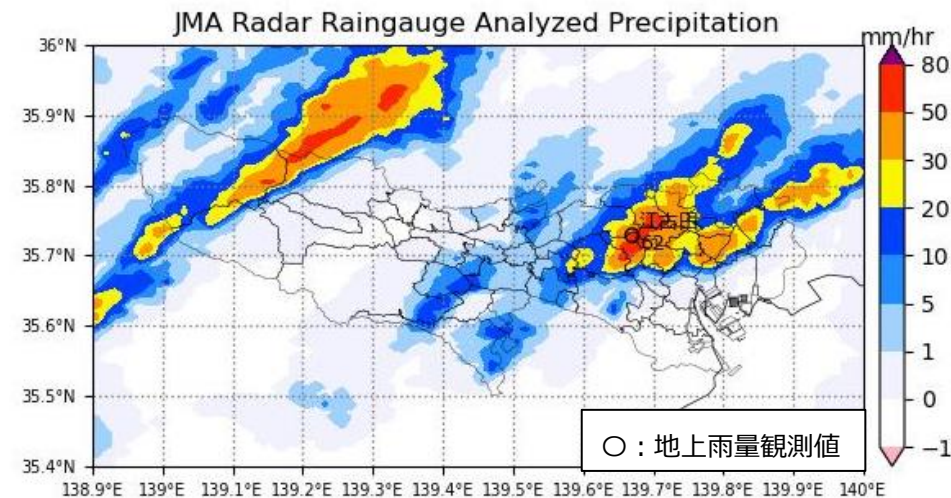

第10回 東京都水防本部報告

(令和7年9月10日の大雨)

R7 No.10

◆ 調節池貯留量実績 (確定値)

事務所	区	河川名	調節池		貯留量実績（注1）	貯留率	流 入			施設形式	
			名 称	貯留量〔m3〕	〔m3〕	〔％〕	日付	開始時間	終了時間		
一建	港区	古川	古川地下調節池	135,000	0	0		：	～	：	地下トンネル式
二建	目黒区	目黒川	船入場調節池	55,000	0	0		：	～	：	地下箱式
	品川区		荏原調節池	200,000	0	0		：	～	：	地下箱式
三建	杉並区	神田川	神田川・環状七号線地下調節池	540,000	0	0		：	～	：	地下トンネル式
			下高井戸調節池	30,000	0	0		：	～	：	地下箱式
	中野区	江古田川	北江古田調節池	17,000	0	0		：	～	：	掘込式
		妙正寺川	妙正寺川第一調節池	30,000	0	0		：	～	：	掘込式
			妙正寺川第二調節池	100,000	0	0		：	～	：	地下箱式
			上高田調節池	160,000	2,900	2	9/10	13:30	～ 14:05		地下箱式
	新宿区	中野区	落合調節池	50,000	0	0		：	～	：	地下箱式
	鷺宮調節池		35,000	0	0		：	～	：	掘込式	
	杉並区	善福寺川	和田堀公園調節池	17,500	0	0		：	～	：	掘込式
			和田堀第六調節池	48,000	0	0		：	～	：	掘込式
			善福寺川調節池	35,000	0	0		：	～	：	地下箱式
四建	練馬区	白子川	比丘尼橋上流調節池	34,400	0	0		：	～	：	掘込式
			比丘尼橋下流調節池	212,000	0	0		：	～	：	地下箱式
			白子川地下調節池	212,000	0	0		：	～	：	地下トンネル式
		石神井川	城北中央公園調節池	90,000	0	0		：	～	：	地下箱式
			富士見池調節池	33,800	0	0	9/8	18:23	～ 19:02		掘込式
北南建	西東京市	石神井川	芝久保調節池	11,000	0	0		：	～	：	掘込式
			向台調節池	81,000	0	0		：	～	：	掘込式
			南町調節池	12,000	0	0	9/8	18:09	～ 18:29		掘込式
北南建	小金井市	野川	野川第一調節池	21,000	0	0		：	～	：	掘込式
	三鷹市		野川第二調節池	28,000	0	0		：	～	：	掘込式
			野川大沢調節池	158,000	0	0		：	～	：	掘込式
北北建	東久留米市	黒目川	黒目橋調節池	221,000	0	0	9/8	18:17	～ 19:15		地下箱式
		落合川	下谷橋調節池	9,500	0	0	9/8	18:09	～ 19:11		掘込式
	清瀬市	柳瀬川	金山調節池	46,000	0	0		：	～	：	掘込式
	立川市	残堀川	残堀川調節池	60,000	0	0		：	～	：	掘込式
西建	青梅市	霞川	霞川調節池	88,000	0	0		：	～	：	地下箱式
				計（掘込式・地下式）：	2,770,200	2,900	0.1%				
				稼働箇所数 計（掘込式・地下式）：	1						
北北建	東大和市	空堀川	上砂神明調節池	19,800	0	0		：	～	：	河道内（注2）
			武蔵村山調節池	13,800	0	0		：	～	：	河道内（注2）
			計（河道内）：	33,600	0	0%					
					稼働箇所数 計（河道内）：	0					
				貯留量実績 合計：	2,803,800	2,900	0.1%				
				稼働箇所 合計：	1						

※ 調節池の概要や効果等の詳細は、HPに掲載しています。
（注1） 貯留量実績は、水位計観測値もしくは現地調査の結果等により算出しています。
（注2） 整備した河道を暫定的に調節池として活用しています。
