

第3回 東京都水防本部報告 (令和8年7月17日の大雨)

R8 No.3

- 23区西部（目黒区、世田谷区）にてレベル3大雨警報が発表されたため、今年3回目の水防本部を設置
- 八王子観測所で、総雨量81mm、最大1時間降水量78mmを観測
- 池上観測所（大田区）で、総雨量112mm、最大1時間降水量74mmを観測

◆ 主な防災情報の発表履歴等

- | | |
|--|---|
| 10:42 レベル2大雨注意報（23区西部）
⇒ 本庁連絡態勢 | 14:27 レベル3大雨警報（多摩西部）対象追加
レベル2土砂災害注意報（多摩西部）対象追加 |
| 11:16 レベル3大雨警報（23区西部（目黒区、世田谷区））
⇒ 水防本部設置（警戒配備態勢） | 15:50 レベル2土砂災害注意報解除 |
| 11:40 レベル3大雨警報（23区西部、23区東部）対象追加
レベル2土砂災害注意報（23区西部（世田谷区）） | 16:45 レベル3大雨警報解除
⇒ 水防本部廃止 |
| 12:01 レベル4大雨危険警報（23区東部（足立区））
レベル2土砂災害注意報（23区東部）対象追加 | 17:28 レベル2大雨注意報解除
⇒ 水防連絡態勢解除 |
| 12:32 レベル3大雨警報（23区東部）対象追加 | |
| 12:43 レベル3大雨警報（多摩南部）対象追加
レベル2土砂災害注意報（多摩南部）対象追加 | |
| 12:52 レベル3大雨警報（23区西部）対象追加 | |
| 13:21 レベル4大雨危険警報（23区東部（江戸川区））
レベル3大雨警報（多摩南部）対象追加
レベル2土砂災害注意報（多摩南部）対象追加 | |
| 13:42 レベル4大雨危険警報（多摩南部（八王子市））
レベル2大雨注意報（多摩西部）対象追加 | |

◆ 最大1時間降水量（総雨量）


○ 東京地方

- 八王子 78mm (81mm)
- 玉川 75mm (101mm)
- 池上 74mm (112mm)
- 毛長橋 72mm (75mm)


【7月17日 10:00～ 7月17日 17:00】

◆ 気象庁解析雨量 07/17 10:00～ 07/17 17:00

○ 累加雨量

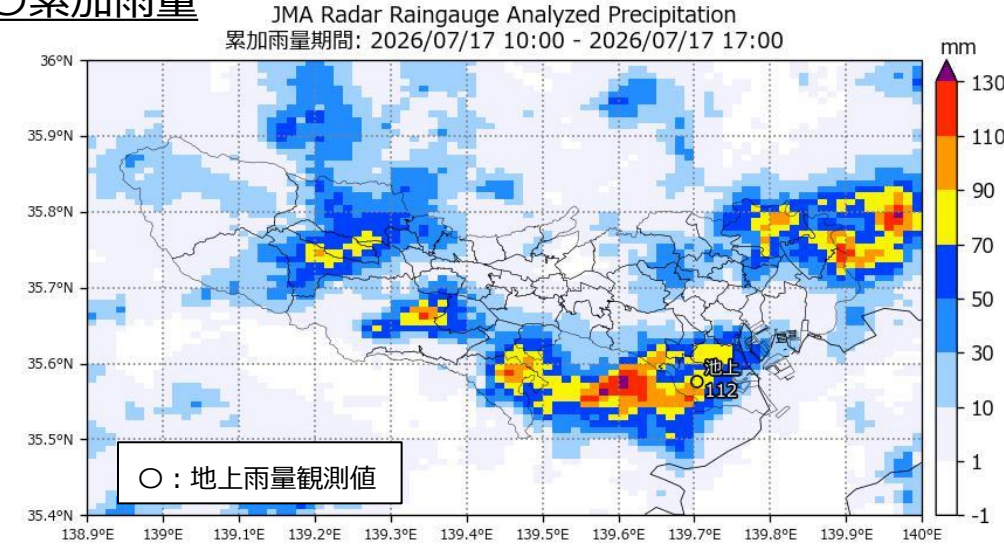

○ 1時間最大値

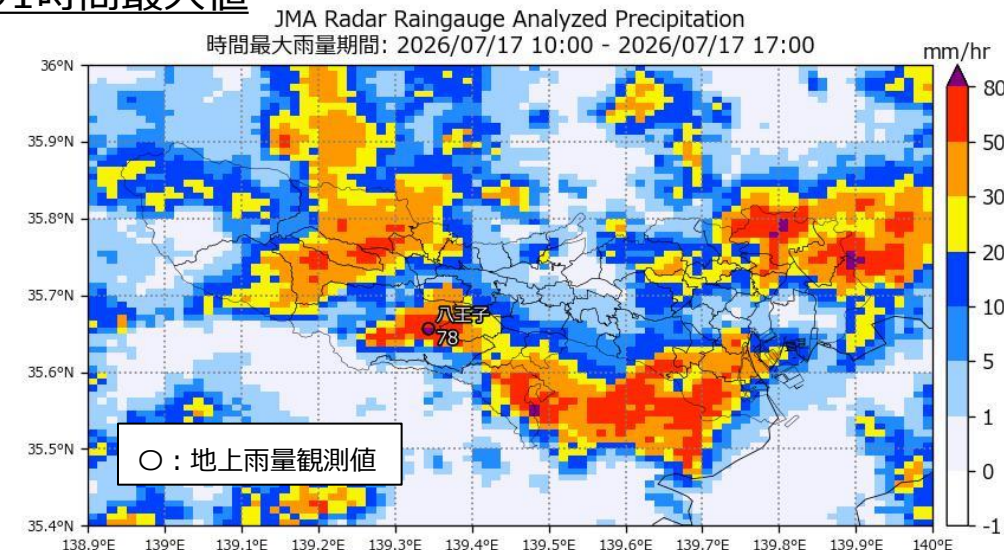

第3回 東京都水防本部報告

(令和8年7月17日の大雨)

R8 No.3

◆ 調節池貯留量実績 (確定値)

事務所	区	河川名	調節池		貯留量実績（注1） 〔m3〕	貯留率 〔％〕	流 入			施設形式			
			名 称	貯留量〔m3〕			日付	開始時間	終了時間				
一建	港区	古川	古川地下調節池	135,000	0	0		:	～	:	地下トンネル式		
二建	目黒区	目黒川	船入場調節池	55,000	0	0		:	～	:	地下箱式		
	品川区		荏原調節池	200,000	0	0		:	～	:	地下箱式		
三建	杉並区	神田川	神田川・環状七号線地下調節池	540,000	0	0		:	～	:	地下トンネル式		
			下高井戸調節池	30,000	0	0		:	～	:	地下箱式		
	中野区	江古田川	北江古田調節池	17,000	0	0		:	～	:	掘込式		
		妙正寺川	妙正寺川第一調節池	30,000	0	0		:	～	:	掘込式		
			妙正寺川第二調節池	100,000	0	0		:	～	:	地下箱式		
			上高田調節池	160,000	0	0		:	～	:	地下箱式		
			落合調節池	50,000	0	0		:	～	:	地下箱式		
	新宿区		落合調節池	50,000	0	0		:	～	:	地下箱式		
	中野区		鷺宮調節池	35,000	0	0		:	～	:	掘込式		
	杉並区	善福寺川	和田堀公園調節池	17,500	0	0		:	～	:	掘込式		
			和田堀第六調節池	48,000	0	0		:	～	:	掘込式		
			善福寺川調節池	35,000	0	0		:	～	:	地下箱式		
四建	練馬区	白子川	比丘尼橋上流調節池	34,400	0	0		:	～	:	掘込式		
			比丘尼橋下流調節池	212,000	0	0		:	～	:	地下箱式		
			白子川地下調節池	212,000	0	0		:	～	:	地下トンネル式		
		石神井川	富士見池調節池	33,800	0	0		:	～	:	掘込式		
			芝久保調節池	11,000	0	0		:	～	:	掘込式		
向台調節池	81,000		0	0		:	～	:	掘込式				
北南建	西東京市	石神井川	南町調節池	12,000	0	0		:	～	:	掘込式		
			小金井市	野川	野川第一調節池	21,000	0	0		:	～	:	掘込式
					野川第二調節池	28,000	0	0		:	～	:	掘込式
	三鷹市			野川大沢調節池	158,000	0	0		:	～	:	掘込式	
	北北建	東久留米市	黒目川	黒目橋調節池	221,000	0	0.0		:	～	:	地下箱式	
落合川			下谷橋調節池	9,500	0	0		:	～	:	掘込式		
清瀬市			柳瀬川	金山調節池	46,000	0	0		:	～	:	掘込式	
立川市			残堀川	残堀川調節池	60,000	0	0		:	～	:	掘込式	
西建	青梅市	霞川	霞川調節池	88,000	10,700	12	7/17	14:22	～	15:13	地下箱式		
南東建	町田市	境川	境川木曽東調節池	49,000	0	0		:	～	:	地下箱式		
計（掘込式・地下式）：				2,729,200	10,700	0.4%							
				稼働箇所数 計（掘込式・地下式）：		1							

※ 調節池の概要や効果等の詳細は、HPに掲載しています。
(注1) 貯留量実績は、水位計観測値もしくは現地調査の結果等により算出しています。
