

第13回 東京都水防本部報告

(令和8年9月5～7日の大雨)

R8 No.13

- 23区西部、多摩北部にてレベル3大雨警報が発表されたため、今年13回目の水防本部を設置
- 永郷観測所（八丈町）で、最大1時間降水量 125mm
卯辰山頂観測所（御蔵島村）で、最大総雨量 604mm を観測
※東京地方
今井観測所（江戸川区）で、最大1時間降水量 30mm
最大総雨量 147mm を観測

◆主な防災情報の発表履歴等

9/5

20:32 レベル2土砂災害注意報（青ヶ島）

⇒ 連絡体制

9/6

04:06 レベル4土砂災害危険警報（八丈町）

19:24 レベル2土砂災害注意報（多摩西部、南部）

21:07 レベル3大雨警報（23区西部、多摩北部）

⇒ 水防本部設置

23:50 善福寺川(松見橋) レベル4氾濫危険警報 発表

9/7

02:50 国：多摩川（田園調布（上））水防警報（準備）

04:15 レベル5土砂災害特別警報（新島村）

06:00 多摩川（水防警報）解除

06:10 善福寺川（洪水予報）解除

07:14 気象情報（内地全域レベル3からレベル2へ）

格下げ

⇒ 水防本部廃止

◆ 最大1時間降水量（総雨量）

<島しょ>

・ 永郷（八丈町） 125mm (486mm)

・ 卯辰山頂（御蔵） 103mm (604mm)

・ 伊ヶ谷沢（三宅） 92mm (558mm)

<内地>

・ 今井（江戸川） 30mm (148mm)

・ 入間川分水路（調布） 26mm (140mm)

・ 長久保（三鷹） 25mm (127mm)


[9月05日 20:00～ 9月7日 07:00]

◆ 記録的短時間大雨


八丈町 110mm

◆ 気象庁解析雨量 09/05 20:00～ 09/07 7:00

○累加雨量

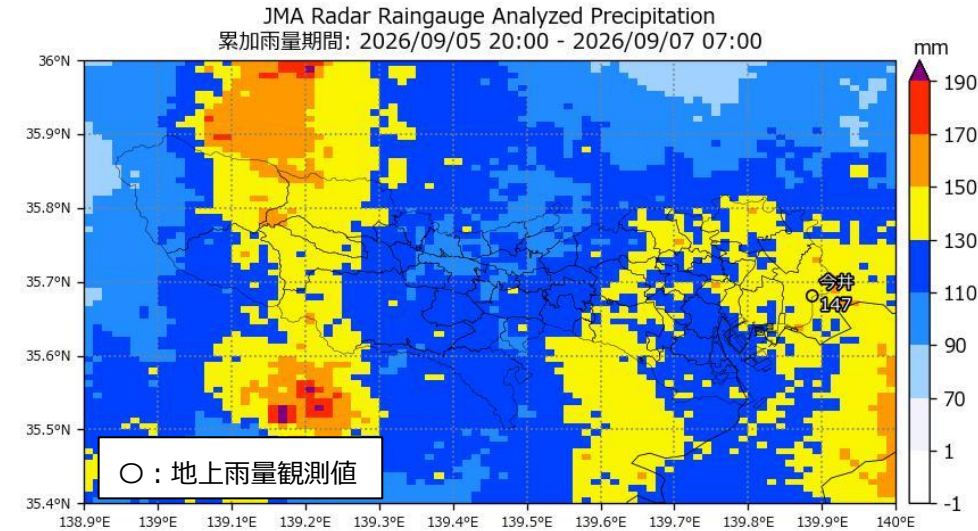

○1時間最大値

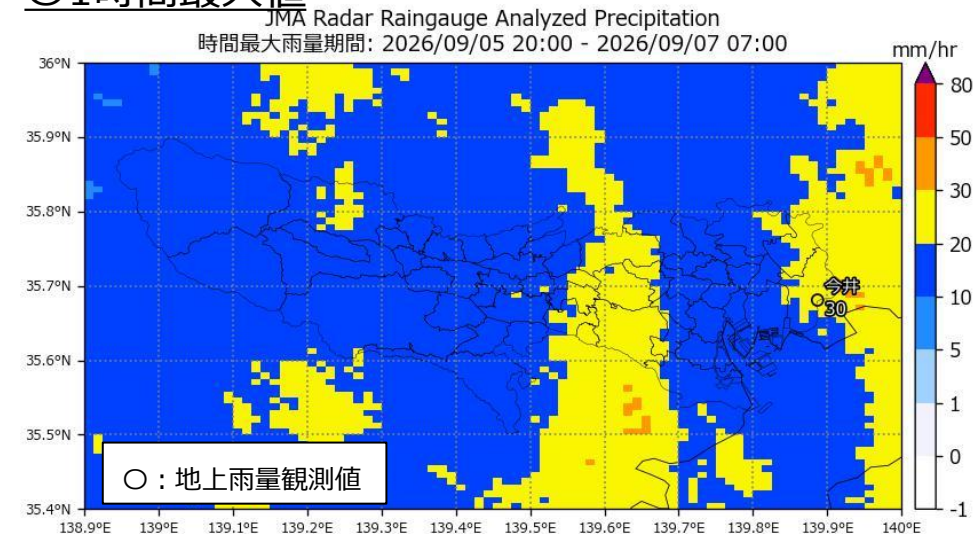

第13回 東京都水防本部報告

(令和8年9月5～7日の大雨)


R8 No.13

◆ レベル4 氾濫危険警報 ➤ 洪水予報河川（善福寺川）


■ 善福寺川 松見橋



■ 水位グラフ

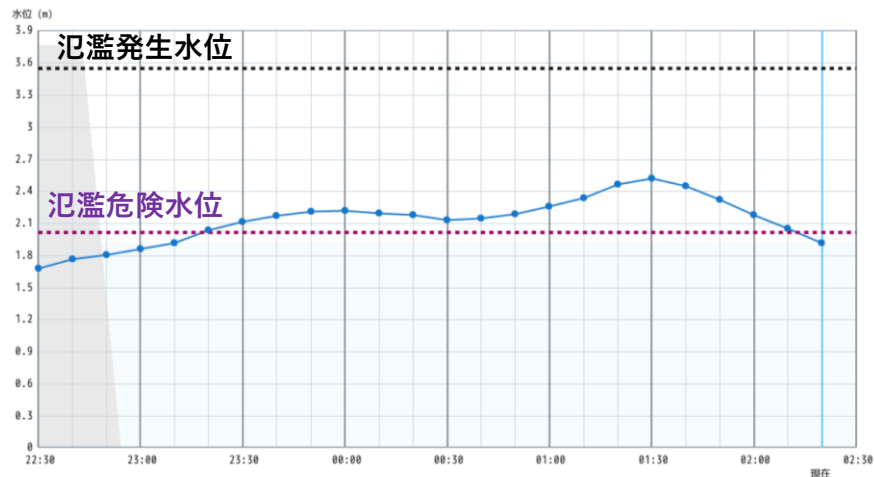

■ 河川位置図

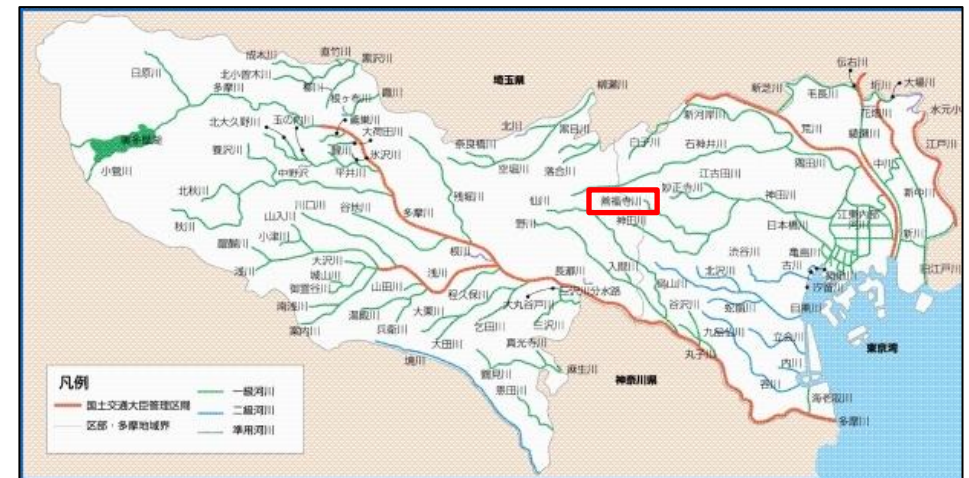

調節池貯留実績（令和 8 年 9 月 5 日～ 7 日）

確定値

事務所	区	河川名	調節池		流入量（注1） 〔m3〕	流 入			施設形式
			名 称	貯留量〔m3〕		日付	開始時間	終了時間	
一建	港区	古川	古川地下調節池	135,000	0	：	～	：	地下トンネル式
二建	目黒区	目黒川	船入場調節池	55,000	0	：	～	：	地下箱式
	品川区		荏原調節池	200,000	0	：	～	：	地下箱式
三建	杉並区	神田川	神田川・環状七号線地下調節池	540,000	0	：	～	：	地下トンネル式
			下高井戸調節池	30,000	0	：	～	：	地下箱式
	中野区	妙正寺川	北江古田調節池	17,000	0	：	～	：	掘込式
			妙正寺川第一調節池	30,000	0	：	～	：	掘込式
			妙正寺川第二調節池	100,000	0	：	～	：	地下箱式
			上高田調節池	160,000	0	：	～	：	地下箱式
	新宿区		落合調節池	50,000	0	：	～	：	地下箱式
	中野区		鷺宮調節池	35,000	0	：	～	：	掘込式
	杉並区	善福寺川	和田堀公園調節池	17,500	0	：	～	：	掘込式
			和田堀第六調節池	48,000	0	：	～	：	掘込式
			善福寺川調節池	35,000	0	：	～	：	地下箱式
四建	練馬区	白子川	比丘尼橋上流調節池	34,400	0	：	～	：	掘込式
			比丘尼橋下流調節池	212,000	0	：	～	：	地下箱式
			白子川地下調節池	212,000	0	：	～	：	地下トンネル式
北南建	西東京市	石神井川	富士見池調節池	33,800	0	：	～	：	掘込式
			芝久保調節池	11,000	0	：	～	：	掘込式
			向台調節池	81,000	0	：	～	：	掘込式
			南町調節池	12,000	0	：	～	：	掘込式
	小金井市	野川	野川第一調節池	21,000	0	：	～	：	掘込式
			野川第二調節池	28,000	0	：	～	：	掘込式
	三鷹市		野川大沢調節池	158,000	800	9/7	1:07	～ 1:55	掘込式
北北建	東久留米市	黒目川	黒目橋調節池	221,000	31,200	9/6	23:40	～ 4:50	地下箱式
		落合川	下谷橋調節池	9,500	0	：	～	：	掘込式
	清瀬市	柳瀬川	金山調節池	46,000	0	：	～	：	掘込式
	立川市	残堀川	残堀川調節池	60,000	0	：	～	：	掘込式
西建	青梅市	霞川	霞川調節池	88,000	0	：	～	：	地下箱式
南東建	町田市	境川	境川木曾東調節池	49,000	0	：	～	：	

※ 調節池の概要や効果等の詳細は、HPに掲載しています。

(注1) 流入量は、水位計観測値もしくは現地調査の結果等により算出しています。
