

第9回 東京都水防本部報告


(令和7年9月8日の大雨)

R7 No. 9


- 東久留米市に大雨警報が発表されたため、今年9回目の水防本部を設置
- 武蔵関公園（練馬区）で、総雨量58mm、最大1時間降水量58mmを観測

◆ 気象庁解析雨量 09/08 12:00～ 09/08 20:00

○累加雨量

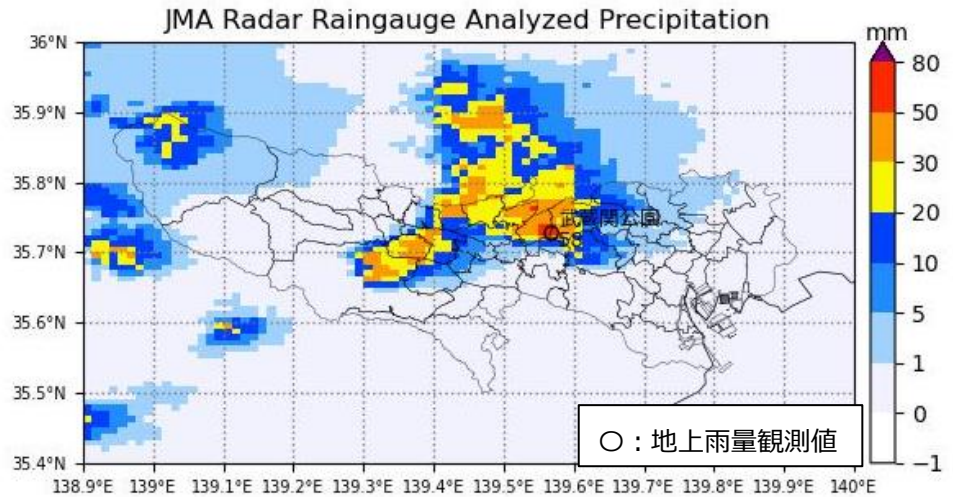

○1時間最大値

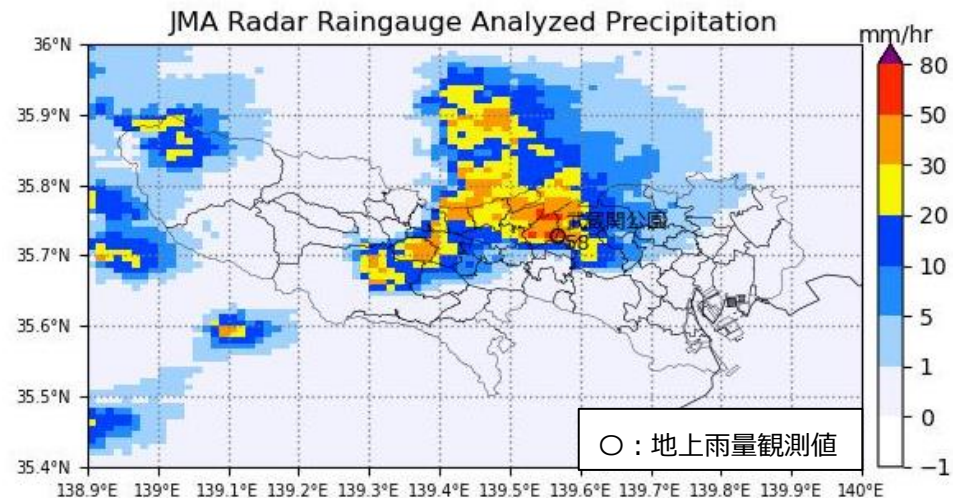

◆ 主な防災情報の発表履歴等

- 16:41 大雨注意報（多摩北部）発表
⇒ 連絡態勢
- 17:25 洪水注意報（多摩北部）発表
- 18:02 大雨・洪水注意報（23区西部）発表
- 18:15 大雨・洪水注意報（23区東部）発表
- 18:28 大雨警報（多摩北部）発表
⇒ 水防本部設置（警戒配備態勢）
- 18:44 大雨・洪水警報（23区西部）発表
- 20:14 大雨・洪水警報、大雨注意報 解除
⇒ 水防本部廃止（連絡態勢へ移行）
- 20:53 洪水注意報 解除
⇒ 連絡態勢解除

◆ 最大1時間降水量（総雨量）

- 武蔵関公園 58mm(58mm)
 - 東久留米 56mm(57mm)
 - 田無 51mm(51mm)
- 【9月8日 12:00～ 9月8日 20:00】

◆ 被害状況

- 道路 なし
- 河川 なし
- 公園 なし

◆ 調節池貯留量実績
(確定値)

事務所	区	河川名	調節池		貯留量実績（注1）	貯留率	流 入			施設形式	
			名 称	貯留量〔m3〕	〔m3〕	〔％〕	日付	開始時間	終了時間		
一建	港区	古川	古川地下調節池	135,000	0	0	:	～	:	地下トンネル式	
二建	目黒区	目黒川	船入場調節池	55,000	0	0	:	～	:	地下箱式	
	品川区		荏原調節池	200,000	0	0	:	～	:	地下箱式	
三建	杉並区	神田川	神田川・環状七号線地下調節池	540,000	0	0	:	～	:	地下トンネル式	
			下高井戸調節池	30,000	0	0	:	～	:	地下箱式	
	中野区	江古田川	北江古田調節池	17,000	0	0	:	～	:	掘込式	
			妙正寺川	妙正寺川第一調節池	30,000	0	0	:	～	:	掘込式
				妙正寺川第二調節池	100,000	0	0	:	～	:	地下箱式
				上高田調節池	160,000	0	0	:	～	:	地下箱式
	新宿区	妙正寺川	落合調節池	50,000	0	0	:	～	:	地下箱式	
	中野区		鷺宮調節池	35,000	0	0	:	～	:	掘込式	
	杉並区	善福寺川	和田堀公園調節池	17,500	0	0	:	～	:	掘込式	
			和田堀第六調節池	48,000	0	0	:	～	:	掘込式	
			善福寺川調節池	35,000	0	0	:	～	:	地下箱式	
四建	練馬区	白子川	比丘尼橋上流調節池	34,400	0	0	:	～	:	掘込式	
			比丘尼橋下流調節池	212,000	0	0	:	～	:	地下箱式	
			白子川地下調節池	212,000	0	0	:	～	:	地下トンネル式	
		石神井川	城北中央公園調節池	90,000	0	0	:	～	:	地下箱式	
			富士見池調節池	33,800	11,500	34	9/8	18:23 ～	19:02	掘込式	
北南建	西東京市	石神井川	芝久保調節池	11,000	0	0	:	～	:	掘込式	
			向台調節池	81,000	0	0	:	～	:	掘込式	
			南町調節池	12,000	2,000	17	9/8	18:09 ～	18:29	掘込式	
北南建	小金井市	野川	野川第一調節池	21,000	0	0	:	～	:	掘込式	
	三鷹市		野川第二調節池	28,000	0	0	:	～	:	掘込式	
			野川大沢調節池	158,000	0	0	:	～	:	掘込式	
北北建	東久留米市	黒目川	黒目橋調節池	221,000	3,600	2	9/8	18:17 ～	19:15	地下箱式	
		落合川	下谷橋調節池	9,500	5,300	56	9/8	18:09 ～	19:11	掘込式	
	清瀬市	柳瀬川	金山調節池	46,000	0	0	:	～	:	掘込式	
	立川市	残堀川	残堀川調節池	60,000	0	0	:	～	:	掘込式	
西建	青梅市	霞川	霞川調節池	88,000	0	0	:	～	:	地下箱式	
計（掘込式・地下式）：				2,770,200	22,400	0.8%					
稼働箇所数 計（掘込式・地下式）：				4							
北北建	東大和市	空堀川	上砂神明調節池	19,800	0	0	:	～	:	河道内（注2）	
			武蔵村山調節池	13,800	0	0	:	～	:	河道内（注2）	
	計（河道内）：				33,600	0	0%				
稼働箇所数 計（河道内）：				0							
貯留量実績 合計：				2,803,800	22,400	0.8%					
稼働箇所 合計：				4							

※ 調節池の概要や効果等の詳細は、HPに掲載しています。

（注1） 貯留量実績は、水位計観測値もしくは現地調査の結果等により算出しています。

（注2） 整備した河道を暫定的に調節池として活用しています。
