第６回 東京都水防本部報告
（令和６年７月22日の大雨）

R6 No.6

- **奈良橋川（日月橋）で氾濫危険情報**が発表されたため、今年**６回目**の**水防本部**を設置
- 梅郷観測所で、総雨量55㎜、最大1時間降水量55㎜を観測

◆ 主な防災情報の発表履歴等

７月22日（月）

21:11　奈良橋川（日月橋）氾濫危険情報発表

⇒ **警戒配備態勢（水防本部設置）**

21:23　大雨警報（多摩北部）

22:40　奈良橋川（日月橋）氾濫危険情報解除

23:27　大雨警報（多摩北部）解除

⇒**警戒配備態勢解除（水防本部廃止）**

◆ 最大1時間降水量（総雨量）

- 梅郷　55mm(55mm)
- 東村山　47mm(47mm)
- 羽村　44mm(44mm)
- 五日市　44mm(44mm)
- 東大和　43mm(42mm)

【7月22日　19:30～23:27】

◆ 被害状況

- 道路　なし
- 河川　なし
- 公園　なし

第６回 東京都水防本部報告
（令和６年７月22日の大雨）

R6 No.6

◆ 氾濫危険情報　➢ 水位周知河川　（奈良橋川）

■ 奈良橋川 日月橋観測所

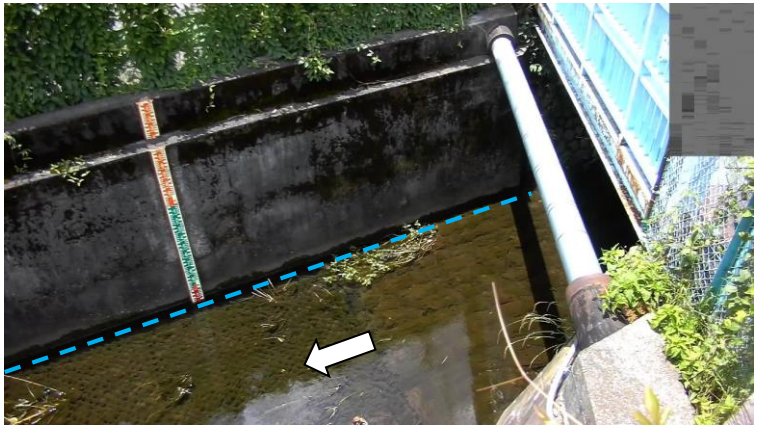

平常時

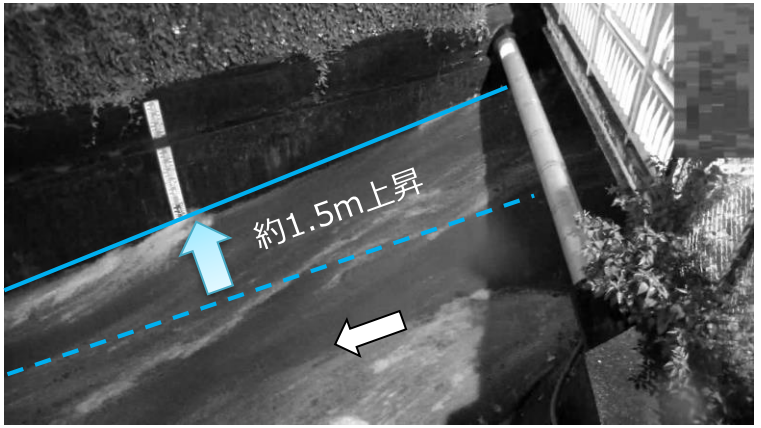

7/22 21:20頃

■ 水位グラフ

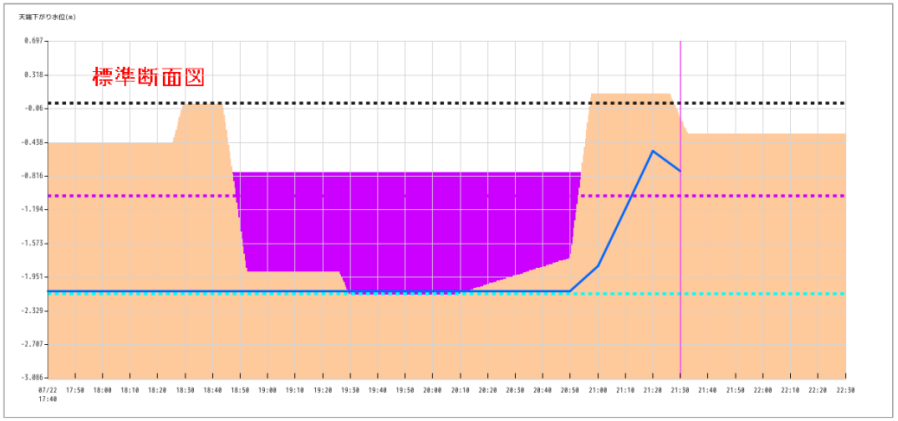

天端下がり	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	1.82	1.18	0.53	0.76	*	*	*	*	*	*
現在水位	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.89	93.53	94.18	93.95	*	*	*	*	*	*

■ 河川位置図

第６回 東京都水防本部報告
（令和６年７月22日の大雨）

R6 No.6

第６回 東京都水防本部報告
（令和６年７月22日の大雨）

R6 No.6

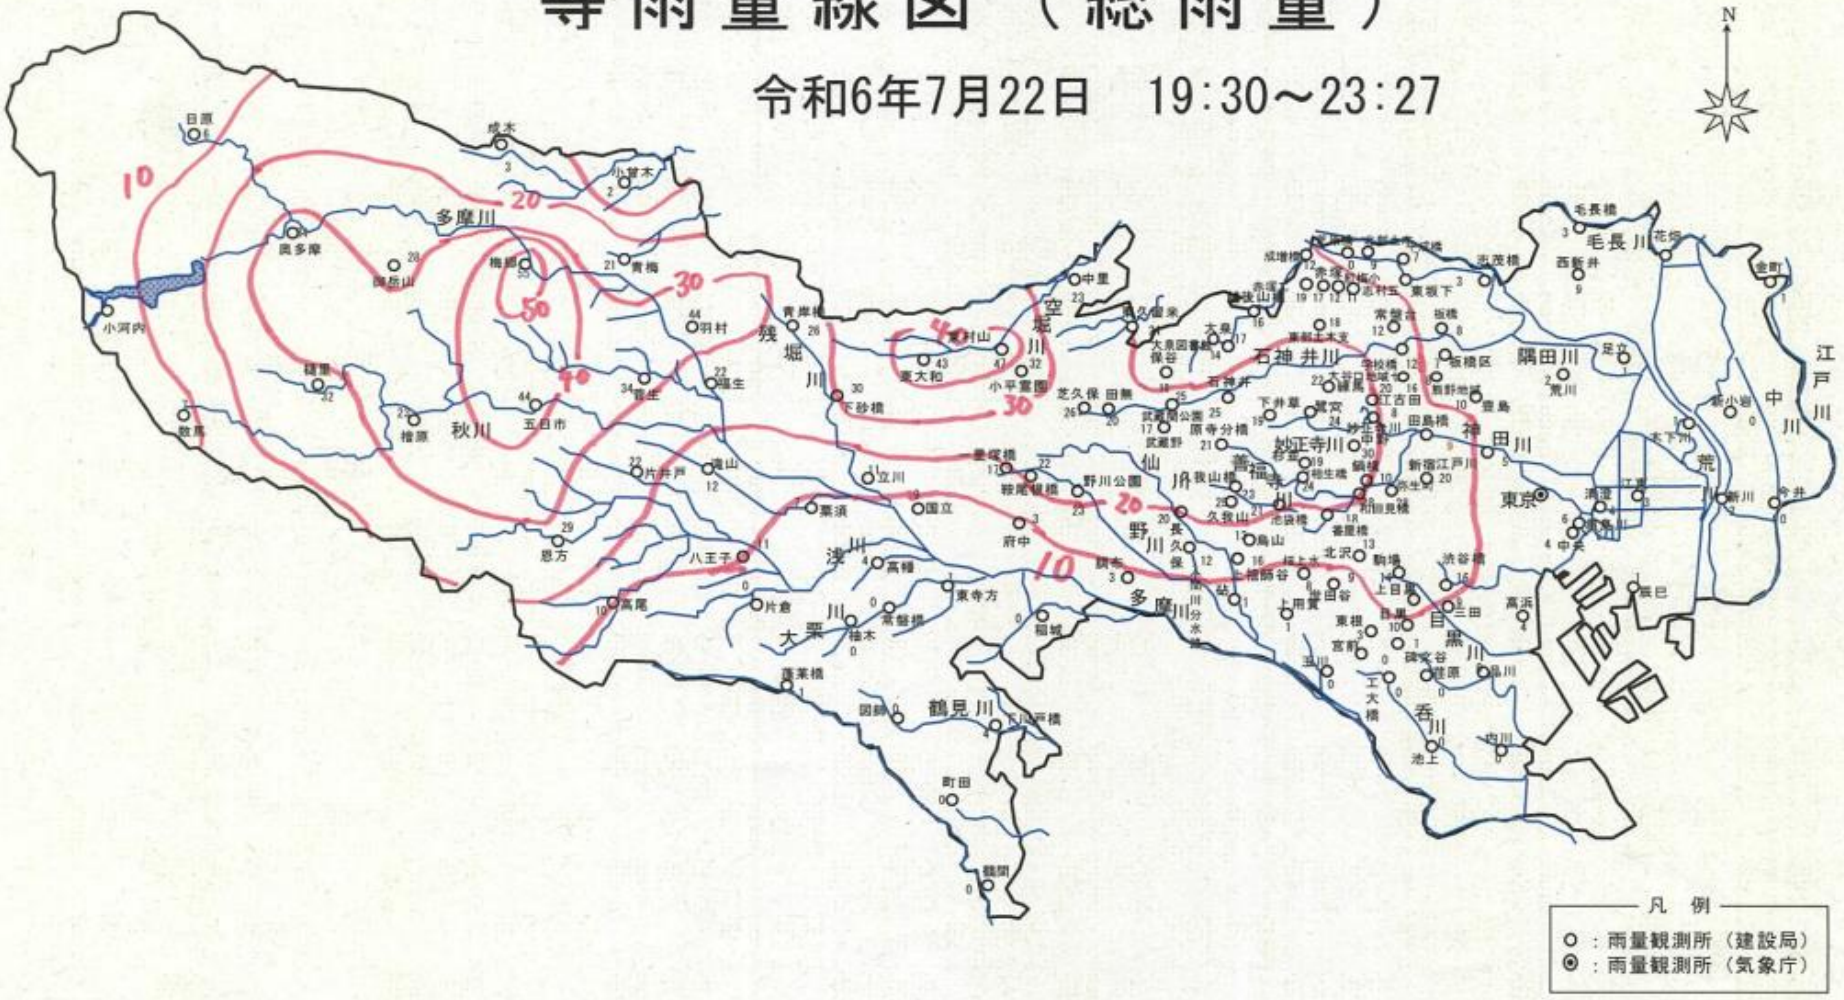

第６回 東京都水防本部報告
（令和６年７月22日の大雨）

R6 No.6

調節池貯留量実績（令和6年7月22日）

確定

事務所	区	河川名	調節池 名称	貯留量〔m3〕	貯留量実績（注1）〔m3〕	貯留率〔%〕	流入 開始時間	流入 終了時間	施設形式
一建		古川	古川地下調節池	135,000	0	0	:	:	地下トンネル式
二建		目黒川	船入場調節池	55,000	0	0	:	:	地下箱式
二建			荏原調節池	200,000	0	0	:	:	地下箱式
三建		神田川	神田川・環状七号線地下調節池	540,000	0	0	:	:	地下トンネル式
三建	中野	妙正寺川	北江古田調節池	17,000	0	0	:	:	掘込式
三建			妙正寺川第一調節池	30,000	0	0	:	:	掘込式
三建			妙正寺川第二調節池	100,000	0	0	:	:	地下箱式
三建			上高田調節池	160,000	0	0	:	:	地下箱式
三建			落合調節池	50,000	0	0	:	:	地下箱式
三建			鷺宮調節池	35,000	0	0	:	:	掘込式
三建		善福寺川	和田堀公園調節池	17,500	0	0	:	:	掘込式
三建	杉並		和田堀第六調節池	48,000	0	0	:	:	掘込式
三建			善福寺川調節池	35,000	0	0	:	:	地下箱式
四建	練馬	白子川	比丘尼橋上流調節池	34,400	0	0	:	:	掘込式
四建			比丘尼橋下流調節池	212,000	0	0	:	:	地下箱式
四建			白子川地下調節池	212,000	0	0	:	:	地下トンネル式
西建		霞川	霞川調節池	88,000	0	0	:	:	地下箱式
北南建			芝久保調節池	11,000	0	0	:	:	掘込式
北南建		石神井川	向台調節池	81,000	0	0	:	:	掘込式
北南建			南町調節池	12,000	3,400	28	21:41	22:06	掘込式
四建	練馬		富士見池調節池	33,800	0	0	:	:	掘込式
北南建			野川第一調節池	21,000	0	0	:	:	掘込式
北南建		野川	野川第二調節池	28,000	0	0	:	:	掘込式
北南建			野川大沢調節池	158,000	4,900	3	21:46	22:22	掘込式
北北建		黒目川	黒目橋調節池	221,000	2,100	1	21:59	23:03	地下箱式
北北建		柳瀬川	金山調節池	46,000	0	0	:	:	掘込式
北北建		残堀川	残堀川調節池	60,000	0	0	:	:	掘込式
			計（堀込式・地下式）：	2,640,700	**10,400**	**0.4%**			
			稼働箇所数　計（堀込式・地下式）：		**3**				
北北建		空掘川	上砂神明調節池	19,800	5,400	27	21:02	21:27	河道内（注2）
北北建			武蔵村山調節池	13,800	0	0	:	:	河道内（注2）
			計（河道内）：	33,600	**5,400**	**16%**			
			稼働箇所数　計（河道内）：		**1**				

※調節池の概要や効果等の詳細は、HPに掲載しています。
（注1）貯留量実績は、水位計観測値もしくは現地調査の結果等により算出しています。
（注2）整備した河道を暫定的に調節池として活用しています。
