令和７年２月

岩井橋の架け替え事業について

横十間川親水公園を跨ぐ岩井橋は、昭和４５年に架けられ、約半世紀が経過。経年劣化による強度低下が懸念され、平成２８年から橋の架替事業に着手しました。

事業開始後、コンクリート塊や木くずなどの支障物が見つかり、撤去の検討や作業に時間を要したことなどから、工事の一時中止や追加作業が生じています。また、当初検討していた公園内のみで公園復旧を行うと想定より時間がかかる事が判明しました。

工事の遅れを少なくするため、道路上の規制帯も利用して、公園復旧を行うなど、施工方法の再検討を行いましたが、令和１１年度まで事業期間が延伸する見込みです。なお、ご要望の多い橋下の通行に関しては、施工手順を見直して、令和９年度に西側園路の開通を予定しております。また、本事業に関連して、岩井橋東詰の交差点改良や歩道の拡幅改修なども含めた道路整備を行い、安全対策及び利便性の向上を図ります。

皆様には長期にわたりご不便をおかけしておりますが、引き続きご理解ご協力をお願いいたしします。

１．工事箇所

東京都江東区扇橋三丁目地内から北砂一丁目地内まで



５．現況写真・完成パース

現況（平成２８年度）



完成形（令和１１年度予定）



お問合せ先

東京都第五建設事務所　工事課

〒124-0023　東京都葛飾区東新小岩 1-14-11


○ 事業全体に関すること　橋りょう設計担当　TEL　03-3692-4454

○ 工事に関すること　　橋りょう工事担当　TEL　03-3692-4464

2．工程表

平成２８年度～令和１１年度（完成予定）


	年度													
	平成２８	平成２９	平成３０	令和１	令和２	令和３	令和４	令和５	令和６	令和７	令和８	令和９	令和１０	令和１１
１期（北側躯体）工事														
２期（南側躯体）工事														
３期（公園復旧）工事														
４期（都道本整備）工事														

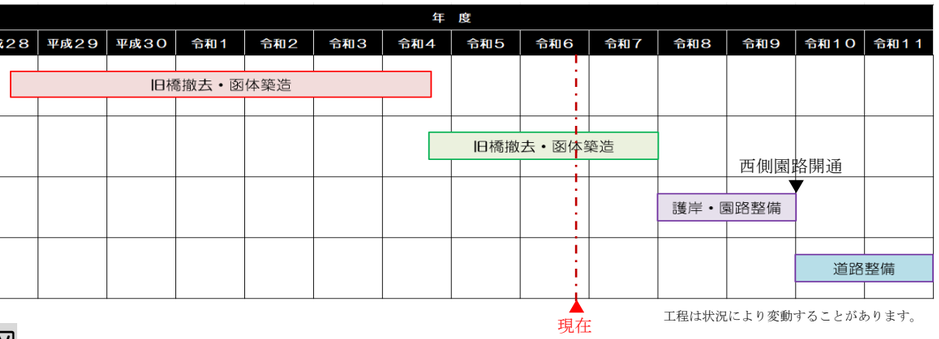


工程は状況により変動することがあります。

3．施工平面図

１期（北側躯体）・３期（北側公園復旧）工事　（※片側２車線→片側１車線）

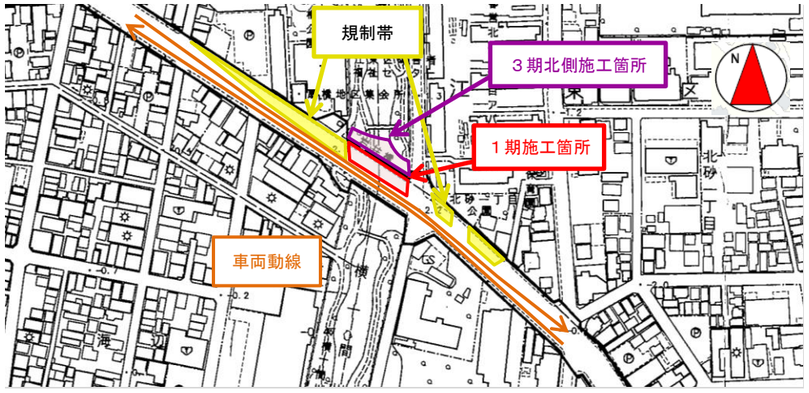

２期（南側躯体）・３期（南側公園復旧）工事　（※片側２車線→片側１車線）

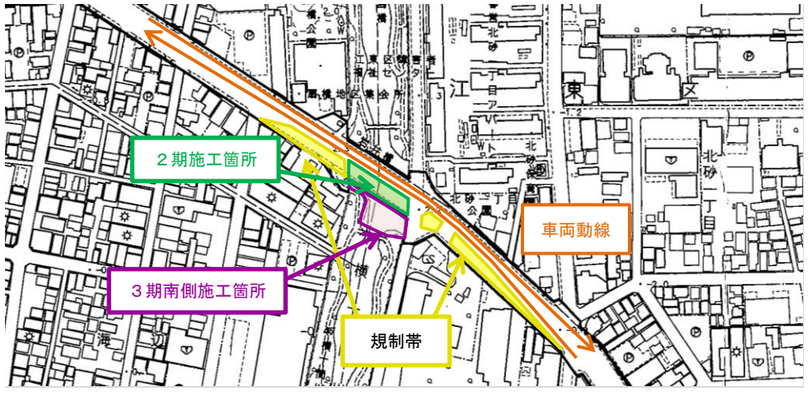


４期（都道本整備）工事


舗装、柵、白線、照明などの道路整備を行います。

4．施工断面

１期（北側躯体）工事・３期（北側公園復旧）工事

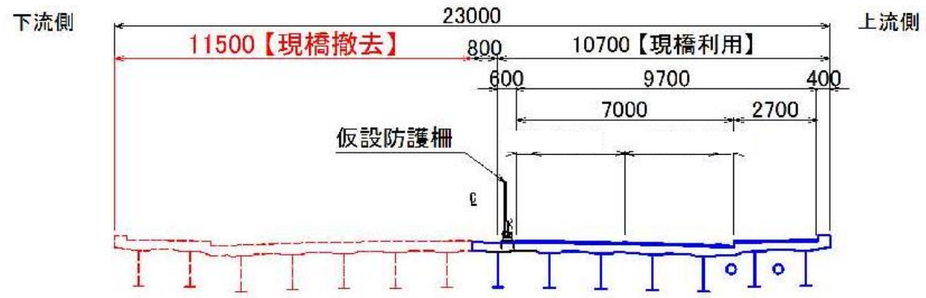

２期（南側躯体）工事・３期（南側公園復旧）工事

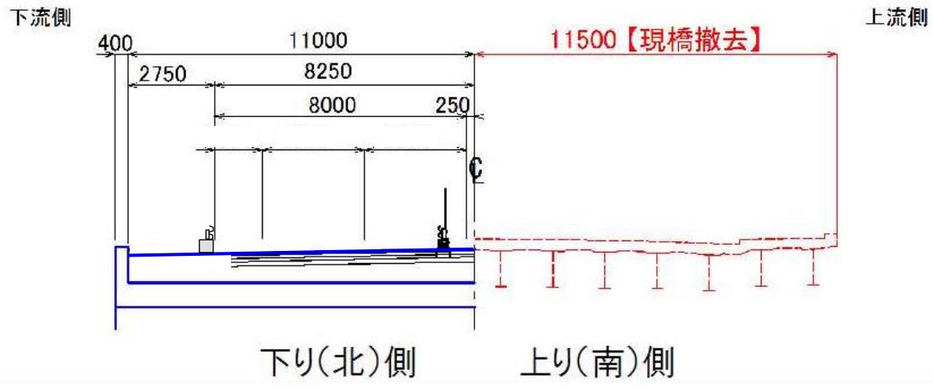

完成形

