東京都市計画道路幹線街路放射第5号線

第18号

三建・放5ニュース

VOL.18 2016.3
【 発 行 】
東京都第三建設事務所
〒164-0001
中野区中野4-8-1-2F
TEL03-3387-5348

前号（17号）の三建・放5ニュースにおいて、放射第5号線の工事の着手予定についてお知らせしましたが、今回は、最近の工事の進捗状況を中心にお知らせいたします。

本号の内容は、**1月に着手した玉川上水橋梁（仮称）工事（1頁）、平成28年4月時点での放5事業地内における通路等の開放状況及び2月末の現況写真（2，3頁）、環境に配慮した取り組み事例（4頁）**となっています。

今後も、道路、橋梁、ライフライン等の各種工事により、生活環境や通路等が変化していきますが、工事中の安全管理を徹底し、皆様の生活への影響を極力抑えるよう努めていきますので、引き続き、ご理解、ご協力の程お願いいたします。

玉川上水橋梁（仮称）の橋梁工事着手について

玉川上水橋梁（仮称）の工事は、玉川上水の下流側の新設工事と上流側の現牟礼橋の架け替え工事との2回に分けて施工しています。

今回着手したのは、下流側の新設橋梁の下部工、「支持杭」と「橋台」の整備工事です。

現在は、「支持杭」を施工中で、今後、深さ約6mまで掘削し、鉄筋コンクリート製の橋台を構築していきます。

その次に、橋梁の上部工、「橋桁」を工場で製作し、現地に運んで架設していきます。

また、工事中、掘削等による玉川上水の水質汚濁を防止するため、どんどん橋の上流側から2本の鋼製の管（写真下）を用いて仮配水をしています。

なお、この管は、工事完了後に撤去いたします。

【平面図】

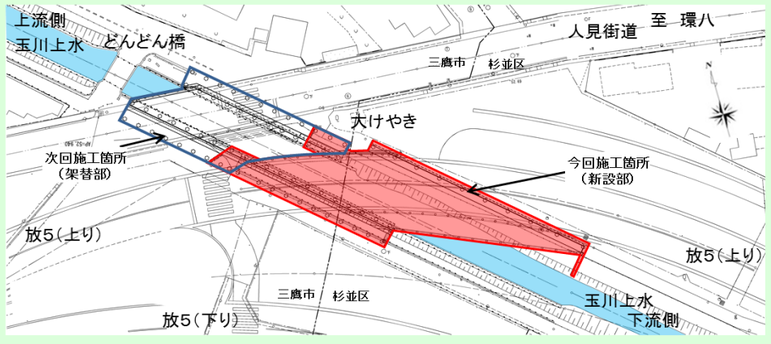

【仮配水の写真】

鋼製の管（コルゲート管）の取水状況

現牟礼橋から都心側を見る

【標準断面図】

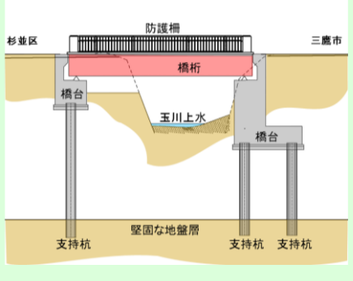

環境に配慮した取り組み事例（大けやきの保全）

牟礼橋付近にある大けやきを保全するため、平成26年12月発行の放5ニュース第15号においてご報告した土壌改良のほか、平成27年に新たな発根を促す根の処理を行い、平成28年1月にその状況の確認を行いました。

その結果、新たな発根も認められ、樹木としては健全な状況が確認できました（写真下）。今後も大けやきの保全に配慮しながら、橋梁工事などを進めてまいります。

H28.2　大けやき（人見街道より撮影）

H28.1　新たな発根を確認

環境に配慮した取り組み事例（貴重な植物の保全）

放5久我山区間の玉川上水の水際は、コンクリート等で覆われていない「自然護岸」が多く残されており、現在も多様な植物が自生しています。今回、玉川上水橋梁（仮称）工事により開削する範囲に自生する「アスカイノデ」等の貴重な植物の一部を他の場所に移植しました（写真下）。また、これまでに、岩通ガーデン等にあった植物の一部を移植するなど、既存樹木の保全にも努めています。

H28.1　玉川上水（水面）　移植作業中

H28.1　移植作業中

問合せ先
〇道路整備全般に関すること
第三建設事務所　工事第一課　設計係・環境対策担当
TEL　03－3387－5348・5347
〇緑道・植栽に関すること
西部公園緑地事務所　工事課　緑化推進担当
TEL　0422-47－0364

平成27年度
登録１１号

【 発 行 】
東京都第三建設事務所　工事第一課
東京都中野区中野4－8－1 中野区総合庁舎2階

第三建設事務所のHP
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/sanken/index.html

工事の進捗に伴う、放5事業地内の通路の開放状況　及び　現況写真の掲載について

これまでの工事の進捗に伴い、放5事業地内において、歩道や玉川上水緑道（遊歩道）の一部を開放、仮設通路の設置等を実施してきました。
下図は、平成28年4月時点における、交通開放状況及びアクセスできる箇所について表示しています。
事業地内（放5計画線内）の仮設通路や一部開放した歩道は、フェンスで囲まれ幅員が狭い箇所が多いことから、特に、通勤・通学時など混雑する際のご通行には十分なご注意をお願いいたします。 また、今後の工事の進捗により、ルート変更及び一時通行止め等を伴う箇所もありますので、予めご了承の程お願いいたします。

本平面図は、一部実際の施工を反映していないところがあります。
放5周辺の宅地図は平成19年の測量結果であるため、現在と異なるところがあります。
工事の進捗状況により、ルート等が変更となる可能性があります。
本号2頁、3頁に掲載した写真は、平成28年2月に撮影したものです。

コナラの移植

椎の木の移植

既設の通路（車道）

通路（歩道）

岩崎橋（歩道）

既設の歩道

通路（歩道）

玉川上水緑道（遊歩道）

現況区道

築堤・車道（工事中）

岩崎橋（歩道）

通路（歩道）

玉川上水緑道（遊歩道）

玉川上水橋梁（仮称）（工事中）

通路
（歩道（左）・車道（右））

兵庫橋（北側交差部）

兵庫橋公園前の
玉川上水緑道（遊歩道）

大けやき

凡　例

- 車道・アクセス箇所
- 歩道・アクセス箇所
- 玉川上水緑道（遊歩道）
- 都市計画線（放5）
- 玉川上水（水路）
