

環状第1号線道路整備事業に伴う、九段 合同庁舎及び九段第2合同庁舎内の 工作物移設工事について

東京都第一建設事務所

令和4年12月14日(水)

午後7時から午後8時


本日、説明する内容について


- 環1(九段)の道路整備について
- 工作物移設工事(補償代行工事)について
- 樹木の取扱いについて
- 工作物移設工事の進め方について

■環1(九段)の道路整備について




事業範囲図

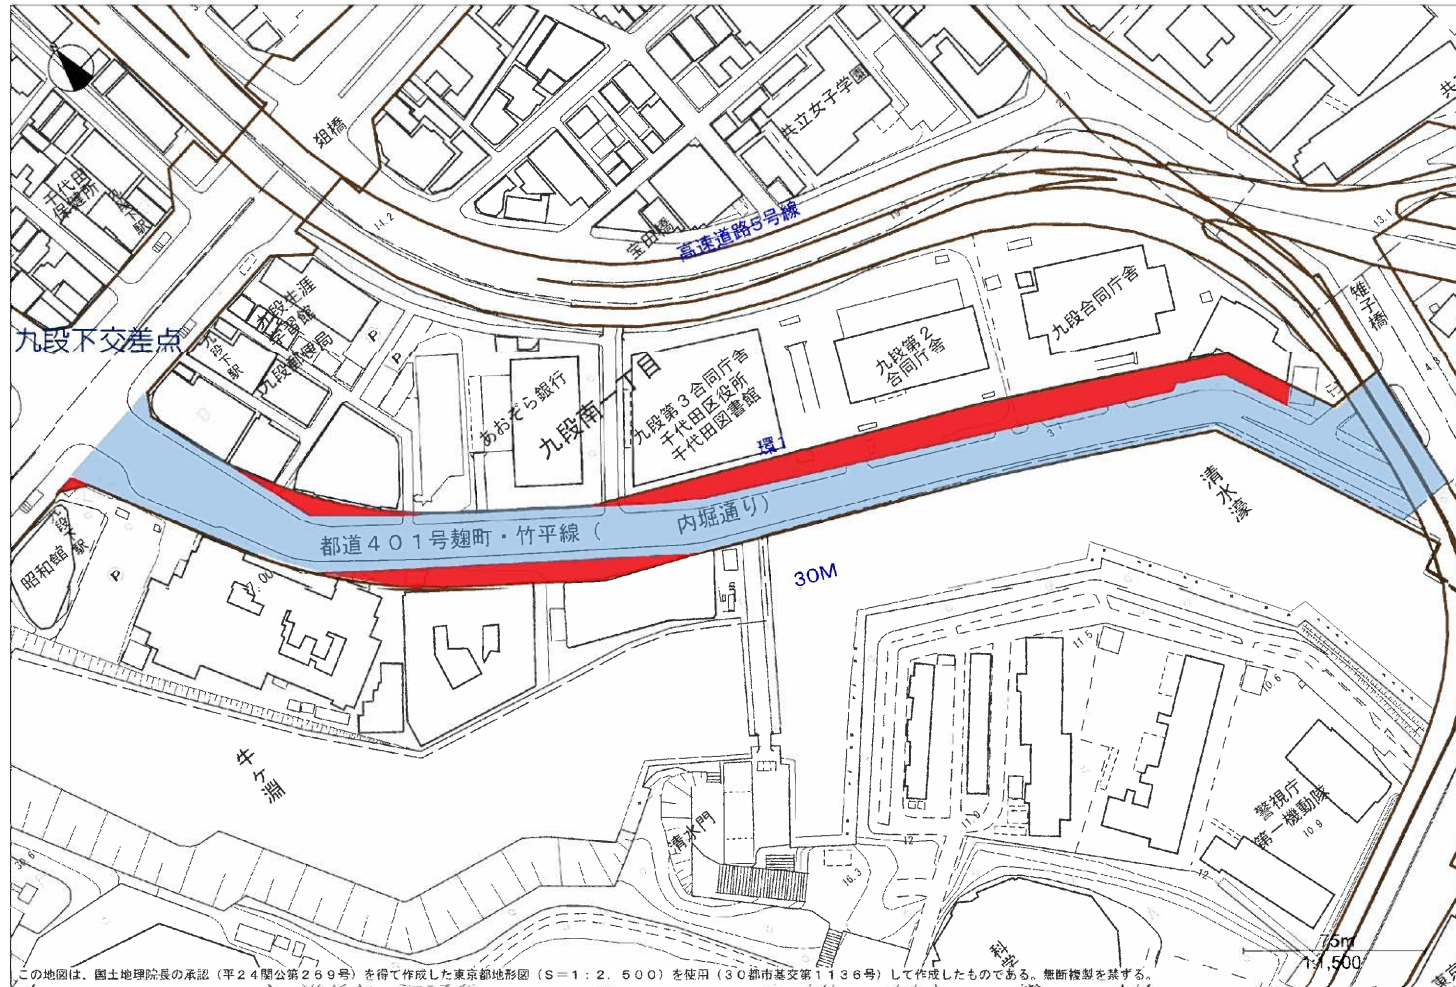

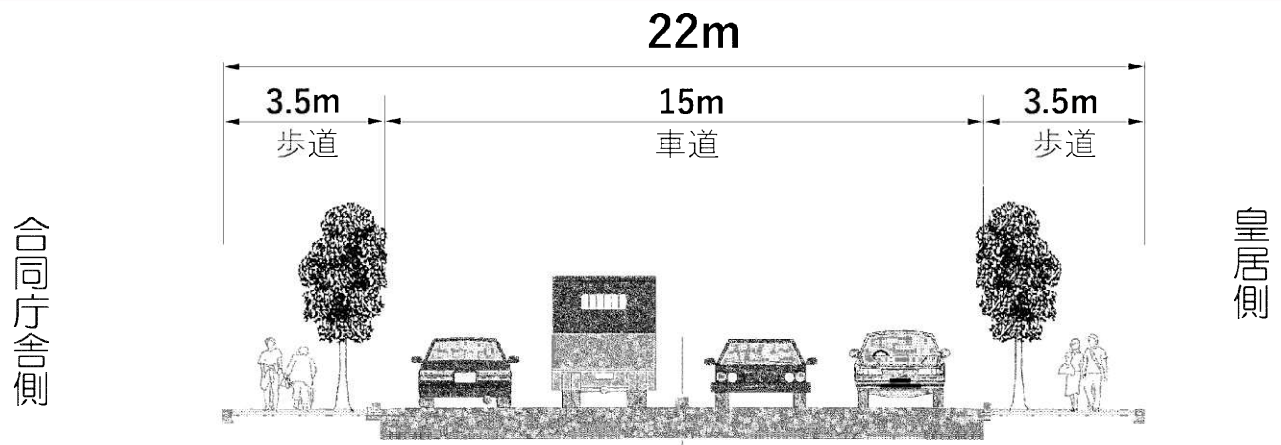


標準現況断面図

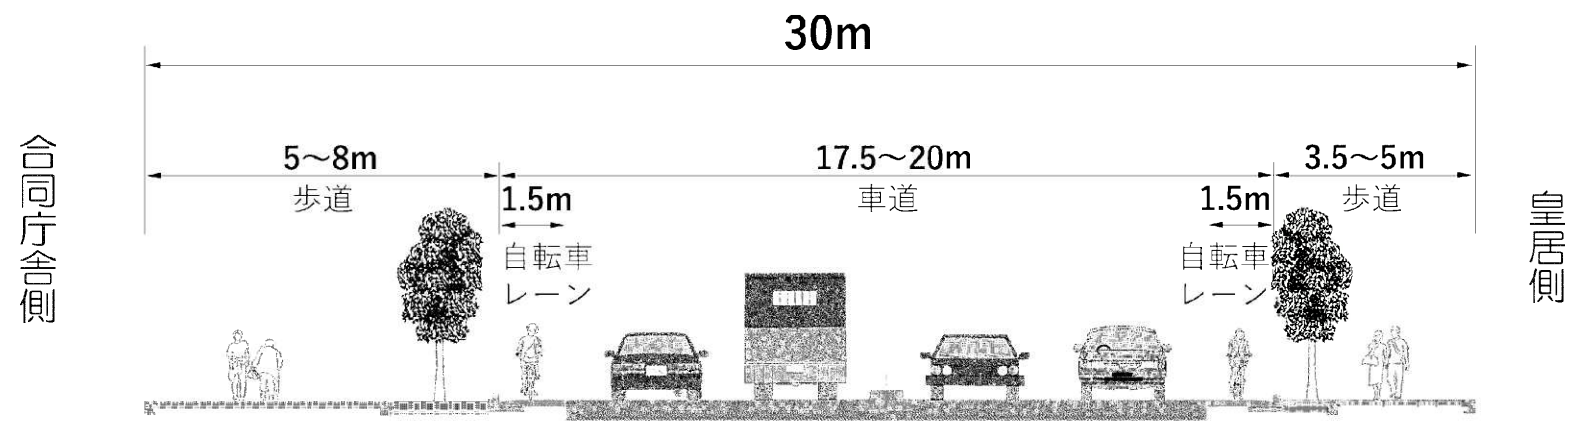

計画断面図

■ 工作物移設工事(補償代行工事)について

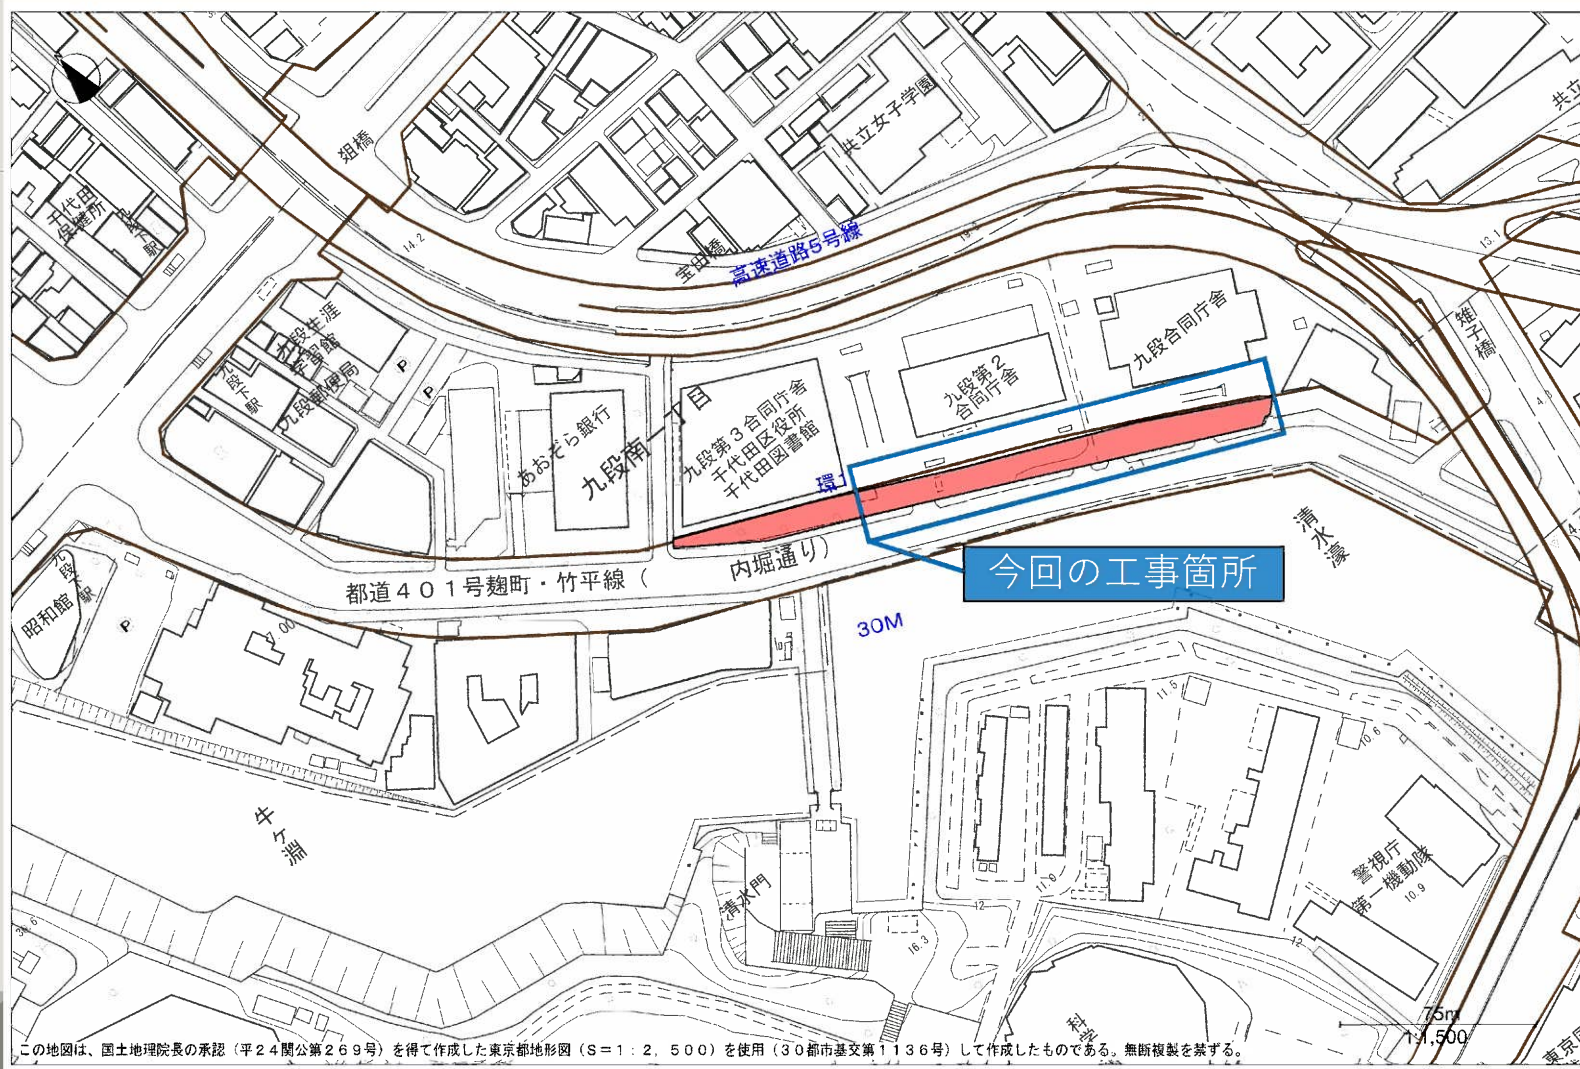

移設する工作物等 九段合同庁舎（第1）



花壇・銘板

門扉・看板



道路の拡幅ライン(イメージ) 九段合同庁舎 (第1)



移設する工作物等 九段第2合同庁舎




掲示板

鉄製看板




道路の拡幅ライン(イメージ) 九段第2合同庁舎

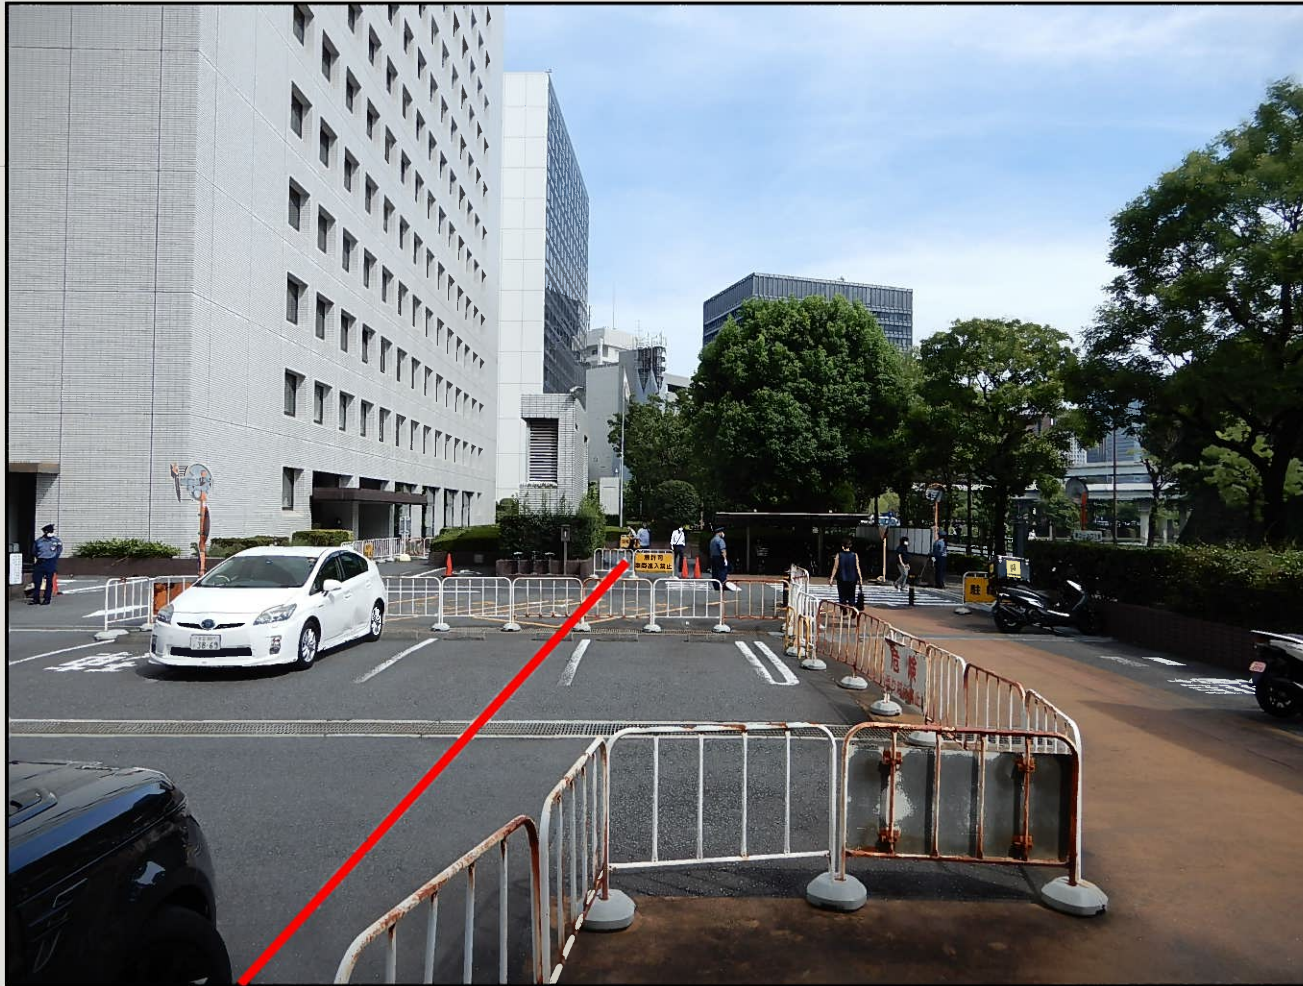

■ 樹木の取扱いについて

樹木の現状

事業中の範囲で支障となる樹木

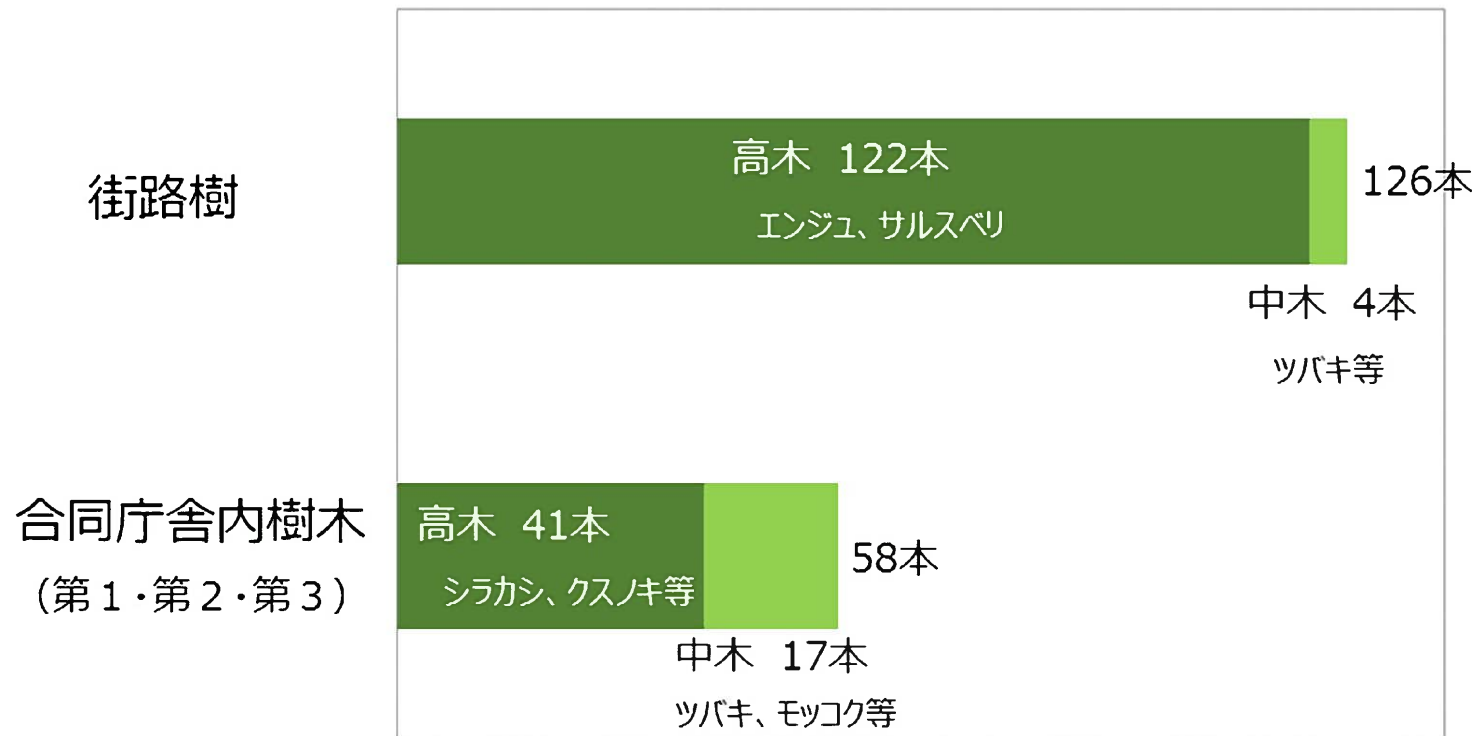

本工事における樹木の取扱い

- ・今回の工作物の移設工事で、街路樹3本と九段合同庁舎内の樹木2本、合計5本が工事の支障となります。
- ・このうち、街路樹3本は、都立公園に一時移植し、将来的には道路整備に併せて街路樹として活用していきます。
- ・庁舎内の樹木2本のうち1本は敷地内に移植します。
- ・一方、庁舎内の残りの樹木1本は、庁舎敷地内に移植可能なスペースがなく、また、樹形や大きさなど街路樹に適さない樹木のため撤去いたします。

【参考】 残りの樹木について

・残りの樹木については、次の方針(案)①～③に基づき、次年度以降の工事で対応する予定です。

- ① 合同庁舎敷地内の樹木は、庁舎敷地内に数本程度移植可能なスペースがあるためそこへ移植する。
- ② ①以外の樹木及び街路樹は、原則、伐採は行わず、都立公園へ一時移植をし、将来的に道路整備に併せて新たな街路樹として活用する。
- ③ 移植に当たっては、樹木診断の結果や樹形、大きさなど街路樹に適するかどうかなど、さまざまな観点から移植の可否を判断する。

■ 工作物移設工事の進め方について

<工事期間>



令和5年1月下旬～令和5年9月下旬

※原則、月曜から金曜

※昼間施工(一部、夜間施工)

【参考】工事中の歩道部状況

(A-A'断面)

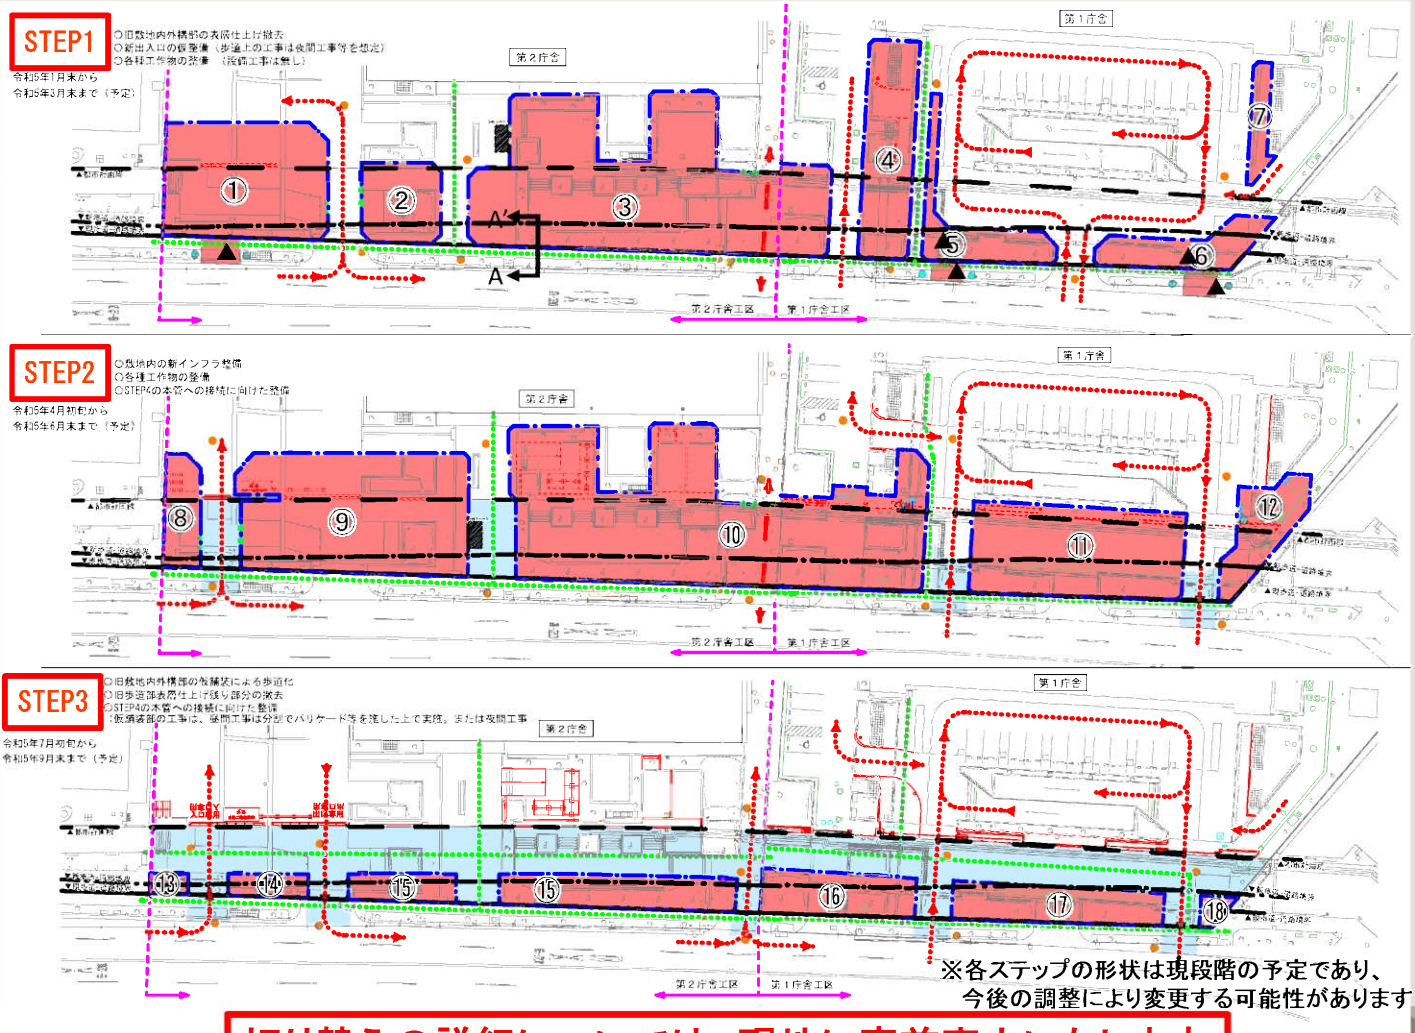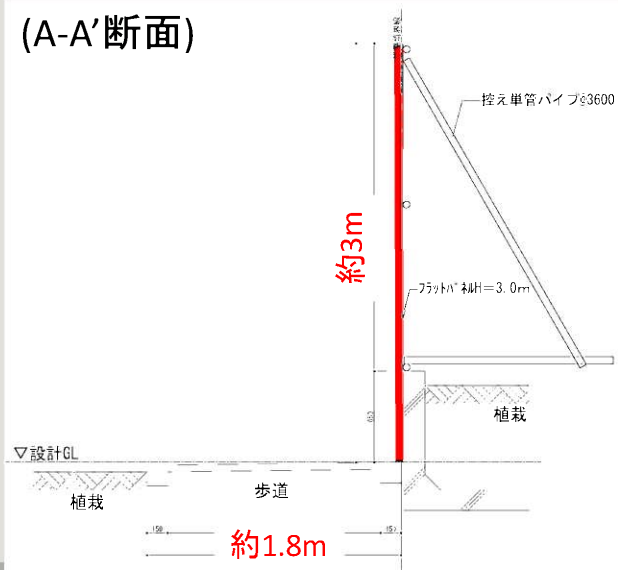


切り替えの詳細については、現地に事前案内いたします

STEP1

令和5年1月末から
令和5年3月末まで（予定）

- 旧敷地内外構部の表層仕上げ撤去
- 新出入口の仮整備（歩道上の工事は夜間工事等を想定）
- 各種工作物の整備（設備工事は無し）

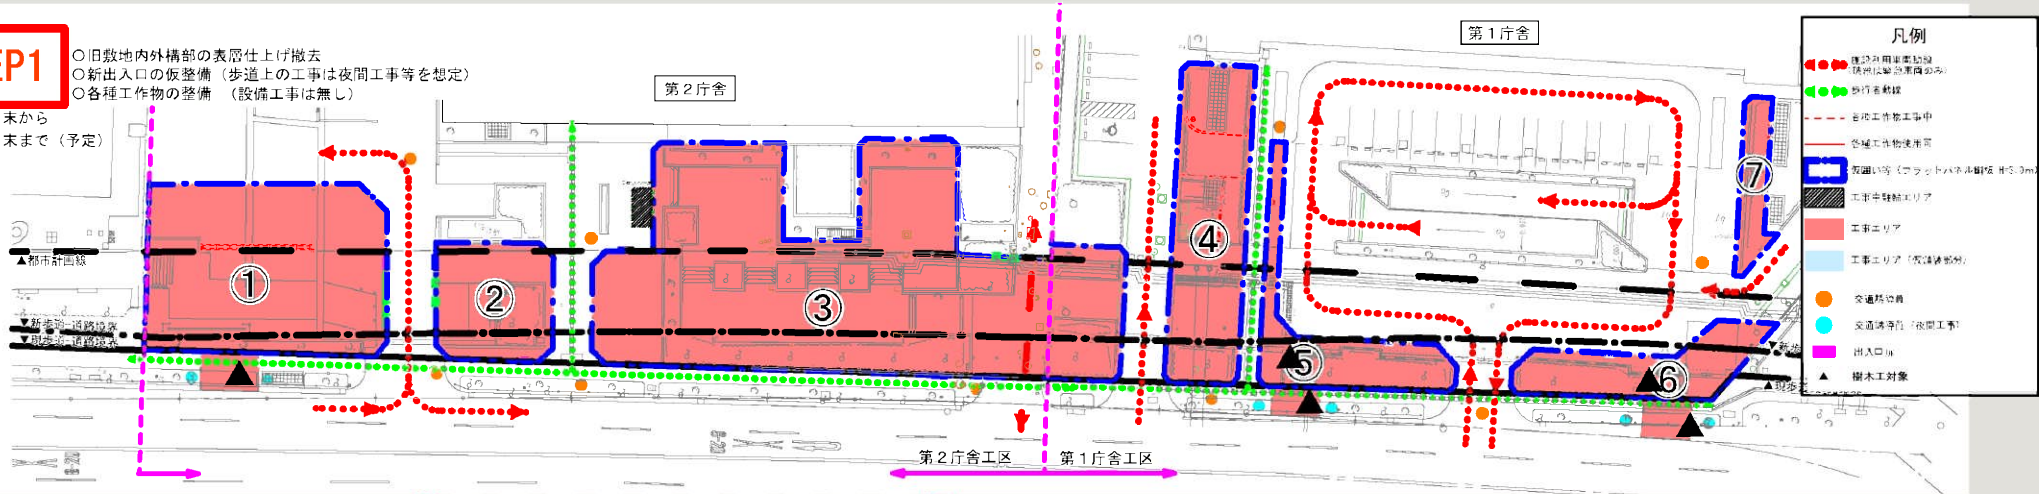

		STEP1			STEP2			STEP3		
工種		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
第1 庁舎	仮囲い設置									
	撤去工・設置工									
	樹木工									
	舗装工									
	路面標示工									
第2 庁舎	仮囲い設置									
	撤去工・設置工									
	樹木工									
	舗装工									
	路面標示工									


切下部（夜間）

切下部（夜間）

STEP2

- 敷地内の新インフラ整備
- 各種工作物の整備
- STEP4の本管への接続に向けた整備

令和5年4月初旬から
令和5年6月末まで（予定）

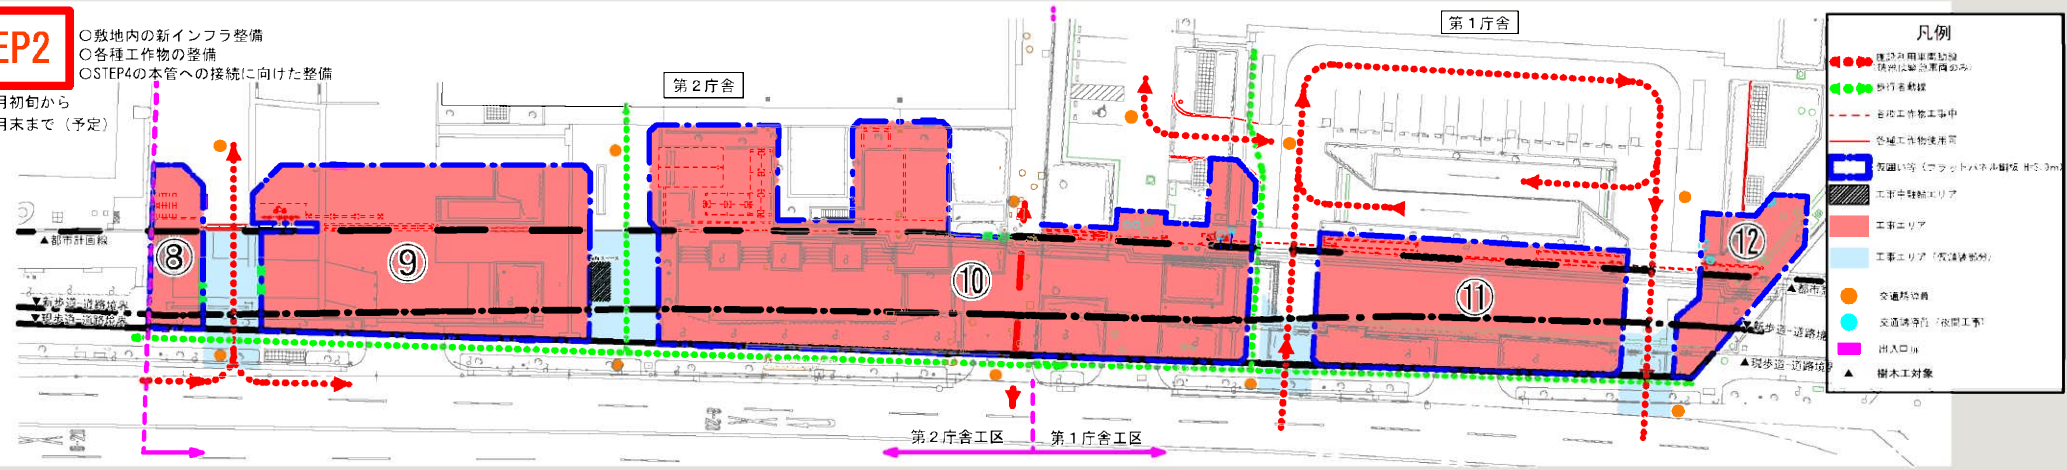


		STEP1			STEP2			STEP3		
工種		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
第1庁舎	仮囲い設置		■		■			■		
	撤去工・設置工		■	■	■	■	■	■		
	樹木工			■						
	舗装工							■	■	■
	路面標示工				切下部 (夜間)					■
第2庁舎	仮囲い設置		■		■			■		
	撤去工・設置工		■	■	■	■	■			
	樹木工			■						
	舗装工						■	■	■	
	路面標示工				切下部 (夜間)					■

STEP3

- 旧敷地内外構部の仮舗装による歩道化
- 旧歩道部表層仕上げ残り部分の撤去
- STEP4の本管への接続に向けた整備
(仮舗装部の工事は、昼間工事は分割でバリケード等を施した上で実施。または夜間工事)

令和5年7月初旬から
令和5年9月末まで（予定）

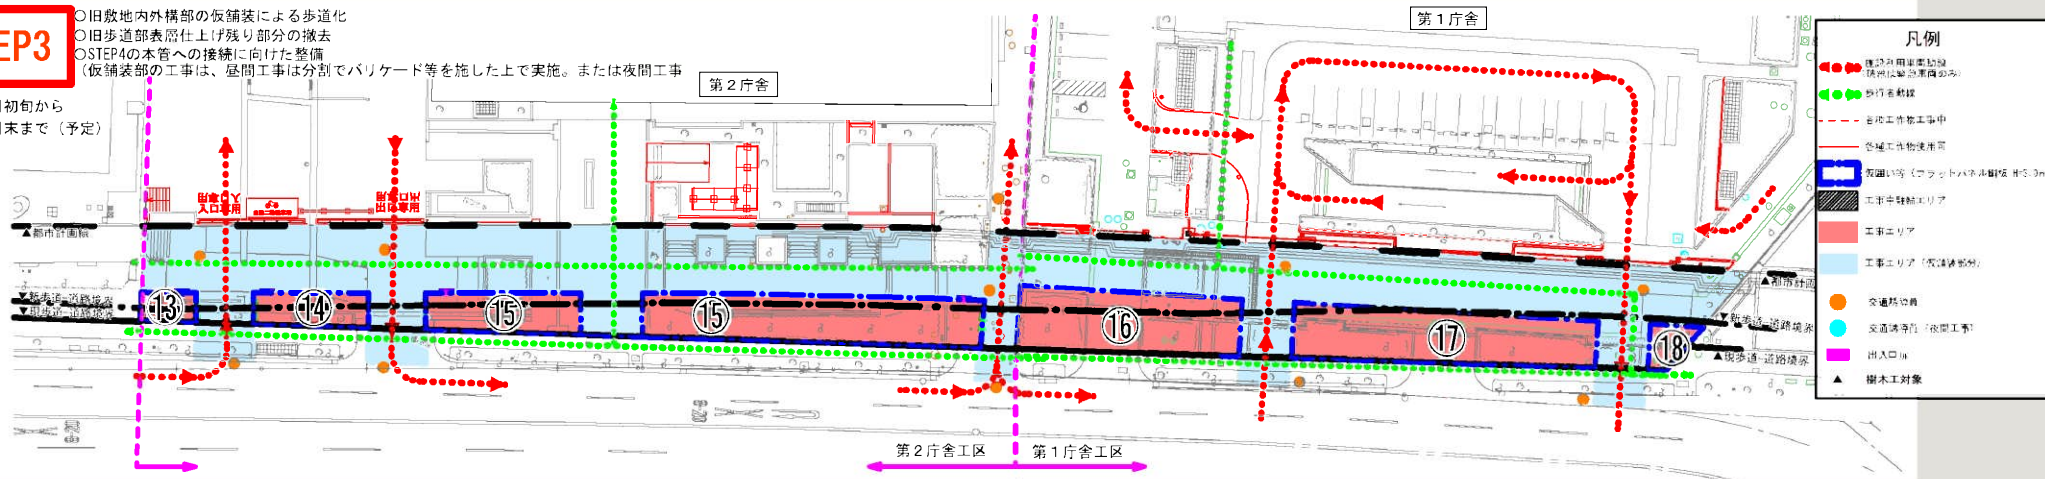

		STEP1			STEP2			STEP3		
工種		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
第1庁舎	仮囲い設置		■		■			■		
	撤去工・設置工		■	■	■	■	■	■		
	樹木工			■						
	舗装工				■			■		■
	路面標示工				■					■
第2庁舎	仮囲い設置		■		■			■		
	撤去工・設置工		■	■	■	■	■			
	樹木工			■						
	舗装工				■		■	■		
	路面標示工				■					■

最後までご清聴ありがとうございました。
